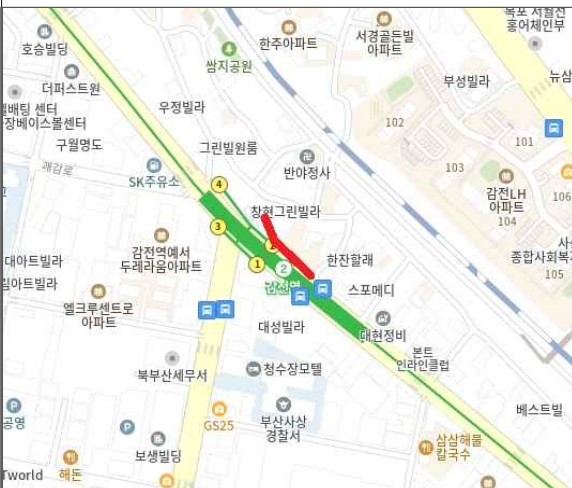


전년도 주민제안사업 추진상황

○ 주민참여예산사업 모니터링: 완료(7건), 추진 중(5건), 불가(1건)

연번	사 업 명	예산액 (백만원)	부서	추진상황	비고
계	13개 사업	483.4			
1	도시철도 감전역 일원 옹벽 환경 개선	100	도시관리과	추진중	부산시
2	백양산 어싱로드 조성	100	녹지공원과	완료	
3	엄궁동 보호수 시설물 정비	30	녹지공원과	불가	사상구
4	덕포동 철길 옆(덕포동 99-6번지) 체육시설 정비	7	문화체육과	완료	
5	모라주공아파트 일원 버스승객대기소 및 온열의자 설치	22	교통행정과	완료	
6	모랫길 굴다리 CCTV 설치	8	안전총괄과	완료	
7	모랫길 굴다리 정비	100	도시관리과	추진중	
8	삼락천 목교 경관조명 등 설치	25	도시관리과	완료	
9	학장천변 주민편의시설 정비	30	도시관리과	추진중	
10	백양대로 967-1번지 일원 보도 정비	25	건설과	완료	
11	단차가 있는 도로 경계선 난간 설치 (주례로10번길 36)	1.4	건설과	추진중	
12	보행난간(핸드레일) 설치(백양대로 430)	2	건설과	추진중	
13	모라1동 행정복지센터 주차장 바닥 보수	33	모라1동	완료	

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	1. 도시철도 감전역 일원 옹벽 환경 개선			추진상황		
사업비	100백만원			완 료	추진중	불 가
위치	감전동 205번지 일원				○	
담당부서	도시관리과	담당자	최혜지			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 기 간: 2025. 3월 ~ 12월 ○ 규 모: L=64.8m, H=5m ○ 내 용: 옹벽 정비·도색, 조경 식재 등 - 벽면 정비, 기존 등반보조재 철거 및 잡목 제거 등 - 운전자와 보행자의 가시성을 강화한 밝고 쾌적한 도로환경 조성					
추진실적	○ 2025. 3월: 추진계획 수립 ○ 2025. 6월: 실시설계용역 착수 ○ 2025. 7월: 市 주민참여단 1차 모니터링					
향후계획	○ 2025. 9월: 공사 착공 ○ 2025.12월: 공사 준공					
관련사진	위치도			현장사진		
						

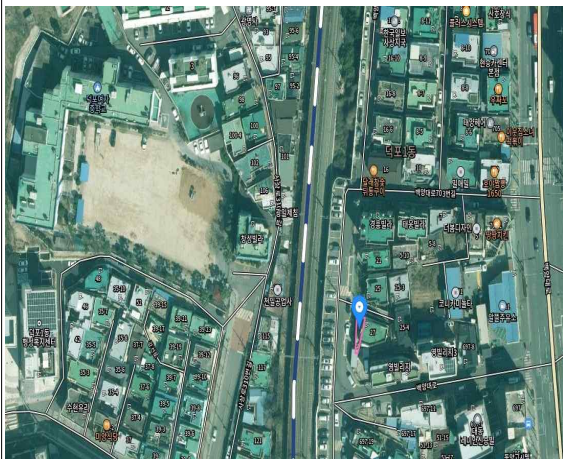
주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	2. 백양산 어싱로드 조성사업			추진상황		
사업비	100백만원			완 료	추진중	불 가
위치	탑골약수터 ~ 서당골 약수터 위			○		
담당부서	녹지공원과	담당자	박종관			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 사업내용 - 마사토 포설 3km - 자연형 세죽장 1식 조성					
추진실적	○ 2025. 3. 19. 용역 착수 ○ 2025. 4. 7. 용역 준공 ○ 2025. 5. 9. 공사 착공 ○ 2025. 7. 11. 공사 준공					
향후계획	○ 2025. 8. ~ 사후관리					
관련사진	위치도			현장사진		
						

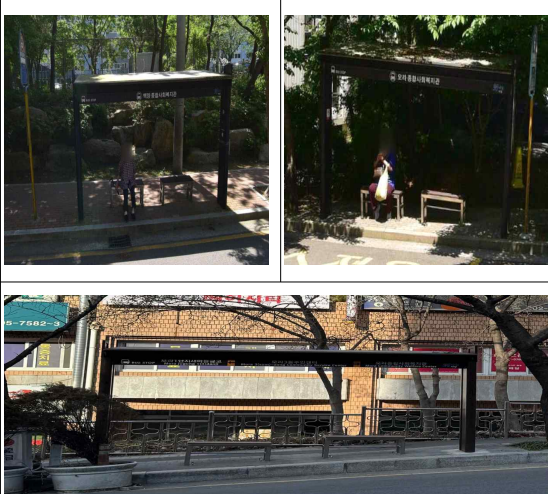
주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	3. 엄궁동 보호수 시설물 정비			추진상황		
사업비	30백만원			완 료	추진중	불 가
위치	엄궁동 635-10번지					○
담당부서	녹지공원과	담당자	최예진			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 사업내용: 노후 파고라 철거 및 신규 파고라 설치					
추진실적	○ 2025.2.20. 사업 계획보고 ○ 2025.2.21. 물품 구입 ○ 2025.3.19. 기존 노후 파고라 철거 ○ 2025.3.19. 설치 대상지 인접 소유자 및 엄궁동 주민 시설물 설치 반대 민원 접수 ○ 2025.3.20. 사업 중지 ○ 2025.6.5. 설치 대상지 변경 및 예산과목 변경 ○ 2025.6.26. 기존 파고라 철거 후 주민 휴게 공간이 사라져 임시 평상 설치 완료					
향후계획	○ 2025. 6. ~ 지속적인 사후관리					
관련사진	위치도			현장사진		
						

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	4. 덕포동 철길 옆(덕포동 99-6번지) 체육시설 정비			추진상황		
사업비	7,000천원			완 료	추진중	불 가
위치	덕포동 99-6			○		
담당부서	문화체육과	담당자	전태원			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 덕포동 철길 옆 체육시설 정비 - 바닥정비 16루베 - 블럭정비 6헤베					
추진실적	○ 2025. 6. 정비계획 수립 ○ 2025. 7. 수의계약(정비) 의뢰 ○ 2025. 8. 정비 완료					
향후계획	○ 체육시설 지속적 관리					
관련사진	위치도			현장사진		
						

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	5. 모라주공아파트 일원 버스 승객대기소 및 온열의자 설치			추진상황		
사업비	22백만원			완 료	추진중	불 가
위치	모라 3동 주민센터 등 3개소			○		
담당부서	교통행정과	담당자	김원주			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 온열의자 설치 3개소 ○ 겨울철 버스 이용객들의 불편사항을 해결하여 대중교통 이용 활성화에 기여하고자 함.					
추진실적	○ 온열의자 3개소 설치 완료					
향후계획	○ 사후 유지관리					
관련사진	위치도			현장사진		
						

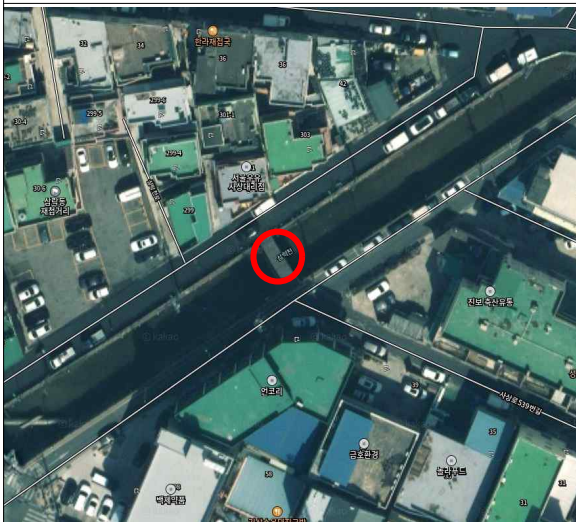
주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	6. 모랫길 굴다리 고정형 CCTV 보강			추진상황		
사업비	8백만원			완 료	추진중	불 가
위치	모라로 85-52 등 2개소			○		
담당부서	안전총괄과	담당자	김태환			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 사업목적: 모랫길 굴다리 인근 회전형 CCTV 위주로 설치된 개소에 고정형 CCTV를 보강하여 사각지대없는 안전도시 사상을 구현하고자 함. ○ 사업기간: 2025. 3. ○ 설치위치: 모라로 85-52 등 2개소 ○ 구매내역: 고정형 CCTV 6대 및 네트워크스위치 2대 등					
추진실적	○ 2025. 3. 고정형 CCTV 보강 관련 자재 구매 및 설치 완료					
향후계획	○ 해당개소 CCTV카메라의 원활한 운영·관리					
관련사진	위치도			현장사진		
						

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	7. 모랫길 굴다리 정비			추진상황		
사업비	100백만원			완 료	추진중	불 가
위치	사상로500번길 15 인근				○	
담당부서	도시관리과	담당자	최혜지			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 기 간: 2025. 3월 ~ 12월 ○ 규 모: L=18m, H=2m ○ 내 용: 내부 조도 개선 및 바닥·벽면 정비, 입구 및 옹벽 정비 - 내부 패턴 경관조명 설치 등 균일하고 안전한 조도 확보 - 진입부를 강조하는 조명형 채널 사인 설치 - 지역 상징성을 담은 내부 콘텐츠 정비 및 재배치					
추진실적	○ 2025. 4월: 사업비 증액(1회 추경예산 반영) ○ 2025. 8월: 추진계획 수립					
향후계획	○ 2025. 8월: 실시설계용역 착수 ○ 2025.10월: 설계 완료 및 공사 착공 ○ 2025.12월: 공사 준공					
관련사진	위치도			현장사진		
						

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	8. 삼락천 목교 경관조명 등 설치			추진상황		
사업비	25백만원			완 료	추진중	불 가
위치	삼락천로 301 앞 목교			○		
담당부서	도시관리과	담당자	양주성			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 야간통행 시 주민안전 확보를 위한 야간경관조명 설치					
추진실적	○ '25. 2월: 목교 난간기둥 보수 및 미끄럼방지시설 설치 완료 ○ '25. 4월: 야간경관조명 설치 완료					
향후계획						
관련사진	위치도			현장사진		
						

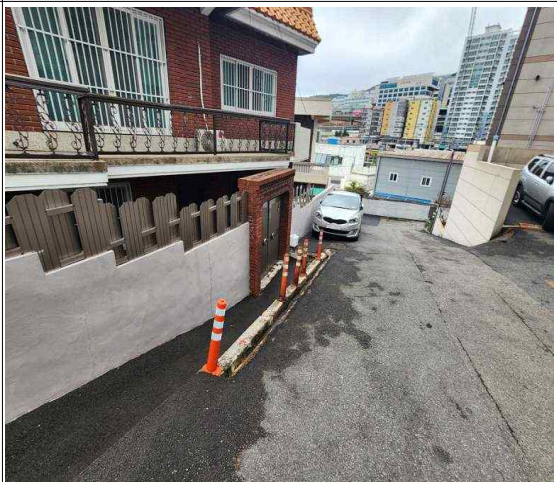
주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	9. 학장천변 주민편의시설 정비			추진상황		
사업비	30백만원			완 료	추진중	불 가
위치	학장천 일원				○	
담당부서	도시관리과	담당자	양주성			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 야간통행 시 주민안전 확보를 위한 야간경관조명 설치 ○ 포토존 의자 교체 및 미끄럼방지시설 보수 등 주민편의시설 정비					
추진실적	○ '25. 7.: 학장천 목교 야간경관조명 설치 완료					
향후계획	○ '25. 9.: 학장천 포토존 의자 교체 및 미끄럼방지시설 보수					
관련사진	위치도			현장사진		
						

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	10. 백양대로 967-1번지 일원 보도정비공사			추진상황		
사업비	25백만원			완 료	추진중	불 가
위치	백양대로 967-1번지 일원			○		
담당부서	건설과	담당자	오윤성			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 노후 보도 정비를 통한 주민불편사항 해소					
추진실적	○ '25. 04. : 공사 착공 ○ '25. 05. : 공사 준공					
향후계획						
관련사진	위치도			현장사진		
						

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	11. 단차가 있는 도로 경계선 난간 설치 (주례로10번길 36)			추진상황		
사업비	1.4백만원			완 료	추진중	불 가
위치	주례로10번길 36				○	
담당부서	건설과	담당자	배희정			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 도로 경계선 난간 설치를 통한 주민불편사항 해소					
추진실적						
향후계획	○ '25. 09. : 물품(자재) 발주 ○ '25. 10. : 설치 완료					
관련사진	위치도			현장사진		
						

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	12. 보행난간(핸드레일) 설치 (백양대로 430)			추진상황		
사업비	2백만원			완 료	추진중	불 가
위치	백양대로 430 일원				○	
담당부서	건설과	담당자	배희정			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 보행난간 설치를 통한 주민불편사항 해소					
추진실적						
향후계획	○ '25. 09. : 물품(자재) 발주 ○ '25. 10. : 설치 완료					
관련사진	위치도			현장사진		
						

주민참여예산 제안사업 관리카드

사업명	13. 모라1동 행정복지센터 주차장 바닥 보수			추진상황		
사업비	33백만원			완 료	추진중	불 가
위치	모라1동 행정복지센터			○		
담당부서	모라1동	담당자	진재원			
◇ 제안사업 내용						
사업개요	○ 주차장 정비 공사를 통해 민원인들에게 쾌적하고 안전한 청사 환경을 조성					
추진실적	○ '25.5.21 착수 ○ '25.6.25 완료					
향후계획						
관련사진	위치도			현장사진		
						
