

2025년 주민참여예산제 운영 실적

(단위 : 천원, %)

연번	제안자	사업명	사업부서	예산액	사업개요	추진현황
계		4건		110,000		
1	시민	보도 정비사업 (우미내 마을 인근 보도 정비사업)	도로과	30,000	○ 사업기간 : 2025. 3. ~ 2025. 4. ○ 사업위치 : 아차산로(우미내 마을 인근) 일원 ○ 총사업비 : 30,000천원 ○ 사업내용 : 보도블록 포장 334㎡, 콘크리트 포장 깨기 55㎡ 등	추진완료
2	시민	장애 없는 보행환경 조성 (갈매중앙로 보도 단차 정비공사)	도로과	30,000	○ 사업기간 : 2025. 3. ○ 사업위치 : 갈매중앙로(마골삼거리~중앙로사거리) 일원 ○ 총사업비 : 30,000천원 ○ 주요내용 : 보도블록 재포장 100㎡, 보도블록 소규모 보수 70㎡ 등	추진완료
3	수택2동	수이랑길 골목환경 개선 사업	수택2동	10,000	○ 사업기간 : 2025. 4. ~ 2025. 7. ○ 사업위치 : 수택2동 일대 ○ 총사업비 : 10,000천원 ○ 주요내용 : 수목전정 및 관리, 노후된 담벼락 보완 및 벽화그리기	추진완료
4	수택2동	새말공원 내 쿨링포그 설치	공원녹지과	40,000	○ 사업기간 : 2025. 3. ~ 2025. 6. ○ 사업위치 : 새말공원(수택동 449) ○ 사 업 비 : 40,000천원 ○ 사업내용 : 새말공원 퍼걸러 내부 쿨링포그 설치(24m)	추진완료

보도 정비사업 (우미내 마을 인근 보도 정비사업)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025. 3. ~ 2025. 4.
- 사업위치 : 아차산로(우미내 마을 인근) 일원
- 사업비 : 30,000천원
- 사업내용 : 보도블록 포장 334㎡, 콘크리트 포장 깨기 55㎡ 등
- 기대효과 : 시민 안전 및 도시 미관 개선

□ 추진현황

- 2025. 3. : 공사 발주
- 2025. 4. : 공사 착공 및 준공

□ 향후 추진계획

- 해당 없음

□ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

예산액	분기별 집행액(누계)							
	1분기말 기준		2분기말 기준		3분기말 기준		4분기말 기준	
	집행액	집행률	집행액	집행률	집행액	집행률	집행액	집행률
30,000			29,290	98%				

□ 현장사진



장애 없는 보행환경 조성 (갈매중앙로 보도 단차 정비공사)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025. 3.
- 사업위치 : 갈매중앙로(마골삼거리~중앙로사거리) 일원
- 사 업 비 : 30,000천원
- 사업내용 : 보도블록 재포장 100㎡, 보도블록 소규모 보수 70㎡ 등
- 기대효과 : 시민 안전 개선

□ 추진현황

- 2025. 3. : 공사 착공 및 준공

□ 향후 추진계획

- 해당 없음

□ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

예산액	분기별 집행액(누계)							
	1분기말 기준		2분기말 기준		3분기말 기준		4분기말 기준	
	집행액	집행률	집행액	집행률	집행액	집행률	집행액	집행률
30,000			22,790	76%				

□ 현장사진



수이랑길 골목환경 개선사업

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025. 4. ~ 2025. 8.
- 사업위치 : 수택2동 일대
- 사 업 비 : 10,000천원
- 사업내용 : 노후된 담벼락 보완 및 벽화그리기
- 기대효과 : 화사한 벽화를 통해 취약한 수택2동 주거환경을 밝고 정돈된 환경으로 개선하여 주민들의 삶의 질 향상.

□ 추진현황

- 2025. 4. ~ 5.: 사업지 선정 및 주민동의서 징구
- 2025. 6. : 사업자 선정 및 계약
- 2025. 7. : 외벽 보수 및 벽화 도색 등 사업 실행
- 2025. 8. : 하자 보수 및 사업 종결

□ 향후 추진계획

- 해당없음

□ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

예산액	분기별 집행액(누계)							
	1분기말 기준		2분기말 기준		3분기말 기준		4분기말 기준	
	집행액	집행률	집행액	집행률	집행액	집행률	집행액	집행률
10,000	0	0%	6,650	66.5%	9,500	95%		

□ 현장사진

시행전



시행전



시행전



시행전



시행중



시행중



시행중



시행중



시행후



시행후



시행후



시행후



새말공원 내 쿨링포그 설치

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025. 3. ~ 2025. 6.
- 사업위치 : 새말공원(수택동 449)
- 사업비 : 40,000천원
- 사업내용 : 새말공원 퍼걸러 내부 쿨링포그 설치(24m)
- 기대효과 : 옥외 냉방 효과로 폭염 시 무더위 쉼터 조성하고 안개 분사로 미세먼지를 제거하여 공원 이용 주민들의 편익 도모

□ 추진현황

- 2025. 3. : 새말공원 내 쿨링포그 설치 계획 수립
- 2025. 4. : 계약 및 착공
- 2025. 5. : 준공 완료

□ 향후 추진계획

- 해당 없음


□ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

예산액	분기별 집행액(누계)							
	1분기말 기준		2분기말 기준		3분기말 기준		4분기말 기준	
	집행액	집행률	집행액	집행률	집행액	집행률	집행액	집행률
40,000			35,640	89%				

□ 현장사진

시행전

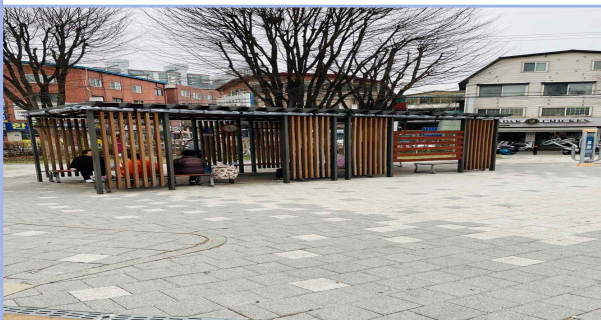

시행후

