

2026년 대전 중구 주민참여예산 선정사업 추진현황

※ 2026. 6. 30. 기준

(단위: 건, 천원, %)

유 형	사업추진현황				예산집행현황		
	건수	추진중	완료	추진률	예산액	집행액	집행률
총 계	33	6	27	82	618,210	477,514	77.2
행정동단위 주민참여형	24	6	18	75	481,710	350,242	72.7
구정참여형	9	-	9	100	136,500	127,272	93.2

○ 대전 중구 주민참여예산사업 최종 선정사업 (33건 / 618백만원)

지역	연 번	유형	사 업 내 용	사업비 (백만원)	추진 부서	추진 현황
총계			33건	618.21		82%
은행 선화동	1	행정동단위 주민참여형	무인민원발급기 24시간 이용을 위한 시설개선 - 기존 무인민원발급기 위치에 자동문 및 전동서터 설치 하여 동청사와 구획분리	16	은행 선화동	완료
	2	행정동단위 주민참여형	공실공간을 활용한 주민 자치프로그램 강의실 리모델링 - 주민자치 프로그램 강의실 바닥재 교체 및 기자재 구입	30	은행 선화동	완료
목동	3	행정동단위 주민참여형	같이의 가치: 함께 즐겨요! 목동 dots리 영화제&청소년 보드게임 대회 - dots리영화제 및 보드게임 대회를 통한 주민들간의 소 통 시간 마련	10	목동	진행중
	4	행정동단위 주민참여형	불법투기 감시형 CCTV 설치 - 쓰레기 불법투기 취약지역(목동로8번길 64)에 감시용 CCTV 1식 설치	4	목동	완료
	5	행정동단위 주민참여형	초등학교 주변 어린이보호구역 내 LED 바닥 조명 설치 - 목동초등학교 앞 약 200m 매립형 태양광 LED 도로표 지병 설치	5	목동	완료
중촌동	6	행정동단위 주민참여형	우리동네 클린지킴이 (불법투기 단속 CCTV) - 중촌동 불법투기 취약지역 2곳에 CCTV를 설치하여 불 법투기를 방지	8	중촌동	완료
	7	행정동단위 주민참여형	어르신 및 사회적 약자를 위한 야외 벤치 설치 - 관내 보행로에 기설치 된 노후 벤치 철거 및 신규 야 외 벤치 설치	9.46	중촌동	완료
대흥동	8	행정동단위 주민참여형	대흥동 작은도서관 신규 도서구입 - 작은도서관 도서 300권 구입	4.5	대흥동	진행중
	9	행정동단위 주민참여형	주민편의를 위한 야외벤치 설치 - 대고오거리 주변 야외 벤치 4개소 설치	2.5	대흥동	완료
석교동	10	행정동단위 주민참여형	주민이 전하는 석(石)교(橋)이야기 - 석교동의 지명 유래가 된 '돌(石)'과 다리(橋)에 대한 역사적관련 내용을 조사·정리하여 홍보영상 제작	10	석교동	완료
	11	행정동단위 주민참여형	신청사 LED 디스플레이 설치 사업 - 1층 민원실 대형 고해상도 LED 디스플레이 1대 설치 - 1층 로비 LED 배너(세로형 전광판) 6대 설치	50	석교동	완료

지역	연 번	유형	사 업 내 용	사업비 (백만원)	추진 부서	추진 현황
대사동	12	행정동단위 주민참여형	대사동 마을축제 - 마을공동체 문화형성 및 보문산 관광 활성화를 위한 ‘대사동 마을축제’ 개최	25	대사동	진행중
	13	행정동단위 주민참여형	디지털 행정게시대 설치 - 대사동 복합커뮤니티센터 앞 디지털 행정게시대 설치 (1식)	25	대사동	완료
부사동	14	행정동단위 주민참여형	우리마을 제설자재 창고 설치사업 - 부사동 422-36, 365-8 등 2개소 마을 공동 제설자재 창 고 설치	20	부사동	완료
	15	행정동단위 주민참여형	쾌적한 주민 생활환경 개선을 위한 해충 포집기 설치 - 보문로 103번길 66, 보문로68번길 골목 등 5개소 해충 포집기 설치	10	부사동	진행중
용두동	16	행정동단위 주민참여형	알록달록 우리동네 무지개 담장 - 지역주민, 학생들이 함께 참여하는 관내 초등학교 담장 벽화 도색	15	용두동	완료
태평1동	17	행정동단위 주민참여형	태평고을 가을 축제 한마당 - 마을공동체 문화 형성 및 주민 화합 소통의 장 마련 을 위한 ‘태평고을 가을 축제 한마당’ 개최	25	태평1동	진행중
태평2동	18	행정동단위 주민참여형	바닥부터 빛나는 우리 동네 안심 보행환경 조성 - 태평2동 골목길 LED 도로표지병 설치	12.25	태평2동	완료
유천2동	19	행정동단위 주민참여형	이웃나눔 주방 및 주민 소통 공간 조성사업 - 노후 및 비효율적 청사공간 리모델링	50	유천2동	완료
	20	행정동단위 주민참여형	지역 어르신 피로 회복과 삶의 활력소 족욕기 설치 사업 - 관내 8개 경로당에 족욕기(2대) 구입 및 설치	10	유천2동	완료
문화1동	21	행정동단위 주민참여형	주민자치프로그램 기자재(엠프) 교체 - 원활한 주민자치프로그램 운영을 위한 기자재(엠프 및 시스템) 교체	20	문화1동	완료
	22	행정동단위 주민참여형	디지털 홍보 게시판 설치 - 행정소식과 생활정보를 전달하기 위한 디지털 홍보 게시판 설치	25	문화1동	완료

지역	연 번	유형	사 업 내 용	사업비 (백만원)	추진 부서	추진 현황
문화2동	23	행정동단위 주민참여형	주민센터 유휴공간 활용 다목적 실내 체육시설 조성 - 주민센터 유휴공간 활용 다목적 실내 체육시설 조성	45	문화2동	완료
산성동	24	행정동단위 주민참여형	주민과 행정을 잇는 소통창구 '디지털 행정게시대' 설치 - ‘주민과 행정을 잇는’ 소통창구 디지털 행정 게시대 설치	50	산성동	진행중
중 구	25	구정참여형	자율방범대원의 집 표식 부착 사업 - 자율방범대원의 집 명패부착사업(11개소)	4	자치 분권과	완료
중촌동	26	구정참여형	중촌동 내 공영주차장 주차차단기(바) 설치 - 죽말 경로당 아래 주차장(대전 중구 목종로70번길 8) 공영주차장 주차차단기(바) 설치 및 전기·통신 공사	5	일자리 경제과	완료
문창동	27	구정참여형	문창, 부사시장 경관조명 개선사업 - LED열주등 30기, 고보조명 10대 설치	50	건설과	완료
부사동	28	구정참여형	부사, 문창시장 경관조명 개선사업 - LED열주등 30기, 고보조명 10대 설치 * 공사비용 절감 등 사유로 문창시장 사업과 공동 추진	30	건설과	완료
석교동	29	구정참여형	호동 가로등 및 조명 설치 사업 - LED 보안등 3등 설치(호동133 일원)	3	건설과	완료
유천1동	30	구정참여형	우범지역 보안등 정비 - 유천1동 대둔산로 496 의 9개소 보안등 설치	10	건설과	완료
문화1동	31	구정참여형	과례육교 핸드레일 설치공사 - 과례육교 경사로 보행자 안전을 위해 핸드레일 설치	10	건설과	완료
태평2동	32	구정참여형	벌레 없는 쾌적한 우리 동네 공원 만들기 - 버드내조폐근린공원 해충기피제 설치(3식)	4.5	공원 녹지과	완료
문화1동	33	구정참여형	깨끗하고 안전한 거리 조성, 방범용 CCTV 설치 요청 - 문화동 342번지 철길 지하도 인근 1개소에 방범용 CCTV 설치	20	회계과	완료

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 6월
- (사업비) 16백만 원 / ○ (집행액) 16백만 원
- (사업위치) 은행선화동행정복지센터 본관 1층 출입문
- (내용)
 - 기존 무인민원발급기 위치 안쪽으로 자동문 및 전동셔터 설치
 - 무인민원발급기와 동청사를 구획 분리 하여 24시간 사용하도록 사업 추진
- (사업추진 현황)
 - 셔터신설 2식, 자동문 신규설치 등

2 문제점 및 향후대책

- 24시간 개방된 공간에 위치할 경우, 심야 시간대 취객의 기기 훼손, 기기 내부 현금 노출에 따른 도난 위험, 개인정보 노출 등 범죄 및 보안상의 취약점이 존재
- 발급기 주변에 고화질 CCTV를 이동 설치하고, 보안업체의 24시간 출동 서비스와 연계하여 기기 훼손 및 도난 범죄를 예방

3 현황(추진, 결과) 사진




1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 3. ~ 2026. 4.
- (사업비) 30백만 원 / ○ (집행액) 29백만 원
- (사업위치) 은행선화동행정복지센터 별관 2층
- (내용)
 - 공실로 방치되고 있는 동청사 별관2층을 주민들의 평생학습, 문화교육, 회의실 등 다양한 학습욕구를 충족할 수 있는 공간 개선
 - 주민자치프로그램을 다양화하고 지역공동체가 활성화될 수 있는 기반 마련
- (사업추진 현황)
 - 바닥 및 벽체공사, 출입문 교체 등
 - 강의실 기자재 구매 / 책상, 의자, 영상 및 음향시설 설치

2 문제점 및 향후대책

- 건물자체가 노후하여 승강기가 없고 2층으로 인한 노령층의 공간 접근성이 다소 떨어짐
- 주민자치프로그램 뿐 아니라 자생단체 모임 등 주민 소통 공간으로 탄력적 운영하여 공간 활용도를 더욱 높이는 방안 검토

3 현황(추진, 결과) 사진

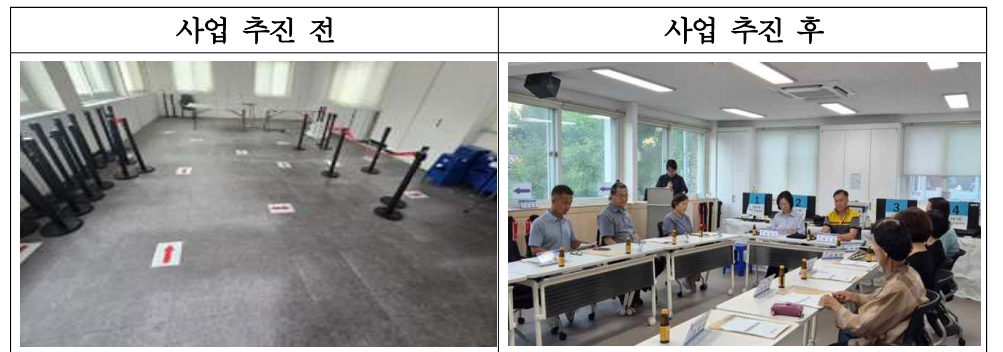

3	행정동단위 주민참여형	같이의 가치: 함께 즐겨요 목동 돛자리 영화제&청소년 보드게임 대회	추진중
---	----------------	--	-----

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026년 하반기
- (사업비) 10백만원 / ○ (집행액) 없음
- (사업위치) 목중로19번길 70(목동초등학교), 중촌동 253-2(중촌시민공원)
- (내용) 공원 내 돛자리를 활용한 야외 영화 상영 행사 운영 및 청소년 대상 보드게임 대회를 통한 활발한 관계 형성
- (사업추진현황및일정)

1. 목동 돛자리 영화제

- 사업 계획 수립 / 2026. 9월(예정)
- 영상·음향장비 임차 및 행사 준비 / 2026. 9월(예정)
- 영화제 개최 / 2026. 10월(예정)

2. 목동 청소년 보드게임 대회

- 사업 계획 수립 / 2026. 7월(예정)
- 참가자 모집 및 행사 준비 / 2026. 7월(예정)
- 보드게임 대회 개최 / 2026. 8월(예정)

2 문제점 및 향후대책

- 행사 준비 및 홍보의 체계적 추진을 통한 성공적인 행사 개최

주관부서	목동, 행정팀 (☎288-8452)
------	---------------------

4	행정동단위 주민참여형	불법투기 감시형 CCTV 설치	완료
---	----------------	------------------	----

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 1. ~ 2026. 3.
- (사업비) 4백만원 / ○ (집행액) 3백만원
- (사업위치) 목동로8번길 64
- (내용) 상습불법투기 지역에 불법투기 감시용 CCTV 설치
- (사업추진현황및일정)
 - 사업 계획 수립 / 2026. 1월
 - 도로점용허가 신청 / 2026. 2월
 - CCTV 구입 및 설치 / 2026. 3월

2 문제점 및 향후대책

- CCTV 상시 운영을 통해 불법투기를 예방하고, 위반행위 발생 시 관련 부서와 협조하여 신속히 대응

3 현황(추진, 결과) 사진



주관부서	목동, 행정팀 (☎288-8452)
------	---------------------

5	행정동단위 주민참여형	초등학교 주변 어린이보호구역 내 LED 바닥 조명 설치	완료
---	----------------	--------------------------------	----

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 1. ~ 2026. 2.
- (사업비) 5백만원 / ○ (집행액) 5백만원
- (사업위치) 목동로56번길 도로(목동초 주변) / 200m
- (내용) 매립형 태양광 LED 도로표지병 설치(4m 당 1개 / 총 50개)
- (사업추진현황 및 일정)
 - 사업 계획 수립 및 도로점용허가 신청 / 2026. 1월
 - 도로표지병 구입 및 설치 / 2026. 2월

2 문제점 및 향후대책

- 도로표지병 작동 상태 정기적 점검 및 고장·파손 발생 시 신속한 보수 실시

3 현황(추진, 결과) 사진



주관부서 목동, 행정팀 (☎288-8452)

6	행정동단위 주민참여형	우리동네 클린지킴이(불법투기 단속 CCTV)	완료
---	----------------	--------------------------	----


1 사업 추진 현황


- (사업기간) 2026. 3. 3.(화) ~ 4. 30.(목)
- (사업비) 8백만원 / ○ (집행액) 7.9백만원
- (사업위치) 목중로26번길 45 외 1개소
- (내용)
 - 생활폐기물 상습 무단배출로 도시미관 저해 및 악취발생
 - 주민참여예산 제안사업으로 선정된 생활환경개선 사업
- (사업추진현황)
 - 불법투기 단속 CCTV설치 계획서 수립 : '26. 3. 5.(목)
 - CCTV설치 보안성 검토 등 관련부서 사전 협의 : '26. 3. 9.(월)
 - CCTV 설치 행정예고 : '26. 3. 23.(월) ~ 4. 12.(일), 20일간
 - 물품 구매 및 설치 완료 : '26. 4. 30.(목)

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황(추진, 결과) 사진

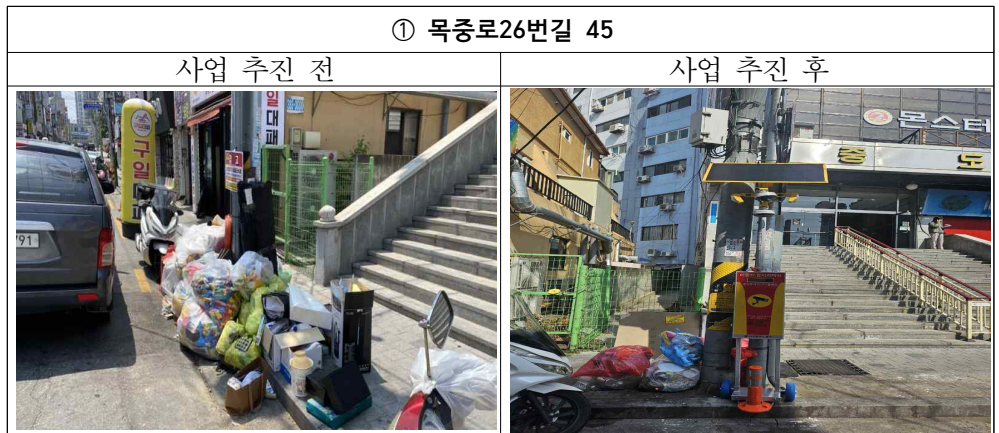

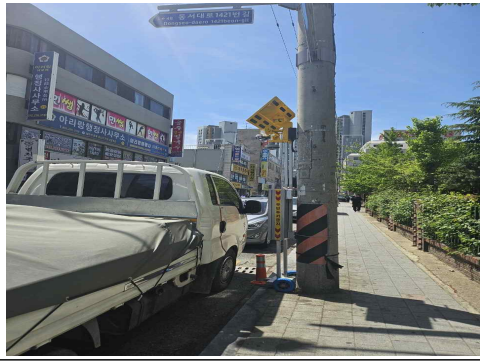② 목중로26번길 22	
사업 추진 전	사업 추진 후
	

주관부서	중촌동, 행정팀 (☎ 288-8482)
------	-----------------------

7	행정동단위 주민참여형	어르신 및 사회적 약자를 위한 휴식용 야외벤치 설치	완료
---	-------------	------------------------------	----


1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 3. 3.(화) ~ 3. 31.(화)
- (사업비) 9.4백만원 / ○ (집행액) 9.3백만원
- (사업위치) SK View아파트 및 금호아파트 주변 인도
- (내용)
 - 어르신 및 사회적 약자의 이동편의 증진과 안전한 보행환경 조성
 - 휴식공간 조성을 통한 주민 복지 증진 및 정주환경 개선
- (사업 추진 현황)
 - 휴식용 야외벤치 설치 계획서 수립 : '26. 3. 10.(화)
 - 도로점용 등 관련부서 승인 : '26. 3. 16.(월)
 - 물품 구매 및 설치 완료 : '26. 3. 31.(화)

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황(추진, 결과) 사진

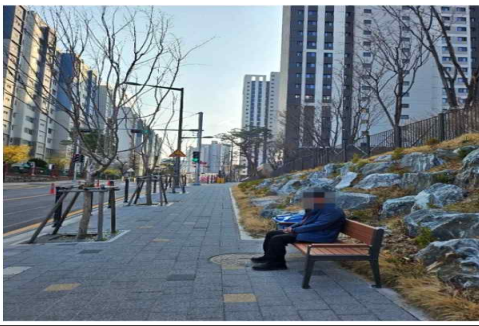사업 추진 전	사업 추진 후
	

주관부서	중촌동, 행정팀 (☎ 288-8482)
------	-----------------------

8	행정동단위 주민참여형	대흥동 작은도서관 신규 도서관구입	추진중
---	----------------	--------------------	-----

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 7월 중
- (사업비) 450만 원 / ○ (집행액) 0원
- (사업위치) 대흥동 행정복지센터 작은도서관
- (내용)
 - 최신 도서 및 다양한 분야의 도서를 확충하여 주민의 독서환경을 개선하고 작은도서관 이용 활성화 도모
- (사업추진현황 및 일정)
 - 2026. 7월 중 사업 완료 예정

2 문제점 및 향후대책

- 2026. 6. 29. 4층 평생학습관 이전에 따른 공간 이전 및 활용 계획 등을 다방면으로 검토하며 사업을 추진하고 있음.

주관부서	대흥동, 행정팀 (☎ 288-8512)
------	-----------------------

9	행정동단위 주민참여형	주민편의를 위한 야외벤치 설치	완료
---	----------------	------------------	----


1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 3. 27. ~ 2026. 4. 8.
- (사업비) 250만 원 / ○ (집행액) 238만 원
- (사업위치) 대고오거리 3개소, 대흥동네거리 1개소
- (내용)
 - 보행취약계층을 위한 야외벤치를 설치하여 주민 누구나 편하게 이용할 수 있는 휴식공간을 확충하고, 쾌적하고 안전한 생활환경을 조성
- (사업추진현황 및 일정) 2026. 4. 8. 벤치 설치 완료

2 문제점 및 향후대책

- 설치 대상지의 지반 높이가 일정하지 않아 벤치 하부 일부가 지면 위로 노출되어 미관이 다소 저해되고, 보행자가 발에 걸릴 우려가 있음
- 노출된 하부에 대한 마감 보완을 완료하여 보행자가 걸려 넘어질 위험을 최소화하는 등 초기 안전조치를 완료하였으며, 향후 지속적인 현장 모니터링을 통해 안전 위해요인 발생 여부를 수시로 점검하고 필요한 경우 즉시 보완 조치할 계획임.

3 현황(추진, 결과) 사진

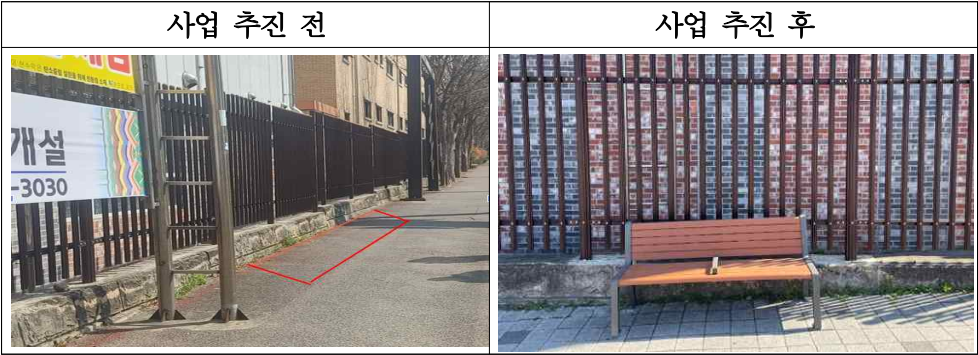

주관부서	대흥동, 행정팀 (☎ 288-8512)
------	-----------------------

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 3. ~ 2026. 6.
- (사업비) 10백만원 / ○ (집행액) 10백만원
- (내용)
 - 석교동 주민 인터뷰를 중심으로 한 마을 이야기 영상 및 지명유래 애니메이션 제작
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - (2026. 2. ~ 3.) 사업 추진계획 수립 및 영상 제작 방향 설정, 촬영·영상 제작 전문업체 선정 및 세부 추진 일정 협의
 - (2026. 3. ~ 4.) 지역 전경 촬영 및 주민 인터뷰 실시, 주민들의 삶과 지역 이야기를 담은 스토리텔링 자료 발굴
 - (2026. 4. ~ 6.) 인터뷰 기반 스토리텔링을 활용한 홍보영상 및 지명유래 애니메이션 제작, 의견 수렴을 통한 수정·보완 추진
 - (2026. 6. ~ 7.) 홍보영상 제작 완료 및 행정복지센터 민원실 상시 송출 및 학교·온라인 홍보 추진

2 문제점 및 향후대책

- 제작 영상을 석교동 행정복지센터 1층 민원실에서 상시 송출하여 방문 주민들에게 지속적으로 홍보
- 동 밴드, SNS 등을 활용하여 영상을 순차적으로 게시하고 지역 역사·문화 콘텐츠로 적극 홍보
- 관내 학교 및 어린이집 등에 홍보영상 및 공문을 송부하여 지역 이해 및 애향심 함양을 위한 교육자료로 활용
- 각종 지역행사 시 홍보자료로 활용하여 지역 정체성 확산 및 주민 관심 제고



1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 1. ~ 2026. 3.
- (사업비) 50백만원 / ○ (집행액) 49.8백만원
- (사업위치) 동 청사 1층 민원실, 3층 다목적실 및 로비
- (내용)
 - 홍보용 LED 디스플레이 설치(1층, 3층)
 - 이동식 배너 제작 및 설치(1층, 3층 로비)
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - (2026. 1.~2.)
 - 설치 대상 및 규격 확정, 사업 추진계획 수립, 업체 견적 비교·검토, 보안성 검토 및 보안대책 수립, 일상감사 및 계약심사 등 사전 행정절차 이행 완료
 - (2026. 2.)
 - 설치 환경(전원·벽체 등) 점검 및 전기시설 확인, 계약 체결 등 사업 추진 기반 마련
 - (2026. 3.)
 - 현장 설치 및 시운전, 최종 점검을 거쳐 사업 완료

2 문제점 및 향후대책

- 일부 디스플레이 콘텐츠의 가독성이 다소 떨어지고, 전달하고자 하는 내용이 한눈에 들어오지 않는 등 화면 구성의 개선 필요성이 제기됨
 - 글자 크기 확대, 핵심 메시지 중심의 간결한 화면 구성 등 콘텐츠 디자인 기준을 마련하여 가독성 및 정보 전달력 향상 추진
- 콘텐츠 구성의 복잡성으로 인해 홍보 효과가 저하될 우려가 있음
 - 불필요한 요소를 최소화하고 직관적인 레이아웃으로 개편하여 주민들이 쉽게 이해할 수 있도록 개선

○ 지속적인 콘텐츠 업데이트 및 관리 필요성 제기

→ 부서별 홍보자료를 정기적으로 수집·반영하고, 상시 점검 체계를 구축하여 최신 정보 제공 및 운영 활성화 도모

3 현황(추진, 결과) 사진



12	행정동단위 주민참여형	대사동 마을축제	추진중
----	----------------	----------	-----

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 9. 11. (금) 18:00 ~ 9. 12. (토) 21:00 / 예정
- (사업비) 25백만원
- (사업위치) 중구 충무로74번길 공용주차장 및 소공원
- (내용)
 - 개막행사, 문화행사, 체험부스 등 부대시설을 운영하여, 지역 주민·상인·관광객이 함께하는 지속가능한 참여형 축제 추진
 - 대사동만의 감성과 개성을 담은 차별화된 프로그램 발굴을 통해 관광객 유입 확대 및 지역경제 활성화 추진
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 2026. 7. 2. 축제 추진 기본계획 수립
 - 2026. 7. 10. 대행사 업체 선정 및 계약 체결 (예정)
 - 2026. 8. 10. 축제 대행 용역 중간보고회 개최 (예정)
 - 2026. 9. 11. ~ 9.12. 축제 개최 (예정)

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

주관부서	대사동, 행정팀 (☎ 288-8613)
------	-----------------------

13	행정동단위 주민참여형	디지털 행정게시대 설치	완료
----	----------------	--------------	----

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 3월 ~ 2026. 4월
- (사업비) 25백만원 / ○ (집행액) 25백만원
- (사업위치) 대사동 행정복지센터 주출입구 옆
- (내용)
 - 동 행정복지센터 주 출입구 옆 디지털 행정게시대 설치
 - 행정소식을 신속하고 효과적으로 전달하여 주민의 정보 접근성 제고
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 2026. 2. 27. 설치 계획 수립
 - 2026. 3. 20. 계약 체결
 - 2026. 4. 8. 디지털 행정게시대 설치 완료

2 문제점 및 향후대책

- 시·구·동정 홍보 및 안내 사항 현행화 / 수시

3 현황(추진, 결과) 사진



주관부서	대사동, 행정팀 (☎ 288-8613)
------	-----------------------


1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 3. 27. ~ 7. 3.
- (사업비) 20백만원 / ○ (집행액) 19.9백만원
- (사업위치) 제1제설창고: 부사동 422-36
제2제설창고: 부사동 365-8
- (내용)
 - 상습 결빙구간(오르막길) 중 주민 접근성이 좋은 위치에 제설창고 설치하여 주민 주도 제설 환경을 조성
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 우리마을 제설창고 설치공사 계약 /26. 3. 27.
 - 설치공사 설계변경(전기공사 분리발주에 따른 공사비감액) /26. 4. 22.
 - 제설창고 준공 /26. 5. 4.
 - 제설창고 전기 설비 설치 공사 준공 /26. 7. 3.

2 문제점 및 향후대책

- 제설창고 전기설비 설치 이후 염화칼슘, 너가래 등 제설장비 구비 예정

3 현황(추진, 결과) 사진

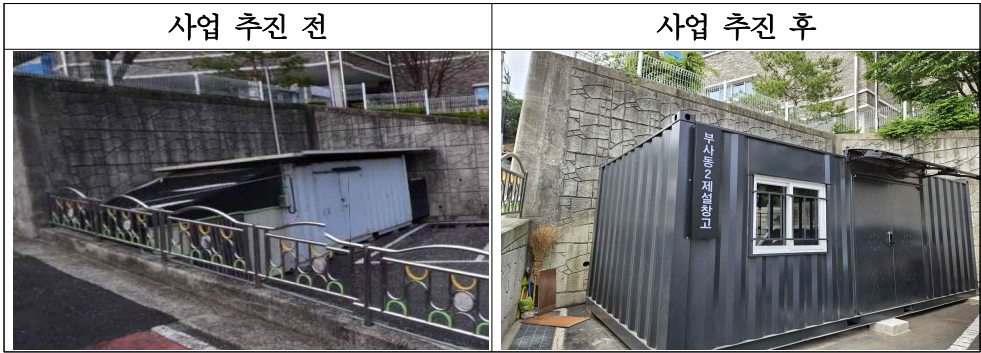

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 7. . ~
- (사업비) 10백만원 / ○ (집행액) 없음
- (사업위치) 보문로103번길 66 골목 등 5개소
- (내용)
 - 해충 상습 발생 위치에 해충포집기를 설치하여 쾌적한 환경을 조성
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 계약 추진예정/ 2026. 7. 이후

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황(추진, 결과) 사진

- 보문로103번길 66 골목 등 5개소 설치 예정



1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 4. 3. ~ 2026. 4. 23.
- (사업비) 15백만 원 / ○ (집행액) 14백만 원
- (사업위치) 서대전초등학교 담벼락
- (내용)
 - 지역주민이 함께 참여하는 관내 초등학교 담장 벽화도색
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 26. 4. 3.: 추진계획 수립
 - 26. 4. 13.: 용역계약 및 착수
 - 26. 4. 21.: 주민 및 학생과 함께하는 벽화 채색 활동
 - 26. 4. 23.: 용역 완료

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황(추진, 결과) 사진



1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 7. 13. ~ 2026. 10. 31.
- (사업비) 25백만원 / ○ (집행액) 미집행
- (사업위치) 태평아파트~쌍용예가아파트 사이 도로 (평촌로105번길)
- (내용)
 - 개막식 및 노래자랑 개최를 통한 지역 주민 참여형 축제 추진
 - 지역 주민, 자생단체, 학생 등이 함께하는 개막행사를 통해 축제의 시작을 알리고, 주민이 주인공이 되는 화합의 장 마련
 - 주민들의 무대 참여로 적극적인 축제 참여 확대 및 세대 간 소통 화합 도모
 - 체험 부스 및 먹거리 마당 운영
 - 지역 주민과 자생단체가 직접 참여하는 부스 운영을 통해 주민이 함께 준비하고 즐기는 참여형 축제 분위기 조성
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 2026. 7월 중 축제추진위원회 회의 개최
 - 2026. 9월 중 대행사 업체 선정 및 계약 체결
 - 2026. 9월 중 축제 대행 용역 중간보고회 개최
 - 2026. 10. 17. 축제 개최

2 문제점 및 향후대책


- 해당없음

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 3. 4. ~ 2026. 4. 8.
- (사업비) 12.25백만 원 / ○ (집행액) 12.166백만 원
- (사업위치) 태평2동 8통 6개소
- (내용)
 - 약 480m, 120개 설치 / 설치간격 3~10m(위치에 따라 차등 설치)
 - ①태평로93번길(약100m, 28개) ②태평로93번길 금오에너지 골목(약30m, 10개)
 - ③유등천동로514번길(약150m, 35개) ④태평로93번길 양덕산업 골목(약70m, 11개)
 - ⑤태평로93번길~동서대로1186번길 사이 골목(약30m, 8개) ⑥동서대로1168번길(약100m, 28개)
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 26. 3. 4. 도로표지병 구입 품의
 - 26. 3. 27. ~ 4. 7. 도로표지병 현장 설치
 - 26. 4. 8. 검수 및 대금 지급(사업 종료)

2 문제점 및 향후대책

- 도로표지병 추가 설치 소요 발생하여 차후 주민참여예산 등 검토 예정

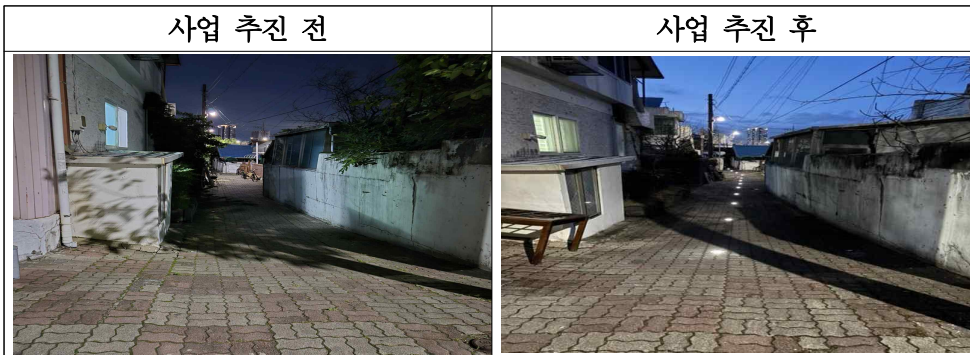3 현황(추진, 결과) 사진**1 사업 추진 현황**

- (사업기간) 2026. 4. 13. ~ 2026. 5. 8.
- (사업비) 50백만원 / ○ (집행액) 50백만원
- (사업위치) 대전 중구 문화로133번길 55, 유천2동 행정복지센터
- (내용)
 - 유휴 공간으로 오랜시간 방치되어 있던 역사관을 주민소통공간으로 리모델링
 - 노후화되고 비효율적인 공유주방 공간 일부 시설 확충 및 개선
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 주민참여예산사업 최종 선정 및 사업 예산 확정 / 2025. 9.
 - 2026년도 주민참여예산 사업 변경 심의 승인 완료 / 2026. 3.
 - 이웃나눔 주방 및 주민소통공간 조성 공사 추진 완료 / 2026. 4. ~ 5.

2 문제점 및 향후대책

- 예산 한계로 세부사안에 대한 주민의견이 적극적으로 반영되지 못함
- 추후 주방 시설에 대한 주민 의견을 지속적으로 수렴 및 반영하여 주민 수요에 부합하는 주방 공간 조성

3 현황(추진, 결과) 사진



20	행정동단위 주민참여형	지역 어르신 피로 회복과 삶의 활력소 족욕기 설치 사업	완료
----	-------------	--------------------------------	----

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 2. ~ 2026. 3.
- (사업비) 10백만원 / ○ (집행액) 8백만원
- (사업위치) 유천2동 관내 경로당 8개소
- (내용)
 - 관내 경로당 8개소에 족욕기를 설치하여 어르신들의 신체적 건강 증진을 도모하고, 경로당 이용 활성화에 기여하고자 함
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 주민참여예산사업 최종 선정 및 사업 예산 확정 / 2025. 9.
 - 사업 계획 수립 및 족욕기 설치 완료 / 2026. 2. ~ 3.

2 문제점 및 향후대책

- 족욕기 설치 및 운영과 관련하여 특별한 문제점은 없는 것으로 검토
- 지속적인 활용을 위해 정기적인 점검을 실시하고, 어르신들의 의견을 수렴하여 안전하고 쾌적한 이용환경이 유지될 수 있도록 관리

3 현황(추진, 결과) 사진



주관부서	유천2동, 행정팀 (☎ 288-8823)
------	------------------------



1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 1. 9. ~ 2026. 2. 3.
- (사업비) 20백만원 / ○ (집행액) 19.6백만원
- (사업위치) 중구 서문로 195(문화1동 행정복지센터 4층 다목적실)
- (내용)
 - 노후된 엠프로 주민자치프로그램 이용중 불편 민원 발생
 - 노후 음향시설 4개 및 마이크 컨트롤 시스템 교체
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 26.2. 음향시설 및 마이크 컨트롤 시스템 교체 완료

2 문제점 및 향후대책

- 꾸준한 관리를 통해 주민자치프로그램 이용에 불편함이 없도록 노력

3 현황(추진, 결과) 사진



1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 3. 1. ~ 2026. 3. 31.
- (사업비) 25백만원 / ○ (집행액) 24,9백만원
- (사업위치) 중구 서문로 195(문화1동 행정복지센터)
- (내용)
 - 기존 종이 인쇄물 게시판 노후에 따른 홍보물 게시 어려움
 - 다양한 이미지(영상)를 통해 주민들에게 홍보
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 26. 3. 디지털 홍보 게시판 설치 완료

2 문제점 및 향후대책

- 주민들에게 꾸준하게 쉽고 다양한 지역현안 내용 홍보

3 현황(추진, 결과) 사진



1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 2월 ~ 2026. 3월
- (사업비) 45백만원 / ○ (집행액) 44백만원
- (사업위치) 문화2동 행정복지센터(2층)
- (내용) 주민센터 유휴공간 활용 실내체육시설(탁구장) 조성
 - 유휴공간 환경개선(석면제거, 리모델링), 안전 및 편의시설 확보
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 2026. 2월 동 청사 실내체육시설(탁구장) 조성 추진계획 수립
 - 2026. 3월 공사(석면, 전기, 실내건축) 계약
 - 2026. 3월 착공 및 준공

2 문제점 및 향후대책

- 주민 현장 모니터링 의견을 반영하여, 향후 예산 및 공간 여건을 검토하여 탁구대 추가 구입 및 교체 추진
- ※ 추진상 문제점, 향후 대책, 미추진 사유 등 기재(주민 현장 모니터링 의견 반영)

3 현황(추진, 결과) 사진



1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 4. 1. ~ 2026. 7. 15.
- (사업비) 50백만원
- (사업위치) 산성동행정복지센터(대둔산로433), 정생보건진료소(정생로 3)
- (내용) LED디지털 행정게시대 설치
 - 동 청사 출입구(2대) 및 민원실(1대)
 - 정생보건진료소 외벽(2대)
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 2026. 4. 7. 보안성검토 의뢰
 - 2026. 5. 12. 디지털행정게시대 납품 계약
 - 2026. 7. 15. 설치 및 사업비 집행 예정 / 옥외광고물 제정 제24호에 따른 설치일차 연기

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 5. ~ 2026. 6.
- (사업비) 4백만원 / ○ (집행액) 2.8백만원
- (사업위치) 중구 자율방범대원 운영 사업장 11개소
- (내용) 자율방범대원의 집 명패 제작 및 설치
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - (26. 4월) 자율방범대 명패 설치 대상자 추천 완료 / 중부서→자치분권과
 - (26. 5월) 계획 수립 및 제작 업체 계약 후 명패 제작 후 부착 완료

2 문제점 및 향후대책

- 설치 희망 대상자가 예상보다 적어 당초 계획 대비 제작 수량이 축소됨
- 명패 설치 이후 훼손·고장 발생 시 유지관리 및 수리비가 지속적으로 발생할 우려가 있으며, 이에 따른 행정적·재정적 부담이 예상
- 사업 수요가 제한적이고 설치 효과가 크지 않은 것으로 판단됨에 따라 향후 동일 사업은 신규 추진을 지양

3 현황(추진, 결과) 사진



26	구정참여형	중촌동 내 공영주차장 주차차단기(바) 설치	완료
----	-------	-------------------------	----

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026년 3월
- (사업비) 5,000천원 / ○ (집행액) 4,719천원
- (사업위치) 대전 중구 목중로70번길 8
- (내용)
 - 죽말 경로당 아래 주차장에 주차차단기(바) 구입 및 설치
- (사업추진현황 및 일정)
 - 설치 완료 / 2026. 3. 24.

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황(추진, 결과) 사진



주관부서	일자리경제과, 일자리청년지원팀 (☎ 606-7242)
------	-------------------------------

27 28	구정참여형	문창, 부사시장 경관조명 개선사업	완료
----------	-------	--------------------	----

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 04. 30.~ 2026. 06. 22.
- (사업비) 80백만원 / (집행액) 70백만원
- (사업위치) 중구 문창, 부사시장 일원
- (내용) 열주등 8개, 보안등 8개, 라인조명 17개 등 설치
- (사업추진현황 및 일정)
 - 2026. 03: 실시설계 완료
 - 2026. 04. 30: 공사 착공
 - 2026. 06. 22: 공사 준공

2 문제점 및 향후대책

- 해당사항 없음

3 현황(추진, 결과) 사진



주관부서	건설과, 조명팀 (☎ 606-6842)
------	-----------------------

29 30	구정참여형	유천1동, 호동 LED 보안등 설치사업	완료
----------	-------	-----------------------	----

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 05. 18.~ 2026. 06. 05.
- (사업비) 13백만원 / (집행액) 12백만원
- (사업위치) 중구 유천1동, 호동 일원
- (내용) 보안등 23등 정비
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 2026. 03: 현장 점검 및 설계
 - 2026. 05. 18: 공사 착공
 - 2026. 06. 05: 공사 준공

2 문제점 및 향후대책

- 해당사항 없음

3 현황(추진, 결과) 사진

사업 추진 전	사업 추진 후
	

주관부서 건설과, 조명팀 (☎ 606-6846)

31	구정참여형	과례육교 핸드레일 설치	완료
----	-------	--------------	----


1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 3. 16. ~ 2026. 5. 5.
- (사업비) 10백만원 / (집행액) 10백만원
- (사업위치) 문화동 118-2
- (내용)
 - 과례육교 핸드레일 설치 30m
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 2026. 2. : 현장조사 및 제품조사
 - 2026. 3. 16. ~ 2026. 4. 27.: 과례육교 핸드레일 설치
 - 2026. 4. 27. : 검수 완료

2 문제점 및 향후대책

- 해당없음

3 현황(추진, 결과) 사진

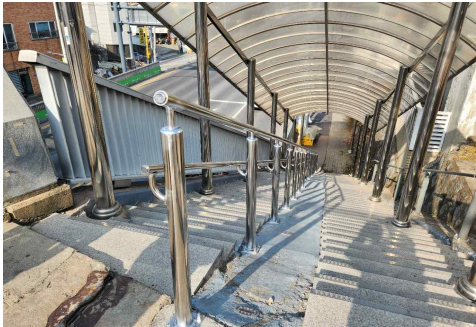사업 추진 전	사업 추진 후
	

주관부서 건설과, 도로팀 (☎ 606-6827)

32	구정참여형	벌레 없는 쾌적한 우리 동네 공원 만들기	완료
----	-------	------------------------	----

1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 3. 26 ~ 2026. 4. 16.
- (사업비) 4.5백만원 / ○ (집행액) 4.3백만원
- (사업위치) 버드내조폐근린공원 / 태평동 421-5 일원
- (내용)
 - 손소독기(수동분사식 10L) 4대 설치
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 2026. 3. 26.: 해충기피제 구입의뢰
 - 2026. 4. 16.: 해충기피제 4대 설치완료

2 문제점 및 향후대책

- 해당 없음

3 현황(추진, 결과) 사진



주관부서 공원녹지과, 공원관리팀 (☎ 606-6605)

33	구정참여형	문화1동 방범용 CCTV 설치	완료
----	-------	------------------	----


1 사업 추진 현황

- (사업기간) 2026. 1. 1. ~ 2026. 3. 31.
- (사업비) 20백만원 / (집행액) 19.9백만원
- (사업위치) 문화동 342번지(철길 옆 인근)
- (내용)
 - 문화동 342 철길 지하도 인근 방범용 CCTV 설치
 - 카메라 전방위(360도) 고정형 1대, 회전형 1대, 비상벨 1식
- (사업 추진 현황 및 일정)
 - 2026. 2. 5 조달청(관급자관급) 계약 체결
 - 2026. 3. 24 납품 및 설치 완료

2 문제점 및 향후대책

- 이상 없음

3 현황(추진, 결과) 사진

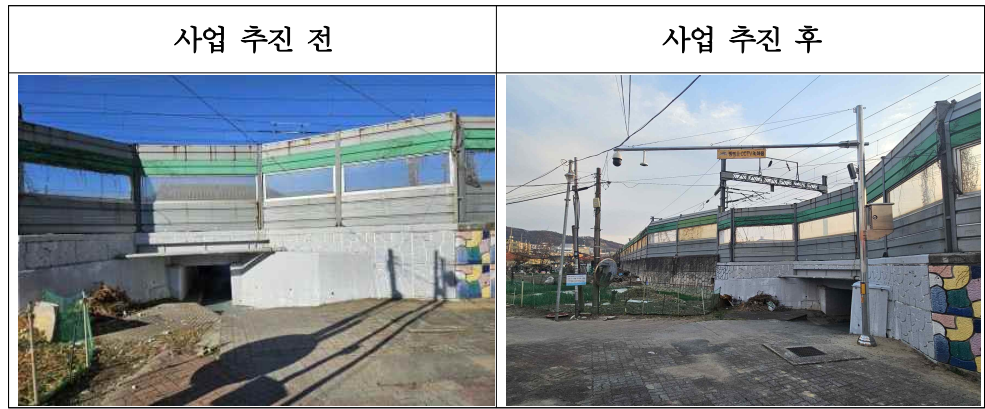

주관부서 회계과, 통신팀 (☎ 606-6094)
