

2025년도 예산반영 주민참여예산 사업 추진현황

□ 주민제안사업

(단위 : 백만원)

연 번	제안사업명	부서명	'25년 반영현황		
			사업명	예산액	완료 여부
	15건			1,624	
1	시·군유지 활용방안	산림 휴양과	범서 공한지 쉼터 정비사업	100	미추진 (사업변경)
2	범서읍 구영리 선사공원 맨발산책로 조성 및 공원환경 개선	산림 휴양과	선사공원 맨발산책로 조성공사 ('24년 사업완료)	150	추진 완료
3	소호리 와리 경로당 실내 환경 개선 사업	노인 장애인과	경로당 환경개선 비품 구입	520	추진 완료
4	웅기종기시장 주차장 인근 지하차도 환경 개선	농업 정책과	온양 웅기종기 시장 옆 지하차도 용수로 복개 공사	50	추진 완료
5	웅기종기시장 주차장 인근 지하차도 폐쇄형 하수구 설치				
6	해안가 및 태화강 주변 방치쓰레기 주기적 청소	축수산과	취약해안 폐기물 대응사업 재해쓰레기 처리용역 해양쓰레기 처리사업	390	추진 완료
7	범서읍 학생, 직장인, 어르신 대상 생활안전 교육 프로그램 운영	안전 총괄과	찾아가는 안전교실 어린이 재난 안전 뮤지컬 이동형 재난안전 체험관	164	추진 완료
8	무단횡단 방지를 위한 안전 시설물 센터	교통 정책과	교통시설 정비	3	추진 완료
9	초천교 진입로 출입가능 신호 표시등 설치	교통 정책과	교통시설 정비	1	추진 완료
10	태화강변(강변그린빌 뒤편) 계단 정비	건설과	하천관리 ('24년 사업완료)	2	추진 완료

11	울주군 상북면 소호리(당리) 마을 안길 정비(포장)	도로과	상북 소호 마을안길 재포장공사	80	추진중
12	청량읍 반정마을 입구 교통사고 및 주민 위험 요소 해결	도로과	도로관리 일반	4	추진 완료
13	울주군 범서읍 점촌 3길 5 가로수 경계석 정비	도로과	도로관리 일반 ('24년 사업완료)	50	추진 완료
14	배수구 공사	도로과	서생 용리 덕골재길 배수로 정비공사	100	추진 완료
15	언양읍성 마을 경관개선 사업	언양읍	언양읍성 경관개선 화단 조성	10	추진 완료

□ 지역회의 제안사업

(단위 : 백만원)

연 번	읍면명	제안사업명	부서	'25년 반영현황		
				사업명	예산액	완료 여부
		22건			1,890	
16	두동면	두동면 끊어진 벚꽃길 연결하여 경관 이미지 쇄신	산림 휴양과	두동 벚나무길 정비사업	30	미추진
17	온양읍	온양읍 지역주민 안전을 위한 안심귀가 로고라이트 설치	홍보 미디어과	야간 보행길 안전을 위한 LED 전광판 설치	70	추진 완료
18	삼남읍	삼남읍 지역주민 안전을 위한 로고젝터 설치사업	홍보 미디어과			
19	범서읍	음식물 쓰레기 줄이기 경진대회	자원 위생과	음식물류폐기물 발생억제 및 감량 우수 주민 등 인센티브 제공	4	추진 완료
20	범서읍	독거노인 반려식물 제공	농업 정책과	텃밭상자 보급	13	추진 완료

연 번	읍면명	제안사업명	부서	'25년 반영현황		
				사업명	예산액	완료 여부
21	삼동면	삼동면 연꽃단지 내 야간 조명(태양광) 설치	농업 정책과	삼동 연꽃단지 환경 정비	374	추진 완료
22	웅촌면	하천 재해위험지역 자동차단기 설치	안전 총괄과	재난관리기금 운용 (재난 예방 및 응급 복구 사업) ('24년 사업완료)	75	추진 완료
23	온양읍	남창강변로 조명 설치 및 환경개선	건설과	온양 남창강변로 (운화리 1328-85번지 일원) 조명설치 공사	40	추진 완료
24	청량읍	청량천 산책로 바닥재질 교체	건설과	청량천 산책로(상남리 1140-79번지 일원) 정비공사	200	추진 완료
25	웅촌면	웅촌면 은현리 1299-57(천)일원 소하천 정비	건설과	웅촌 덕산천(은현리 1299-57번지 일원) 정비공사	200	추진 완료
26	웅촌면	간이상수도(지하수) 관정 태양광 시범 설치	건설과	간이급수시설 유지관리	8	추진 완료
27	범서읍	도로 과속방지 황색 돌출 과속방지선 이중표시	도로과	도로관리 일반	9	추진 완료
28	범서읍	범서 태화강변 가로등 보강사업	도로과	범서태화강변 가로등보강사업	90	추진 완료
29	온산읍	덕신교-오산교 구간 강변 테크 및 전망대 설치	도로과	도로관리 일반	60	미추진
30	온양읍	야간에 잘 보이는 횡단보도 LED 도로표지병 설치	도로과	도로관리 일반	30	추진 완료
31	서생면	온곡2구 마을 가로등 설치 사업	도로과	온곡2구 마을 가로등 설치 사업	62	추진 완료
32	웅촌면	도로반사경 태양광 열선 시범 설치	도로과	도로관리 일반	6	추진 완료
33	삼동면	금곡마을 도로 가드레일(방호울타리) 설치	도로과	도로관리 일반	50	추진 완료

연 번	읍면명	제안사업명	부서	'25년 반영현황		
				사업명	예산액	완료 여부
34	삼동면	지랑마을 군도(34호선) 옆 보행로 설치	도로과	도시계획도로정비	500	추진 완료
35	삼동면	하잠 마을안길(하잠리 189-2) 재포장	도로과	도로관리 일반	11	추진 완료
36	범서읍	예비아빠 교육 (임산부 체험 포함)	건강 관리과	여성과 어린이 건강증진사업	8	추진 완료
37	상북면	항일운동마을 “스토리 텔링 벽화” 조성 사업	상북면	항일운동마을 스토리텔링 벽화 조성 사업	50	추진 완료

관리번호 2025-1	시·군유지 활용방안		
	범서 공한지 쉼터 정비사업		
담당부서	산림휴양과	담당자(행정전화)	☎204-1744
추진상황	추진중	추진완료	미추진
			✓

☐ 사업개요

사업위치	범서읍 굴화리 80-43 외 2필지
사업기간	2025. 01. ~ 2025. 12.
사 업 비	100,000천원
사업내용	공한지 쉼터 정비 1개소

☐ 추진계획 및 실적

- 실시설계용역 발주 2025. 02.
- 주민 민원 진달(사업계획 변경 요청) 및 회신 2025. 03.
- 실시설계용역 계약해지 2025. 03.
- 2025년 제2회 추가경정예산 전액 삭감 2025. 09.

※ 청년특화주택사업 추진으로 사업계획 변경[시 건축정책과]

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
	

관리번호 2025-3	소호리 와리 경로당 실내 환경 개선 사업		
	경로당 환경개선 비품 구입		
담당부서	노인장애인과	담당자(행정전화)	☎204-0925
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

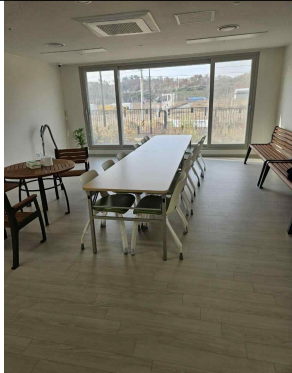
사업위치	울주군 관내 등록경로당
사업기간	2025. 03. ~ 2025. 12.
사 업 비	520,000천원
사업내용	경로당 입식환경 조성을 위한 테이블 및 의자 등 지원

☐ 추진계획 및 실적

- 시범 사업추진(6개소) 및 만족도 조사 실시 2024. 9.
- 경로당 별 수요조사 및 예산편성 2024. 9. ~ 11.
- 사업 세부 추진계획 수립 2025. 3.
- 경로당 별 비품 지원 신청 및 접수 2025. 4. ~ 5.
- 경로당 현장방문 조사 2025. 5. ~ 6.
- 경로당 416개소 중 386개소 지원 완료 2025. 7. ~ 11.

※ 200백만원 추가편성 후 전액 집행완료

☐ 현장사진

추진완료(1)	추진완료(2)
	

관리번호 2025-4, 5	웅기종기시장 주차장 인근 지하차도 환경개선 웅기종기시장 주차장 인근 지하차도 폐쇄형 하수구 설치		
	온양 웅기종기 시장 옆 지하차도 용수로 복개 공사		
담당부서	농업정책과	담당자(행정전화)	☎204-1555
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	온양읍 남창리 383-3번지 일원
사업기간	2025. 3. 28. ~ 2025. 5. 15.
사 업 비	50,000천원
사업내용	수로복개 L=21m, 그레이팅설치(1.0x1.0) 2EA

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2025. 1. ~ 2025. 3.
- 공사착공/용역착수 2025. 3. 28.
- 공사준공/용역완료 2025. 5. 14.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-6	해안가 및 태화강 주변 방치쓰레기 주기적 청소		
	취약해안 폐기물 대응사업/재해쓰레기 처리용역/ 해양쓰레기 처리사업		
담당부서	축수산과	담당자(행정전화)	☎204-1675
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	울주군 관내 어항 및 연안 일원
사업기간	2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
사 업 비	390,000천 원
사업내용	울주군 관내 어항 및 연안 내 어업폐기물, 해양쓰레기 처리

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2025. 1. 1. ~ 2025. 2. 28.
- 해양쓰레기 위탁처리용역 실시 2025. 2. 14. ~ 2025. 12. 31.
- 취약해안 폐기물 대응 사업 실시 2025. 4. 1. ~ 2025. 10. 19.

☐ 현장사진

시행 전 / 시행 중	시행 후
	
	

관리번호 2025-7	범서읍 학생, 직장인, 어르신 대상 생활안전 교육 프로그램 운영		
	찾아가는 안전교실, 재난안전 뮤지컬, 이동형 재난안전체험관 운영		
담당부서	안전총괄과	담당자(행정전화)	☎204-2314
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	관내 신청 시설
사업기간	2025. 3. ~ 2025. 11.
사 업 비	164,000천원
사업내용	찾아가는 안전교실, 재난안전 뮤지컬, 이동형 재난안전체험관 운영

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2025. 1.
- 찾아가는 안전교실 운영 2025. 3. ~ 11.
 - 생활안전 등 교육 실시 : 77개소, 3,387명
- 재난안전 뮤지컬 운영 2025. 5. ~ 9.
 - '오즈의 안전마법사' 운영 : 8회, 1,853명
- 이동형 재난안전체험관 운영 2025. 4. ~ 11.
 - 안전벨트, 지진 체험교육 등 실시 : 36개소, 1,521명

☐ 현장사진

추진 완료		
		
찾아가는 안전교실	재난안전 뮤지컬	이동형 재난안전체험관

관리번호 2025-8	무단횡단 방지를 위한 안전시설물 센터		
	교통시설 정비		
담당부서	교통정책과	담당자(행정전화)	☎204-2542
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	언양읍 남부리 340-70
사업기간	2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
사업비	300천원
사업내용	무단횡단 방지용 시선유도봉 설치

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립(연간 교통시설정비 단가계약) 2025. 1. 1.
- 시설물 설치(시선유도봉) 2025. 3. 10.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-9	초천교 진입로 출입가능 신호표시등 설치		
	교통시설 정비		
담당부서	교통정책과	담당자(행정전화)	☎204-2542
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	웅촌면 곡천리 73-4
사업기간	2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
사업비	100천원
사업내용	표시등 설치 1식

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립(연간 교통시설정비 단가계약) 2025. 1. 1.
- 시설물 설치(카메라, 표지병) 2025. 12. 8.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-11	울주군 상북면 소호리[당리] 마을안길 정비[포장]		
	상북 소호 마을안길 재포장공사		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2444
추진상황	추진중	추진완료	미추진
	✓		

☐ 사업개요

사업위치	상북면 소호리 854 일원
사업기간	2025. 1. ~ 2025. 12.
사 업 비	80,000천원
사업내용	재포장(L=500m, B=5m)

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2025. 1.
- 실시설계 용역 2025. 2. 4. ~ 2025. 3. 26.
- 토지사용동의 추진 2025. 1. ~

※ 마을안길은 비법정도로로 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 토지 등의 강제수용절차가 없으며, 공사 구간 내 사유지에 대한 토지사용 동의서가 제출되어야 공사착공이 가능함. [공사구간 45필지 중 사유지 24필지]

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
	

관리번호 2025-12	청량읍 반정마을 입구 교통사고 및 주민 위험 요소 해결		
	도로관리 일반		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2463
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	청량읍 삼정리 897 일원
사업기간	2025. 4. 30. ~ 2025. 8.
사 업 비	50,000천원
사업내용	도로 확장(콘크리트 수로 박스 설치, L=20m)

☐ 추진계획 및 실적

- 실시설계 용역 추진 2025. 4. 30. ~ 2025. 6. 30.
- 공사 착공 2025. 7.
- 공사 준공 2025. 8.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-14	배수구 공사		
	서생 용리 덕골재길 배수로 정비공사		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2642
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	울주군 서생면 용리 8-5번지 일원
사업기간	2025. 02. ~ 2025. 7.
사 업 비	40,000천원
사업내용	배수로 정비 1개소

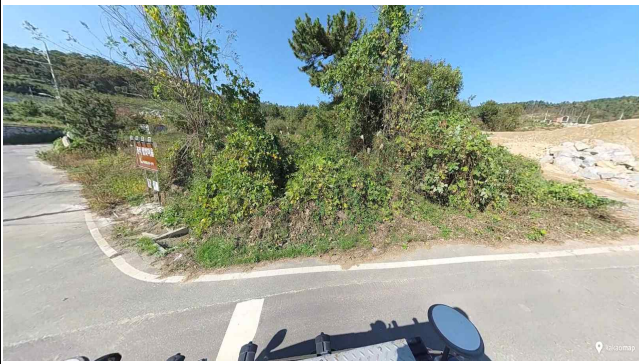
☐ 추진계획 및 실적

- 실시설계용역 발주 2025. 02. ~ 2025. 03.
- 공사 착공 2025. 05.
- 공사 준공 2025. 07.

☐ 예산집행 현황

편성액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고(집행 부진 사유 등)
40,000	40,000	100	

☐ 현장사진[시행 전, 후]

시행 전	시행 후/ 시행 중
	

관리번호 2025-15	언양읍성 마을 경관개선 사업		
	언양읍성 경관개선 화단 조성		
담당부서	언양읍	담당자(행정전화)	☎204-4413
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	언양읍성 일원
사업기간	2025. 04. 14. ~ 2025. 10. 31.
사 업 비	10,060천 원
사업내용	언양읍성 주변 화분 설치 및 꽃 심기

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 재료 구입 및 착수 2025. 04. 14.
- 사업완료 2025. 10. 31.

☐ 현장사진

시행 전	시행 후
	
	

관리번호 2025-16	두동면 끊어진 벚꽃길 연결하여 경관 이미지 쇄신		
	두동 벚나무길 정비사업		
담당부서	산림휴양과	담당자(행정전화)	☎204-1744
추진상황	추진중	추진완료	미추진
			✓

☐ 사업개요

사업위치	두동면 월평리 1346-2 일원
사업기간	2025. 01. ~ 2025. 12.
사 업 비	30,000천원
사업내용	벚나무 식재

☐ 추진계획 및 실적

- 관련부서 협의 및 소유자 조회 2025. 02.~03.
- 2025년 제2회 추가경정예산 전액 삭감 2025. 09. 15.
- ※ 사유지 동의 불가로 추진불가

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
	

관리번호 2025-17, 18	온양읍 지역주민 안전을 위한 안심귀가 로고라이트 설치 삼남읍 지역주민 안전을 위한 로고젝터 설치사업		
	야간 보행길 안전을 위한 LED 전광판 설치		
담당부서	홍보미디어과	담당자(행정전화)	☎204-0464
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	온양읍 운화리 3-18 등 20개소
사업기간	2025. 1. ~ 4.
사 업 비	70,000천 원
사업내용	기존 CCTV 시설물 활용 LED 전광판 20대 구입 및 설치

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2025. 01.
- 물품 납품 및 설치 완료 2025. 03.

☐ 현장사진

시행 전	시행 후
	

【참고자료】 주민참여예산사업 대상지

야간 보행길 안전을 위한 LED 전광판 설치 대상

연번	읍면	주 소		비고
		설치장소 명	지번	
	계		20개소	
1	온양읍	남창고등학교 앞	운화리 3-18	
2	온양읍	유니크빌 앞	운화리 3-17	
3	온양읍	미라주아파트 앞 삼거리	대안리 750-10	
4	온양읍	대안3리 경로당	대안리 576	
5	온양읍	미도파아파트	대안리 405-16	
6	온양읍	토리공원 외곽	대안리 408-4	
7	삼남읍	도손공원	교동리 1564-1	
8	삼남읍	마리공원	교동리 1570-3	
9	삼남읍	갤럭시빌 앞	교동리 1613-7	
10	삼남읍	옥토끼공원	교동리 1628-1	
11	삼남읍	울주몬테소리어린이집	교동리 962-4	
12	삼남읍	매디공원	교동리 1592-1	
13	삼남읍	해늘공원	교동리 1614-4	
14	삼남읍	홍단심공원	교동리 1637-4	
15	삼남읍	원화공원	교동리 1644-4	
16	삼남읍	방기공원	방기리 967-20	
17	삼남읍	운곡공원	방기리 953-7	
18	삼남읍	하방공원	방기리 968-5	
19	삼남읍	엘지마트 앞	방기리 978-3	
20	삼남읍	중방공원	방기리 972-7	

관리번호 2025-19	음식물 쓰레기 줄이기 경진대회		
	음식물류폐기물 발생억제 및 감량 우수 주민 등 인센티브 제공		
담당부서	자원위생과	담당자(행정전화)	☎204-2143
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	관내 100세대 이상 공동주택
사업기간	2024. 1. ~ 2025. 3.
사 업 비	4,000천원
사업내용	음식물류폐기물 발생억제 및 감량 우수 주민 등 인센티브 제공

☐ 추진계획 및 실적

- 음식물류 폐기물 배출량 조사 2024. 11.
- 음식물류 폐기물 배출량 평가 2024. 12.
- 감량 우수 공동주택 선정 및 결과 알림 2025. 2.
- 감량 우수 공동주택 인센티브 지급 2025. 3.

☐ 현장사진

시행 완료	
	울산 울주군, 음식물류 폐기물 감량 우수 아파트 선정 ▲ 민정연기자 · 김승연 2025.03.11 20:10 삼남읍 대원그린파크 최우수 등 4곳 울산 울주군이 음식물류 폐기물 감량 실적 우수 공동주택 4곳을 선정해 거액의 인센티브를 제공한다. 앞서 울주군은 지역 내 100세대 이상 공동주택을 대상으로 지난해 1월부터 10월까지 음식물류 폐기물 배출량 조사를 실시해 전년 동기 대비 감량율을 비교 분석했다. 그 결과, 가장 감량율이 높은 공동주택은 '대원그린파크(삼남읍)'가 선정돼 최우수를 받았다. 이어 '무림P&P 사원 아파트(문산읍)'가 우수로 뽑혔으며, '천상국제그린빌(병서읍)'과 '대원그린피아아파트(삼남읍)' 등 2곳이 장려로 선정됐다. 울주군은 '문산읍에서 울주군 음식물류폐기물 발생억제, 수집·운반 및 재활용에 관한 조례'에 따라 우수 공동주택 4개소에 총 400만 원 상당의 총량제 규격봉투 또는 음식물류 폐기물 납부할증증 제공할 계획이다. 울주군 관계자는 "음식물류 폐기물 감량에 함께 동참해주시는 주민들에게 감사드린다"며 "매년 음식물류 폐기물 감량 우수 공동주택을 선정하고 있으며 주민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다. 민정연기자 chngyrr@

2025-20	독거노인 반려식물 제공		
	텃밭상자 보급		
담당부서	농업정책과	담당자(행정전화)	☎204-1524
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업대상	울주군에 주민등록이 되어 있는 군민
사업기간	2025. 3. ~ 10.
사 업 비	16,000천원
사업내용	텃밭상자 공급

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2025. 3. 28.
- 사업대상 확정 및 통보 2025. 4. 21.
- 텃밭상자 보급 2025. 5. 13. ~ 5. 23.
- 보조금 지급 및 정산 2025. 5. ~ 10.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-21	삼동면 연꽃단지 내 야간 조명(태양광) 설치		
	삼동 연꽃단지 환경 정비		
담당부서	농업정책과	담당자(행정전화)	☎204-1563
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

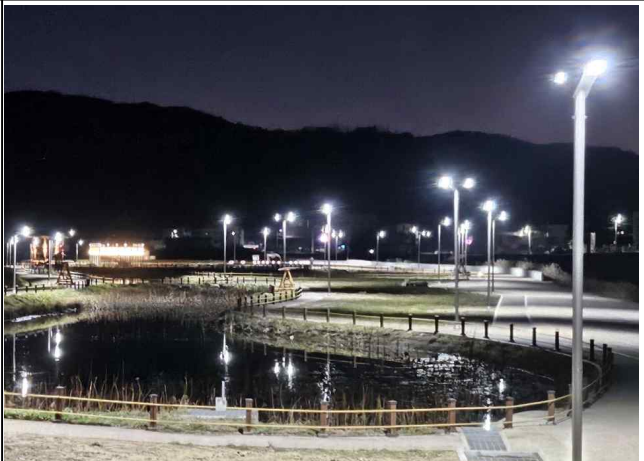
☐ 사업개요

사업위치	삼동면 하잠리 896번지 일원
사업기간	2025. 1. ~ 2025. 12.
사 업 비	375,080천원
사업내용	삼동 연꽃단지 환경 정비(유입수로 설치, 경관 조명·시설물 설치 등)

☐ 추진계획 및 실적

- 삼동 연꽃단지 유입수 정비공사..... 2025. 2. ~ 4.
- 삼동 연꽃단지 가로등 설치공사..... 2025. 9. ~ 12.
- 삼동 연꽃단지 시설물 보수공사..... 2025. 11. ~ 12.

☐ 현장사진(삼동 연꽃단지 유입수 정비공사)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2024-23	남창강변로 조명 설치 및 환경개선		
	온양 남창강변로 [운화리 1328-85번지 일원] 조명설치 공사		
담당부서	건설과 하천관리팀	담당자(행정전화)	☎204-2345
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

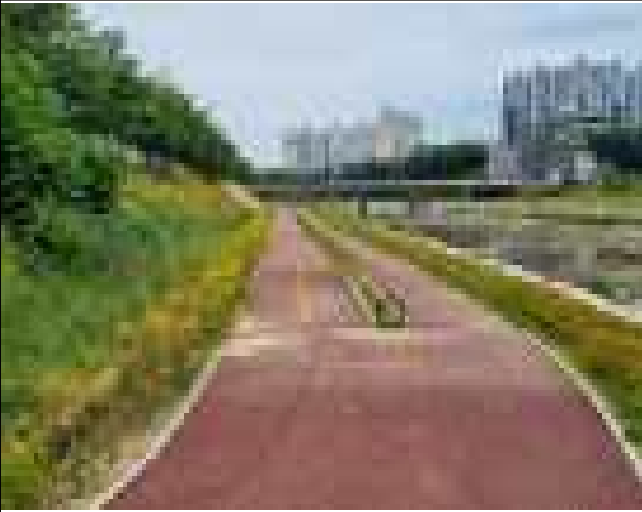
☐ 사업개요

사업위치	울산광역시 울주군 온양읍 운화리 1328-85번지 일원
사업기간	2024. 11. 27. ~ 2025. 01. 21.
사 업 비	106,000천원
사업내용	남창천변 산책로 가로등 설치공사

☐ 추진계획 및 실적

- 공사착공 2024. 11. 27.
- 공사준공 2025. 1. 21.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2024-24	청량천 산책로 바닥재질 교체		
	청량천 산책로(상남리 1140-79번지 일원) 정비공사		
담당부서	건설과	담당자(행정전화)	☎204-2344
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	울산광역시 울주군 온양읍 운화리 1328-85번지 일원
사업기간	2025. 4. 16. ~ 2025. 6. 14.
사 업 비	200,000천 원
사업내용	청량천 산책로(흙콘크리트 및 칼라아스콘) 재포장 요청

☐ 추진계획 및 실적

- 실시설계용역 추진 2024. 02. 24. ~ 2025. 04. 09.
- 공사착공 2025. 4. 16.
- 공사준공 2025. 6. 13.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-25	웅촌면 은현리1299-57번지 일원 소하천 정비		
	웅촌면 덕산천(은현리1299-57번지 일원) 정비사업		
담당부서	건설과	담당자(행정전화)	☎204-1833
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	웅촌면 은현리 1299-57번지 일원
사업기간	2025. 01. ~ 2025. 12.
사 업 비	200,000천 원
사업내용	석축 보수

☐ 추진계획 및 실적

- 공사착공 2025. 9. 16.
- 공사준공 2025. 12. 11.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-26	간이상수도(지하수) 관정 태양광 시범 설치		
	간이상수도(지하수) 관정 태양광 시범 설치		
담당부서	건설과	담당자(행정전화)	☎204-2352
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	웅촌면 검단리 1109-8번지 일원
사업기간	2025. 4. 8. ~ 2025. 5. 7.
사 업 비	10,546천 원
사업내용	태양광 발전설비(5kw) 설치

☐ 추진계획 및 실적

- 공사착공 2025. 4. 8.
- 공사준공 2025. 5. 7.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-27	도로 과속방지 황색 돌출 과속방지선 이중표시		
	도로관리 일반		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2464
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	울주군 관내
사업기간	2025. 1. ~ 2025. 12.
사 업 비	9,000천원
사업내용	과속방지턱 설치 시 교통량에 따라 도로 노면 표시

☐ 추진계획 및 실적

○ 과속방지 이중표시 장소 선정 및 설치 2025. 1. ~ 2025. 12.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-28	범서 태화강변 가로등 보강사업		
	범서 태화강변 가로등 보강사업		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2452
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	범서읍 사연교 ~ 사일교
사업기간	2025. 1. ~ 2025. 6.
사 업 비	90,000천원
사업내용	가로등 설치 1식

☐ 추진계획 및 실적

- 실시설계 용역 착수 및 완료 2025. 1. ~ 2025. 5.
- 전기사용 신청 완료 2025. 6.
- 공사착공 및 준공 2025. 5. ~ 6.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-29	덕신교-오산교 구간 강변 데크 및 전망대 설치		
	도로관리 일반		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2462
추진상황	추진중	추진완료	미추진
			✓

☐ 사업개요

사업위치	온산읍 덕신교~오산교 일원
사업기간	2025.
사 업 비	60,000천 원
사업내용	차량방호울타리(L=200m)

☐ 추진계획 및 실적

○ 사업 추진 검토 2025. 1.

※ 반대민원으로 장기 검토

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후/ 시행 중
	

관리번호 2025-30	야간에 잘 보이는 횡단보도 LED 도로표지병 설치		
	도로관리 일반		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2463
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	온양읍 남창리 19-9 일원 ~ 남창리 96-6 일원
사업기간	2024. 11. 1. ~ 2024. 12. 1.
사 업 비	56,578천 원
사업내용	도로표지병(태양광LED) 설치 498개

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2024. 10. 22.
- 설치 착수 2024. 11. 1.
- 설치 완료 2024. 12. 1.

☐ 현장사진(시행 전, 후)



관리번호 2025-31	온곡2구 마을 가로등 설치 사업		
	온곡2구 마을 가로등 설치 사업		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2452
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

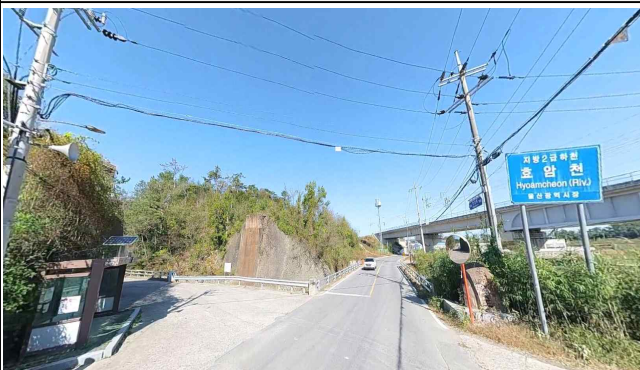
☐ 사업개요

사업위치	서생면 명산리 636-10 ~ 화산보건소
사업기간	2025. 1. ~ 2025. 6.
사 업 비	62,000천원
사업내용	가로등 설치 1식

☐ 추진계획 및 실적

- 실시설계 용역 착수 및 완료 2025. 1. ~ 2025. 5.
- 전기사용 신청 완료 2025. 6.
- 공사착공 및 준공 2025. 5. ~ 6.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-32	도로반사경 태양광 열선 시범 설치		
	도로관리 일반		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2464
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	검단사거리 등 2개소
사업기간	2025. 1. ~ 2025. 12.
사 업 비	6,000천 원
사업내용	열선 반사경 설치

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2025. 9.
- 설치 착수 2025. 10.
- 설치 완료 2025. 11.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-33	금곡마을 도로 가드레일(방호울타리) 설치		
	도로관리 일반		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2464
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	삼동면 금곡리 289-9 일원
사업기간	2025. 4. 14. ~ 2025. 5. 19.
사 업 비	34,113천 원
사업내용	가드레일 L=260m

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2025. 4. 14.
- 설치 착수 2025. 4. 21.
- 설치 완료 2025. 5. 19.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-34	지랑마을 군도(34호선) 옆 보행로 설치		
	도시계획도로 정비		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2464
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	삼동면 조일리 1434-24 일원
사업기간	2025. 5. 23. ~ 2025. 7. 21.
사 업 비	500,000천 원
사업내용	콘크리트 포장(L=374.6m, B=1.0~2.0m, T=15cm)

☐ 추진계획 및 실적

- 실시설계 용역 추진 2025. 2. 25. ~ 2025. 4. 25.
- 공사 착공 2025. 5. 23.
- 공사 준공 2025. 7. 21.

☐ 현장사진(시행 전, 후)



관리번호 2025-35	하잠 마을안길(하잠리 189-2) 재포장		
	도로관리 일반		
담당부서	도로과	담당자(행정전화)	☎204-2464
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	삼동면 하잠리 189-2
사업기간	2025. 2. 7. ~ 2025. 2. 14.
사 업 비	3,900천원
사업내용	아스팔트 덧씌우기

☐ 추진계획 및 실적

- 사업 추진계획 수립 2025. 2. 10.
- 공사 착공 2025. 2. 11.
- 공사 준공 2025. 2. 14.

☐ 현장사진(시행 전, 후)

시행 전	시행 후
	

관리번호 2025-36	예비아빠 교육		
	여성과 어린이 건강증진사업		
담당부서	건강관리과	담당자(행정전화)	☎204-2862
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ 사업개요

사업위치	울주군보건소(남부통합 · 범서지소 포함)
사업기간	2025. 02. 11. ~ 2025. 09. 18.
사 업 비	8,000천원
사업내용	예비아빠 육아교실, 임신부 체험, 오감발달 놀이교실 운영

☐ 추진계획 및 실적

- 안전한 출산지원 건강교실 계획 수립 2025. 02. 11.
- 예비아빠 육아교실 운영 2025. 03. 13.~ 2025. 09. 18.
 - 아기모형을 이용한 심폐소생술, 신생아~유아 성장과 발달 등 : 3기 9회
 - 예비아빠 임신부 체험 : 10명
- 오감발달 놀이교실 운영 2025. 04. 03. ~ 2025. 05. 02.
 - 12~30개월 영아와 함께하는 놀이체험 : 3기 124명

☐ 현장사진

예비아빠 육아교실	오감발달 놀이교실
	

관리번호 2025-37	항일운동마을 “스토리 텔링 벽화” 조성 사업		
	항일운동마을 스토리텔링 벽화 조성사업		
담당부서	상북면	담당자(행정전화)	☎204-4863
추진상황	추진중	추진완료	미추진
		✓	

☐ **사업개요**

사업위치	상북면 후리마을회관 일원
사업기간	2025. 04. 28. ~ 2025. 5. 20.
사 업 비	46,830천 원
사업내용	후리마을 항일운동 스토리텔링 벽화조성사업

☐ **추진계획 및 실적**

- 사업 추진계획 수립 2025. 04. 28.~ 2025. 04. 30.
- 공사착공/용역착수 2025. 04. 30.
- 공사준공/용역완료 2025. 05. 19.~ 2025. 05. 20.

☐ **현장사진(시행 전, 후)**

