

(‘25.9.기준)

2025년(‘24년 선정)
김해시 주민참여예산 제안사업
관리카드



김 해 시

김해시 주민참여예산 제안사업 관리카드 관리 목록

관리번호	부서명	사업명	사업비 (백만원)	추진상황
계		29건	2,712.03	
2023-01	도시디자인과	람사르습지를 품을 한림면	200	완료
2023-02	도시디자인과	장유1동 관문 표지판 교체	120	완료
2024-01	인구청년정책관	김해형 '로컬 브랜딩 스쿨' 사업	45.48	추진중
2024-02	인구청년정책관	청년삼야식당	34.6	추진중
2024-03	인구청년정책관	청년 금융문맹 제로 교육사업	24.96	추진중
2024-04	인구청년정책관	공공기관 취업 역량 교육 프로그램(NCS기반)	31.47	추진중
2024-05	예산법무과	주민참여예산 공모를 위한 컨설팅	12	완료
2024-06	여성가족과	아빠랑 캠퍼가자~!!	25.92	완료
2024-07	하천과	해빈천 치수벽 경관개선사업	15	완료
2024-08	건설과	상동면 대감리 347-11번지 일원 및 배수로 정비공사	150	완료
2024-09	교통혁신과	불암동 바닥형 LED 보행신호등 설치 사업	140	완료
2024-10	도시디자인과	온 세대가 함께 만들어가는 '마을이보이는라디오'	50	완료
2024-11	도시디자인과	활천중학교 통학 구간 옹벽 디자인 및 보안등 설치	150	완료
2024-12	농업정책과	청년농업인 찾아가는 심리안정 토(土)닥토(土)닥 사업	34	추진중
2024-13	농식품유통과	지역민을 위한 공유냉장고	3.6	추진중
2024-14	공원과	경운공원 리모델링 사업	50	완료
2024-15	공원과	금병공원 축구장 인조잔디 정비 사업	200	완료
2024-16	공원과	연지공원 수목 경관등 개선사업	200	완료
2024-17	공원과	연지공원 어린이 놀이터 정비 사업	170	완료
2024-18	공원과	대창들공원 체육시설 트랙 정비	200	완료
2024-19	공원과	임호공원 산책로 설치 사업	100	완료
2024-20	녹지과	부곡동 만발산책로 및 안전한 공원 조성사업	50	완료
2024-21	녹지과	『외동 걷고싶은 거리』 산책로 조성	150	추진중
2024-22	생활지원과	대창계곡 일대 가로등 교체	100	추진중
2024-23	생활지원과	청소년 범죄예방 환경조성을 위한 가로등 밝기 개선	85	추진중
2024-24	도시관리과	삼문고등학교 통학로 일원 노후 보도블록 교체사업	150	완료
2024-25	한림면	낙동강 솔외둑방길로 오세요	80	완료
2024-26	호현동	가야의 거리 분수광장 캐노피 및 무대 설치사업	100	완료
2024-27	장유1동	장유1동 지방도1030호선 진입 안전한 계단설치	40	완료

※ 2분기까지 기 추진완료 사업 관리카드 미첨부 / 관리카드 첨부 사업: 밑줄 표시

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-01	사업명	김해형 '로컬 브랜딩 스쿨' 사업	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	45,480	21,258	46.7%	완료기한 미도래 (진행 중)
사업개요	○ 사업위치 : 청년어울림센터 Station-G 삼방(김해시 삼안로291번길 47-15) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : 지역 특성을 반영한 창업 아이템 발굴 및 구체화 지원 ○ 사 업 량 : 창업 준비 청년 30명(상·하반기 각 15명 모집 운영)			
추진상황	○ '25. 2. : 사업계획 수립 및 계약체결 ○ '25. 2. ~ 3. : 제1기 대상자 모집 ○ '25. 3. 15. ~ 6. 30. : 제1기 로컬 브랜딩 실무 과정 9회 운영 ○ '25. 7. : 제2기 대상자 모집 ○ '25. 8. ~ 9. : 제2기 로컬 브랜딩 스쿨 운영(심화과정) ○ '25. 9. 20. : 로컬 브랜딩 팝업스토어 운영(2025 김해 청년 페스티벌)			
향후계획	○ '25. 10. ~ 11. : 로컬 브랜딩 스쿨 명사초청 특강 ○ '25. 12. : 로컬 브랜드 발표회 및 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-02	사업명	청년심야식당	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	34,600	16,360	47.2%	완료기한 미도래 (계약완료, 진행 중)
사업개요	○ 사업위치: 김해청년다움(김해시 분성로 365) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : 한끼 식사 공유를 통한 청년 교류 및 네트워킹 ○ 사업량 : 요리 수업을 동반한 인적 교류 희망 청년 400명			
추진상황	○ '25. 2. : 사업계획 수립 및 계약체결 ○ '25. 2. ~ 11. : 대상자 모집(상시) ○ '25. 2. 25. ~ 6. 30. : 청년심야식당 32회 운영(북어국, 해파리 냉채 등) ○ '25. 7 ~ 11. : 심야식당 계속 운영			
향후계획	○ '25. 12. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-03	사업명	청년 금융문맹 제로 교육사업	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	24,960	14,260	57.1%	완료기한 미도래 (진행 중)
사업개요	○ 사업위치: 김해청년다움(김해시 분성로 365) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : 금융 상품과 시장 구조 이해 등 금융 관련 교육 ○ 사업량 : 회계, 세무, 자산관리 등 금융관리에 관심 있는 청년 500명			
추진상황	○ '25. 2. : 사업계획 수립 ○ '25. 2. ~ 11. : 대상자 모집(상시) ○ '25. 3. 6. ~ 8. 31. : 청년금융학교 41회 운영 ○ '25. 9. 17. : 청년주간 기념 김경필(머니트레이너) 초청 자산관리 특강			
향후계획	○ '25. 10. ~ 12. : 금융학교 계속 운영 ○ '25. 12. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-04	사업명	공공기관 취업 역량 교육 프로그램(NCS기반)	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	31,470	13,420	42.6%	완료기한 미도래 (진행 중)
사업개요	○ 사업위치: 청년어울림센터 Station-G 삼방(김해시 삼안로291번길 47-15) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : NCS 교육반 운영, 공기업 취업 멘토링 콘서트 등 ○ 사 업 량 : 공공기관 취업 희망 청년 60명(상·하반기 각 30명 모집 운영)			
추진상황	○ '25. 1. : 사업계획 수립 ○ '25. 3. 15. ~ 5. 31. : 제1기 NCS 교육반 12회 운영 ○ '25. 8. 23. ~ 10. 25. : 제2기 NCS 교육반 10회 운영			
향후계획	○ '25. 10. : 대상자 모집(제3기) ○ '25. 11. ~ 12. : 제3기 NCS 교육반 운영 ○ '25. 12. : 취업 멘토링 콘서트 및 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				

사업 후

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-06	사업명	아빠랑 캠핑가자~!	
부서명	여성가족과	담당자	330-3315	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	25,920	25,920	100%	
사업개요	○ 사업위치: 가야테마파크 카라반 캠핑장(김해시 가야테마길 161) ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 11. ○ 사업내용: 아빠와 자녀가 체험활동 및 자연 속 캠핑을 하며 엄마의 온전한 쉼을 위한 프로그램 운영 ○ 사업량: 60팀(120명)			
추진상황	○ '25. 2. : 상반기 계획 수립 ○ '25. 2. : 참여 가족 모집 ○ '25. 3. : 상반기 『아빠랑 캠핑가자』 사업수행 및 만족도 조사 ○ '25. 7. : 하반기 계획 수립 ○ '25. 8. : 참여 가족 모집 ○ '25. 9. : 하반기 『아빠랑 캠핑가자』 사업수행 및 만족도 조사			
향후계획	○ '25. 11. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)				
관련사진				
	단체사진(하반기)		활동사진(하반기)	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-10	사업명	온 세대가 함께 만들어가는 '마을이보이는라디오'	
부서명	도시디자인과	담당자	330-3633	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	50,000	50,000	100%	
사업개요	○ 사업명: 무계마을 시민방송국 시설개선사업 ○ 사업위치: 무계동 304-6번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 9. ○ 사업내용: 방송설비 1식(방송부스, 롤스크린, 폴딩도어, 간판 등) ○ 사업량: 방송국 리모델링 1식(연면적 A=41m²)			
추진상황	○ '25. 2. : 실시설계용역 착수 ○ '25. 5. : 설계용역 완료 ○ '25. 6. : 공사 착공 ○ '25. 8. : 공사기한 연장 ○ '25. 9. : 공사 준공			
향후계획				
기타 (애로사항 등)				
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-11	사업명	활천중학교 통학 구간 옹벽 디자인 및 보안등 설치	
부서명	도시디자인과	담당자	330-3633	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	150,000	150,000	100%	
사업개요	○ 사업명: 활천중학교 주변 디자인옹벽 설치공사 ○ 사업위치: 지내동 377-6번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 9. ○ 사업내용: 벽화설치, 타일 및 벽면 사인물 설치 등 ○ 사업량: 옹벽 시설개선 1식(L-130m, H=0.5~5.0m).			
추진상황	○ '25. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○ '25. 3. : 경관위원회 자문 신청 ○ '25. 5. : 주민설명회 및 설계용역 완료 ○ '25. 6. : 공사 착공 ○ '25. 9. : 공사 준공			
향후계획				
기타 (애로사항 등)				
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-12	사업명	청년농업인 찾아가는 심리안정 토닥토닥 사업	
부서명	농업정책과	담당자	350-4053	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	34,000	0	0%	농번기에 따른 사업 추진 지연
사업개요	○ 사업대상 : 관내 청년농업인 ○ 사업량 : 2개 사업(토닥토닥 힐링캠프, 심리상담 프로그램 운영) ○ 사업기간 : '25. 2. ~ 12. ○ 사업내용 - 청년농업인 토닥토닥 힐링캠프 운영 · 사업량 : 60여명 · 사업비 : 30,000천원(60명×500천원) · 사업내용 : 청년농업인 친목도모 및 교류 확대를 위한 선진농업 견학, 치유농업, 팜파티 등 힐링캠프 추진 - 청년농업인 토닥토닥 심리상담 프로그램 운영 지원 · 사업량 : 그룹별(15 ~ 20명)/8회 · 사업비 : 4,000천원 · 사업내용 : 심리적인 도움이 필요한 청년농을 위해 집단별 맞춤형 심리평가, 상담, 치료 및 교육 프로그램 운영			
추진상황	○ '25. 2. : 사업 프로그램 업무 협의(김해시정신건강복지센터) ○ '25. 3. : 김해시청년후계농업인회 간담회 개최 ○ '25. 4. : 구글폼을 이용한 자가진단 리스트 작성 ○ '25. 7. ~ 8. : 상담 서비스 위한 자가진단 조사 실시			
향후계획	○ '25. 10. ~ 11. : 심리상담 교육 프로그램 운영 및 청년농 토닥토닥 힐링 캠프 추진 ○ '25. 12. : 사업완료 및 정산			
기타 (애로사항 등)	○			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-13	사업명	지역민을 위한 공유냉장고	
부서명	농식품유통과	담당자	350-4112	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	3,600	0	0%	
사업개요	○ 사업위치: 김해시 일원 ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. ○ 사업내용: 누구나 음식을 냉장고에 넣어 놓고 누구나 음식을 가져갈 수 있는 공유 냉장고 설치 ○ 사업량: 2개소(당초 3개소에서 1개소 축소) - 공유냉장고 구입 및 보호케이스 설치비 상승으로 사업량 축소 (냉장고: 50만 원, 보호케이스: 100만 원+추가 홍보물 10만 원)			
추진상황	○ '24. 12. : 김해공유냉장고네트워크 추진위원회 구성(16개 단체) ○ '25. 3. : 김해공유냉장고네트워크 추진위원회 제4차 회의(정관안 마련) ○ '25. 6. : 김해공유냉장고네트워크 창립총회, 운영위원회 제1차 회의 ○ '25. 9. : 공유냉장고 운영자 모집 공고 및 신청자 면접			
향후계획	○ '25. 10. : 공유냉장고 운영자 1차 선정 및 개소 ○ '25. 11. : 공유냉장고 운영자 2차 선정 및 개소			
기타 (애로사항 등)	○ 김해공유냉장고네트워크 창립에 따라 효율적인 사업 추진 가능			
관련사진				
	사업 전			사업 후

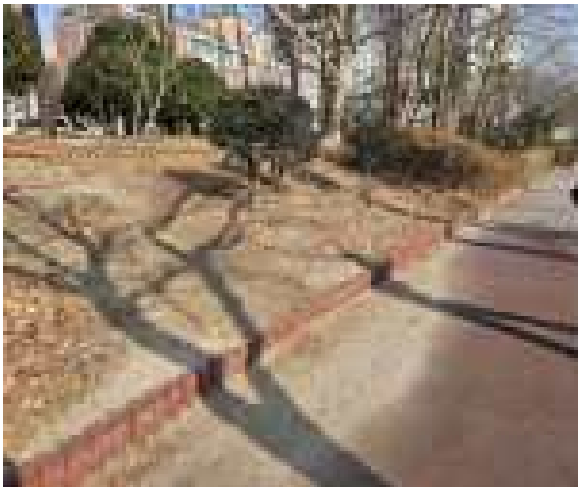
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-19	사업명	임호공원 산책로 설치 사업	
부서명	공원과	담당자	350-6333	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
				○
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	100,000	78,032	78%	
사업개요	○ 사업위치: 임호공원(외동 269 일원) ○ 사업기간: 2025. 5. ~ 6. ○ 사업내용: 산책로(흙콘크리트포장) 정비 300m ○ 사 업 량: 노후 산책로 보수 1식			
추진상황	○ '25. 3. : 설계 완료 ○ '25. 5. 12. : 착공 ○ '25. 7. 6. : 준공			
향후계획	○ '25. 10. ~ 11. : 집행잔액(22백만원) 추가 공사 예정			
기타 (애로사항 등)	○ 동일 현장 내 타공사와 중복 구간 정산하여 집행잔액 22백만원 발생 ※ 2025년도 4분기 내 집행잔액 활용한 2차분 공사 예정			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

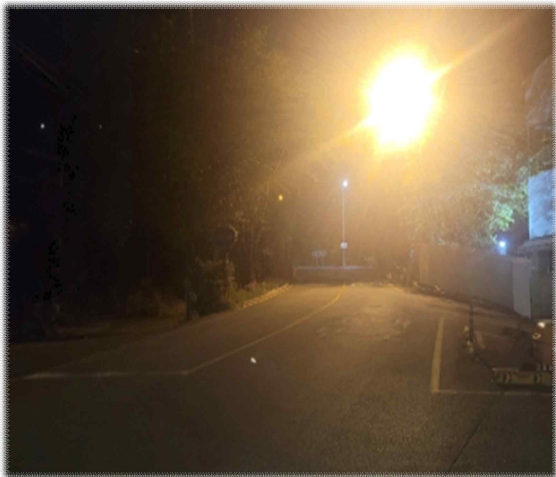
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-21	사업명	『외동 걷고싶은 거리』 산책로 조성	
부서명	녹지과	담당자	350-1983	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	150,000	132,420	88%	낙찰율, 정산 등으로 집행잔액 발생
사업개요	○ 사업위치 : 외동녹지대(외동 1269-1 외 3필지) ※ 외동 성원아파트 앞 ~ 한국1차아파트 앞 녹지대 ○ 사업기간 : 2025. 2 ~ 4월 ○ 사업내용 : 노후경계목 철거, 화단블럭 설치, 지반정리 등 ○ 사 업 량 : 노후경계목 철거 75m, 화단블럭 설치 950m, 지반정리 등			
추진상황	○ '25. 1. : 계획 수립 및 실시설계(자체) ○ '25. 3. : 사업 착공 ○ '25. 4. : 사업 완료			
향후계획	○ '25. 10. : 초화류(수국 외 10종, 1,700여본) 추가 식재			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

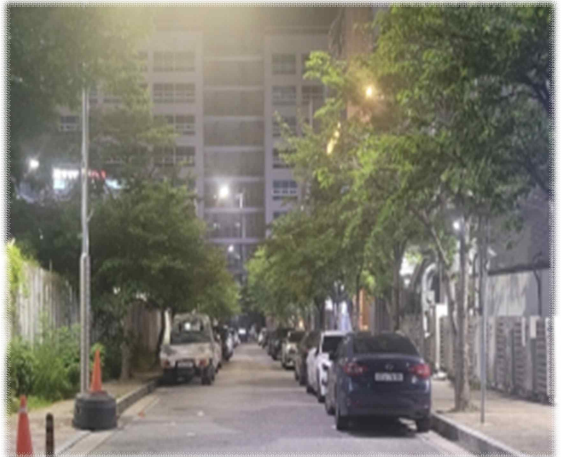
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-22	사업명	대청계곡 일원 도로조명 교체사업	
부서명	생활지원과	담당자	350-1353	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	100,000	90,901	91%	
사업개요	○ 사업위치: 대청동 776-6번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 6. ○ 사업내용: 노후 나트륨등(메탈등)을 고효율 LED로 교체 ○ 사업량: 가로등 및 보안등 140개소 ○ 사업목적: 조도개선을 통한 안전사고 예방 및 야간 경관 제고			
추진상황	○ '25. 2. : 현장조사 및 실시설계 ○ '25. 3. : 사업 시행 ○ '25. 4. ~ 11. : 사업 수행 ○ '25. 11. : 사업 완료 예정			
향후계획	○ '25. 11. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당 구간 보안등 추가 설치 민원 발생에 따라 추가사업 진행 중			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-23	사업명	울하1지구 중심상가 도로조명 개선사업	
부서명	생활지원과	담당자	350-1353	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	85,000	63,007	74%	
사업개요	○ 사업위치: 율하동 1418번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 6. ○ 사업내용: 지주식보안등 및 가로등 부착식 보안등 추가 설치 ○ 사업량: 보안등 28개소 ○ 사업목적: 조도개선을 통한 범죄예방 환경 조성			
추진상황	○ '25. 4. : 현장조사 및 실시설계 ○ '25. 5. ~ 10. : 사업 수행 ○ '25. 10. : 사업 완료 예정			
향후계획	○ '25. 10. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당 구간 내 보행등 추가 설치 민원 발생에 따라 추가 사업 진행중 ○ 해당 구간 노후 점멸기 고장에 따른 점멸기 교체 진행중			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-24	사업명	삼문고등학교 통학로 일원 노후 보도블럭 교체사업	
부서명	도시관리과	담당자	350-1928	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	150,000	148,873	99%	
사업개요	○ 사업위치: 삼문동 803-1 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 3. ○ 사업내용: 노후 보도블럭 교체 ○ 사 업 량: 보도블럭 교체(L=500m, B=2.5~3m)			
추진상황	○ '25. 1. : 실시설계 및 계획 수립 ○ '25. 3. ~ 4. : 내역서 검토 ○ '25. 6. ~ 7. : 설계내역서 수정 중(유류단가 등 실정에 맞춰 변경) ○ '25. 8. : 공사 착공 ○ '25. 9. : 공사 준공			
향후계획				
기타 (애로사항 등)				
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.9.30.기준)

관리번호	2024-25	사업명	낙동강 술뒤편길로 오세요	
부서명	한림면	담당자	359-1055	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	80,000	76,057	95%	집행잔액
사업개요	○ 사업목적 : 이용자 안전사고 예방 및 야간 경관 개선 ○ 사업명 : 술뒤편(이북제) 자전거도로 태양광등(도로표지병) 설치사업 ○ 위치 - 1구간 : 한림면 시산리 124-2 ~ 시산리 359-1번지(2,075m) - 2구간 : 한림면 가동리 248-2 ~ 가동리 93번지(418m) ○ 사업내용 : 도로표지병(LED, 매립형) 설치(L=2,493m / 841EA)			
추진상황	○ '25. 5. 23. : 하천점용허가 ○ '25. 6. 17. : 사업시행 ○ '25. 6. 27. : 설치완료 및 준공 인가 신청 ○ '25. 8. 13. : 하천점용공사 준공 인가			
향후계획	○ 사업 완료			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

[illegible]



김해시
GIMHAE

경상남도 김해시 김해대로 2401 기획조정실 예산법무과 : 055)330-6740
www.gimhae.go.kr
