

(‘25.6.기준)

2025년(‘24년 선정)
김해시 주민참여예산 제안사업
관리카드



김 해 시

김해시 주민참여예산 제안사업 관리카드 관리 목록

관리번호	부서명	사업명	사업비 (백만원)	추진상황
계		29건	2,712.03	
2023-01	도시디자인과	람사르습지를 품을 한림면	200	완료
2023-02	도시디자인과	장유1동 관문 표지판 교체	120	완료
2024-01	인구청년정책관	김해형 '로컬 브랜딩 스쿨' 사업	45.48	추진중
2024-02	인구청년정책관	청년삼야식당	34.6	추진중
2024-03	인구청년정책관	청년 금융문맹 제로 교육사업	24.96	추진중
2024-04	인구청년정책관	공공기관 취업 역량 교육 프로그램(NCS기반)	31.47	추진중
2024-05	예산법무과	주민참여예산 공모를 위한 컨설팅	12	완료
2024-06	여성가족과	아빠랑 캠퍼가자~!!	25.92	추진중
2024-07	하천과	해빈천 치수벽 경관개선사업	15	완료
2024-08	건설과	상동면 대감리 347-11번지 일원 및 배수로 정비공사	150	완료
2024-09	교통혁신과	불암동 바닥형 LED 보행신호등 설치 사업	140	완료
2024-10	도시디자인과	온 세대가 함께 만들어가는 '마을이보이는라디오'	50	추진중
2024-11	도시디자인과	활천중학교 통학 구간 옹벽 디자인 및 보안등 설치	150	추진중
2024-12	농업정책과	청년농업인 찾아가는 심리안정 토(土)닥토(土)닥 사업	34	추진중
2024-13	농식품유통과	지역민을 위한 공유냉장고	3.6	추진중
2024-14	공원과	경운공원 리모델링 사업	50	완료
2024-15	공원과	금병공원 축구장 인조잔디 정비 사업	200	완료
2024-16	공원과	연지공원 수목 경관등 개선사업	200	완료
2024-17	공원과	연지공원 어린이 놀이터 정비 사업	170	완료
2024-18	공원과	대창들공원 체육시설 트랙 정비	200	완료
2024-19	공원과	임호공원 산책로 설치 사업	100	추진중
2024-20	녹지과	부곡동 만발산책로 및 안전한 공원 조성사업	50	완료
2024-21	녹지과	『외동 걷고싶은 거리』 산책로 조성	150	추진중
2024-22	생활지원과	대창계곡 일대 가로등 교체	100	추진중
2024-23	생활지원과	청소년 범죄예방 환경조성을 위한 가로등 밝기 개선	85	추진중
2024-24	도시관리과	삼문고등학교 통학로 일원 노후 보도블록 교체사업	150	추진중
2024-25	한림면	낙동강 솔외둑방길로 오세요	80	추진중
2024-26	호현동	가야의 거리 분수광장 캐노피 및 무대 설치사업	100	완료
2024-27	장유1동	장유1동 지방도1030호선 진입 안전한 계단설치	40	완료

※ 1분기 기 추진완료 사업 밑줄 표시 및 관리카드 미첨부

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-01	사업명	김해형 '로컬 브랜딩 스쿨' 사업	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	45,480	13,800	30.3%	완료기한 미도래 (진행 중)
사업개요	○ 사업위치 : 청년어울림센터 Station-G 삼방(김해시 삼안로291번길 47-15) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : 지역 특성을 반영한 창업 아이템 발굴 및 구체화 지원 ○ 사업량 : 창업 준비 청년 30명(상·하반기 각 15명 모집 운영)			
추진상황	○ '25. 2. : 사업계획 수립 및 계약체결 ○ '25. 2. ~ 3. : 제1기 대상자 모집 ○ '25. 3. 15. ~ 6. 30. : 제1기 로컬 브랜딩 실무 과정 9회 운영			
향후계획	○ '25. 7. ~ 8. : 제2기 대상자 모집 ○ '25. 9. ~ 11. : 제2기 로컬 브랜딩 스쿨 운영(심화과정) ○ '25. 12. : 로컬 브랜드 발표회 및 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진 (4월~6월)				
	사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-02	사업명	청년심야식당	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	34,600	0	0%	완료기한 미도래 (계약완료, 진행 중)
사업개요	○ 사업위치: 김해청년다움(김해시 분성로 365) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : 한끼 식사 공유를 통한 청년 교류 및 네트워킹 ○ 사업량 : 요리 수업을 동반한 인적 교류 희망 청년 400명			
추진상황	○ '25. 2. : 사업계획 수립 및 계약체결 ○ '25. 2. ~ 11. : 대상자 모집(상시) ○ '25. 2. 25. ~ 6. 30. : 청년심야식당 32회 운영(북어국, 해파리 냉채 등)			
향후계획	○ '25. 7 ~ 11. : 심야식당 계속 운영 ○ '25. 12. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진 (4월~6월)				
	사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-03	사업명	청년 금융문맹 제로 교육사업	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	24,960	8,360	33.5%	완료기한 미도래 (진행 중)
사업개요	○ 사업위치: 김해청년다움(김해시 분성로 365) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : 금융 상품과 시장 구조 이해 등 금융 관련 교육 ○ 사업량 : 회계, 세무, 자산관리 등 금융관리에 관심 있는 청년 500명			
추진상황	○ '25. 2. : 사업계획 수립 ○ '25. 2. ~ 11. : 대상자 모집(상시) ○ '25. 3. 6. ~ 6. 30. : 청년금융학교 28회 운영			
향후계획	○ '25. 7. ~ 12. : 금융학교 계속 운영 ○ '25. 12. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진 (4월~6월)	 사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-04	사업명	공공기관 취업 역량 교육 프로그램(NCS기반)	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	31,470	8,730	27.7%	완료기한 미도래 (진행 중)
사업개요	○ 사업위치: 청년어울림센터 Station-G 삼방(김해시 삼안로291번길 47-15) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : NCS 교육반 운영, 공기업 취업 멘토링 콘서트 등 ○ 사 업 량 : 공공기관 취업 희망 청년 60명(상·하반기 각 30명 모집 운영)			
추진상황	○ '25. 1. : 사업계획 수립 ○ '25. 2. : 대상자 모집(상반기) ○ '25. 3. 15. ~ 5. 31. : NCS 교육반 12회 운영			
향후계획	○ '25. 7. : 대상자 모집(하반기) ○ '25. 8. ~ 10. : NCS 교육반 운영(하반기) ○ '25. 11. : 취업 멘토링 콘서트 ○ '25. 12. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진 (4월~6월)				

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-05	사업명	주민참여예산사업 공모를 위한 컨설팅	
부서명	예산법무과	담당자	330-6740	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
				○
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	12,000	8,427	70%	집행잔액
사업개요	○ 사업위치: 김해시 관내 5개 권역 ○ 사업기간: 2025. 3. ~ 4. ○ 사업내용 - 권역별 주민을 대상으로 찾아가는 컨설팅 실시 - 홍보물품 배부			
추진상황	○ '25. 3. : 계획 수립 ○ '25. 3. 6. : 컨설팅 실시(대동면) ○ '25. 3. 11. : 컨설팅 실시(진례면) ○ '25. 3. 18. : 컨설팅 실시(원도심-동상·회현·부원) ○ '25. 3. 25. : 컨설팅 실시(주촌면) ○ '25. 4. 8. : 컨설팅 실시(생림면) ○ '25. 5. 12. : 컨설팅 결과보고 ○ '25. 5. ~ 7. : 제안사업 접수 및 심의			
향후계획	○ 해당없음			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-06	사업명	아빠랑 캠핑가자~!	
부서명	여성가족과	담당자	330-3314	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	25,920	25,920	100%	
사업개요	○ 사업위치: 가야테마파크 카라반 캠핑장(김해시 가야테마길 161) ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 11. ○ 사업내용: 아빠와 자녀가 체험활동 및 자연 속 캠핑을 하며 엄마의 온전한 쉼을 위한 프로그램 운영 ○ 사업량: 60팀(120명)			
추진상황	○ '25. 2. : 상반기 계획 수립 ○ '25. 2. : 참여 가족 모집 ○ '25. 3. : 상반기 『아빠랑 캠핑가자』 사업수행 및 만족도 조사			
향후계획	○ '25. 7. : 하반기 계획 수립 ○ '25. 8. : 참여 가족 모집 ○ '25. 9. : 하반기 『아빠랑 캠핑가자』 사업수행 및 만족도 조사 ○ '25. 11. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	단체사진(상반기)		 활동사진(상반기)	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-08	사업명	상동면 대감리 347-11번지 일원 및 배수로 설치공사	
부서명	건설과	담당자	330-0877	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	150,000	150,000	100%	준공기한 미도래
사업개요	○ 사업위치 : 상동면 대감리 347-11번지 일원 배수로 정비공사 ○ 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 5. ○ 사업내용 : 농경지 침수 예방을 위한 배수로 정비 ○ 사업량 : U형개거 설치(2.5×1.5) L=156.4m			
추진상황	○ '25. 1. : 실시설계 완료 ○ '25. 3. : 공사착공 ○ '25. 5. : 공사완료			
향후계획	○ 해당없음			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 전		사업 완료	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-09	사업명	불암동 바닥형 LED 보행신호등 설치 사업	
부서명	교통혁신과	담당자	330-3553	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	140,000	138,088	98.6%	6월 집행완료
사업개요	○ 사업위치 - 불암동 지내삼거리, 지내동원아파트사거리, 양장골삼거리, 활천초(지내동 297-5) ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 6. ○ 사업내용: 보행자 통행량이 많고, 사고 위험이 높은 교차로에 바닥형 LED 보행신호등을 설치하여 보행자의 안전한 통행 여건 확보 및 횡단보도 교통사고 예방 ○ 사업량: 바닥형 LED 보행신호등 횡단보도 9개			
추진상황	○ '25. 1. ~ 2. : 김해중부경찰서 협의 및 현장 실사 ○ '25. 3. : 구매설치 발주(2개소) ※ 불암동 지내삼거리, 지내동원아파트사거리 ○ '25. 4. : 공사 착수 및 준공 ○ '25. 4. : 양장골삼거리 횡단보도 정비(도로과) ○ '25. 4. : 활천초 횡단보도 단일로 추가 설치 신청인과 협의완료 ○ '25. 5. : 구매설치 발주(2개소) ※ 양장골삼거리, 활천초 ○ '25. 5. ~ 6. : 공사 착수 및 준공			
향후계획	○ '25. 6. ~ 계속 : 바닥형 LED 보행신호등 관리철저			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 전(불암동 지내삼거리)		사업 후(불암동 지내삼거리)	

관련사진		
	사업 후(불암동 지내삼거리)	사업 후(불암동 지내삼거리)
		
	사업 전(지내동원아파트사거리)	사업 후(지내동원아파트사거리)
		
	사업 후(지내동원아파트사거리)	사업 후(지내동원아파트사거리)
		
	사업 전(양장골삼거리)	사업 후(양장골삼거리)

관련사진		
	사업 후(양장골삼거리)	사업 후(양장골삼거리)
		
	사업 전(활천초등학교)	사업 후(활천초등학교)
		
	사업 후(활천초등학교)	사업 후(활천초등학교)

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-10	사업명	온 세대가 함께 만들어가는 '마을이보이는라디오'	
부서명	도시디자인과	담당자	330-3633	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	50,000	5,410	11%	준공기한 미도래
사업개요	○ 사 업 명: 무계마을 시민방송국 시설개선사업 ○ 사업위치: 무계동 304-6번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 8. ○ 사업내용: 방송설비 1식(방송부스, 롤스크린, 폴딩도어 등) ○ 사 업 량: 방송국 리모델링 1식(연면적 A=41㎡)			
추진상황	○ '25. 2. : 실시설계용역 착수 ○ '25. 3. : 리모델링 방향 협의 ○ '25. 4. : 설계용역 추진 ○ '25. 5. : 설계용역 완료 ○ '25. 6. : 공사 착공			
향후계획	○ '25. 8. : 공사 준공			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 전			사업 후

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-11	사업명	활천중학교 통학 구간 옹벽 디자인 및 보안등 설치		
부서명	도시디자인과	담당자	330-3633		
추진상황	추진예정		추진중		추진완료
			○		
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액		집행률	비고 (미집행 사유 등)
	150,000	14,450		10%	준공기한 미도래
사업개요	○ 사 업 명: 활천중학교 주변 디자인옹벽 설치공사 ○ 사업위치: 지내동 377-6번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 9. ○ 사업내용: 벽화설치, 타일 및 벽면 사인물 설치 등 ○ 사 업 량: 옹벽 시설개선 1식(L-130m, H=0.5~5.0m).				
추진상황	○ '25. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○ '25. 2. : 벽화 디자인 주민협의 ○ '25. 3. : 설계용역 추진 ○ '25. 4. : 경관위원회 자문 완료 ○ '25. 5. : 설계용역 완료 ○ '25. 6. : 공사 착공				
향후계획	○ '25. 9. : 공사 준공				
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음				
관련사진					
	사업 전		사업 후		

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-12	사업명	청년농업인 찾아가는 심리안정 토닥토닥 사업	
부서명	농업정책과	담당자	350-4053	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	34,000	0	0%	농번기에 따른 사업 추진 지연
사업개요	○ 사업대상 : 관내 청년농업인 ○ 사업량 : 2개 사업(토닥토닥 힐링캠프, 심리상담 프로그램 운영) ○ 사업기간 : '25. 2. ~ 12. ○ 사업내용 - 청년농업인 토닥토닥 힐링캠프 운영 · 사업량 : 60여명 · 사업비 : 30,000천원(60명×500천원) · 사업내용 : 청년농업인 친목도모 및 교류 확대를 위한 선진농업 견학, 치유농업, 팜파티 등 힐링캠프 추진 - 청년농업인 토닥토닥 심리상담 프로그램 운영 지원 · 사업량 : 그룹별(15 ~ 20명)/8회 · 사업비 : 4,000천원 · 사업내용 : 심리적인 도움이 필요한 청년농을 위해 집단별 맞춤형 심리평가, 상담, 치료 및 교육 프로그램 운영			
추진상황	○ '25. 2. : 사업 프로그램 업무 협의(김해시정신건강복지센터) ○ '25. 3. : 김해시청년후계농업인회 간담회 개최 ○ '25. 4. : 구글폼을 이용한 자가진단 리스트 작성 ○ '25. 7. : 상담 서비스 위한 자가진단 조사 실시			
향후계획	○ '25. 8. ~ 10. : 심리상담 교육 프로그램 운영 ○ '25. 9 ~ 10. : 청년농 토닥토닥 힐링캠프 추진 ○ '25. 12. : 사업완료 및 정산			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-13	사업명	지역민을 위한 공유냉장고	
부서명	농식품유통과	담당자	350-4112	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	3,600	0	0%	
사업개요	○ 사업위치: 김해시 일원 ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. ○ 사업내용: 누구나 음식을 냉장고에 넣어 놓고 누구나 음식을 가져갈 수 있는 공유 냉장고 설치 ○ 사업량: 2개소(당초 3개소에서 1개소 축소) - 공유냉장고 구입 및 보호케이스 설치비 상승으로 사업량 축소 (냉장고: 50만 원, 보호케이스: 100만 원+추가 홍보물 10만 원)			
추진상황	○ '24. 12. : 김해공유냉장고네트워크 추진위원회 구성(16개 단체) ○ '25. 3. : 김해공유냉장고네트워크 추진위원회 제4차 회의(정관안 마련) ○ '25. 6. : 김해공유냉장고네트워크 창립총회, 운영위원회 제1차 회의			
향후계획	○ '25. 7. : 공유냉장고 운영자 모집 공고 및 홍보물 제작 ○ '25. 8. : 공유냉장고 운영자 선정 ○ '25. 9. : 공유냉장고 개소			
기타 (애로사항 등)	○ 김해공유냉장고네트워크 창립에 따라 효율적인 사업 추진 가능			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

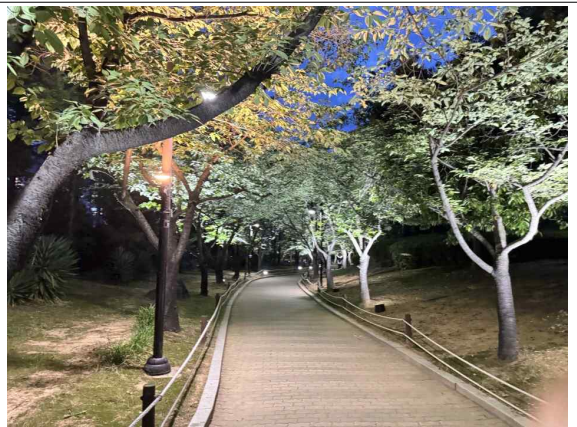
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-15	사업명	금병공원 축구장 인조잔디 정비 사업	
부서명	공원과	담당자	350-1383	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	200,000	200,000	100%	
사업개요	○ 사업위치: 금병공원(진영읍 여래리 801번지 일원) ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 6. ○ 사업내용: 금병공원 축구장 인조잔디 교체 및 시설 정비 ○ 사업량: 인조잔디 교체(3,756㎡), 비구방지망 교체, 휴게시설정비 등			
추진상황	○ '25. 2. : 주민의견 수렴 및 실시설계 착수 ○ '25. 3. : 실시설계 완료 ○ '25. 4. : 사업 착공 ○ '25. 6. : 사업 준공			
향후계획	○ 해당없음			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-16	사업명	연지공원 수목 경관등 개선사업	
부서명	공원과	담당자	350-6333	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
				○
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	200,000	200,000	100%	
사업개요	○ 사업위치: 연지공원(내동 106-1일원) ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 5. ○ 사업내용: 수목투사등 132개 및 분전함 2개소 설치, 간선공사 366m 등 ○ 사 업 량: 경관등 개선공사 1식			
추진상황	○ '25. 1. ~ 2. : 실시설계 완료 ○ '25. 3. 19. : 공사 착공 ○ '25. 6. 6. : 공사 완료			
향후계획	○ 지속적인 시설 모니터링 실시			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-17	사업명	연지공원 어린이 놀이터 정비 사업	
부서명	공원과	담당자	350-6316	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	170,000	163,000	95.8%	집행잔액
사업개요	○ 사업위치: 연지공원(내동 106-1번지 일원) ○ 사업기간: 2025. 4. ~ 6. ○ 사업내용: 어린이놀이터 탄성포장 교체 및 배수시설 개선 등 ○ 사업량: 어린이놀이터 탄성포장재 교체 700m² - 철거공 : 노후 탄성포장 외 2종 700m² 철거 - 포장공 : 바닥 기반조성(THK 100) 및 탄성포장(THK 75) 700m² - 시설물공 : 녹지경계석 90m, 조합놀이대 외 2종 철거 후 재설치 1식			
추진상황	○ '25. 1. : 현장조사 ○ '25. 2. : 주민 의견 수렴 및 실시설계 ○ '25. 3. : 공사 발주 및 착공 ○ '25. 3. 31. ~ 5. : 공사 중지 ○ '25. 5. : 공사 재개 ○ '25. 6. : 공사 준공			
향후계획	○ 해당없음			
기타 (애로사항 등)	○ 상춘객 방문 증가로 인한 공원 이용객의 안전확보를 위하여 공사 일시 중지			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-18	사업명	대창들공원 체육시설 트랙 정비	
부서명	공원과	담당자	350-1383	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	200,000	200,000	100%	
사업개요	○ 사업위치: 대창들공원(진영읍 여래리 992번지 일원) ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 6. ○ 사업내용: 대창들공원 체육시설 바닥 보수 및 시설 정비 ○ 사업량: 트랙 탄성포장, (농구,배드민턴) 코드 우레탄 포장, 경계석 정비 등			
추진상황	○ '25. 2. : 주민의견 수렴 및 실시설계 착수 ○ '25. 3. : 실시설계 완료 ○ '25. 4. : 사업 착공 ○ '25. 6. : 사업 준공			
향후계획	○ 해당없음			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-19	사업명	임호공원 산책로 설치 사업	
부서명	공원과	담당자	350-6333	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	100,000	50,000	50%	추진율 : 80%
사업개요	○ 사업위치: 임호공원(외동 269 일원) ○ 사업기간: 2025. 5. ~ 6. ○ 사업내용: 산책로(흙콘크리트포장) 정비 300m ○ 사업량: 노후 산책로 보수 1식			
추진상황	○ '25. 3. : 설계 완료 ○ '25. 5. 12. : 공사 착공			
향후계획	○ '25. 7. 6. : 공사 완료			
기타 (애로사항 등)	○ 동일 현장 내 호우피해 복구공사와 구간 중첩되어 준공기한 연기			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

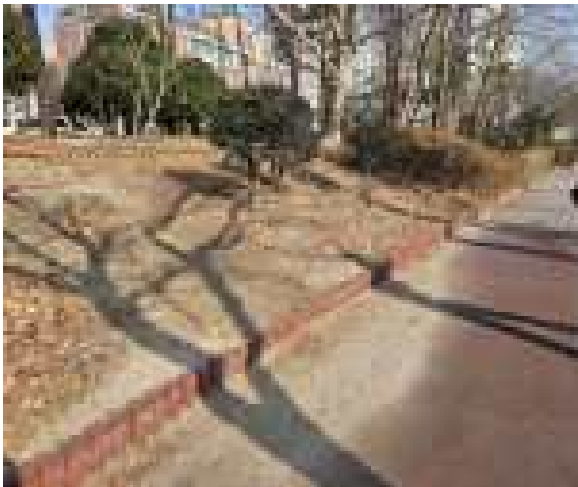
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-20	사업명	부곡녹지대 조명개선 사업	
부서명	녹지과	담당자	350-1914	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	50,000	57,807	115%	
사업개요	○ 사업위치 : 부곡동 801-1번지(월산 부영1,2단지 아파트 옆 완충녹지) ○ 사업기간 : 2025. 4~5월 ○ 사업내용 : 부곡녹지대 조명 설치 ○ 사업량 : 고보조명(H = 4.5m) 12개, 조명등 4주 설치			
추진상황	○ '25. 3. : 실시설계 완료 ○ '25. 4. : 사업 착수 ○ '25. 5. : 사업 완료			
향후계획	○ 해당없음			
기타 (애로사항 등)	○ 현장 확인 결과, 조명등 추가 설치 필요함에 따라 7,807천원 증액 후 사업완료			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

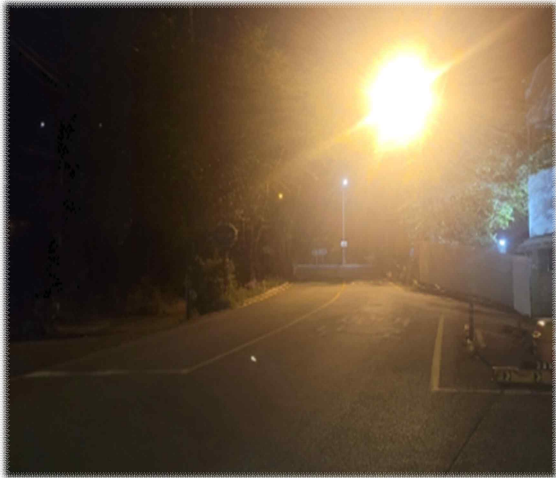
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-21	사업명	『외동 걷고싶은 거리』 산책로 조성	
부서명	녹지과	담당자	350-1983	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	150,000	132,420	88%	낙찰율, 정산 등으로 집행잔액 발생
사업개요	○ 사업위치 : 외동녹지대(외동 1269-1 외 3필지) ※ 외동 성원아파트 앞 ~ 한국1차아파트 앞 녹지대 ○ 사업기간 : 2025. 2 ~ 4월 ○ 사업내용 : 노후경계목 철거, 화단블럭 설치, 지반정리 등 ○ 사 업 량 : 노후경계목 철거 75m, 화단블럭 설치 950m, 지반정리 등			
추진상황	○ '25. 1. : 계획 수립 및 실시설계(자체) ○ '25. 3. : 사업 착공 ○ '25. 4. : 사업 완료			
향후계획	○ '25. 10. : 화단주변 초화류 식재(집행잔액 활용)			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

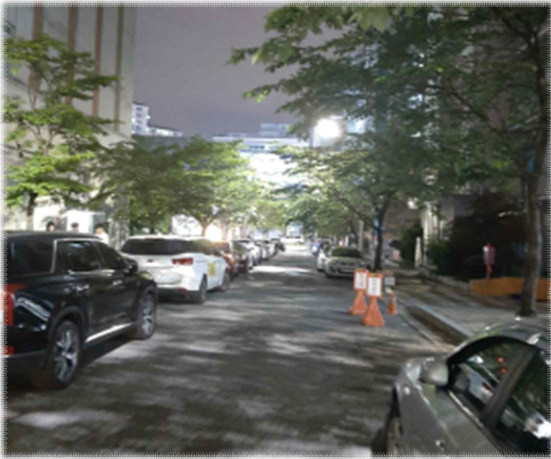
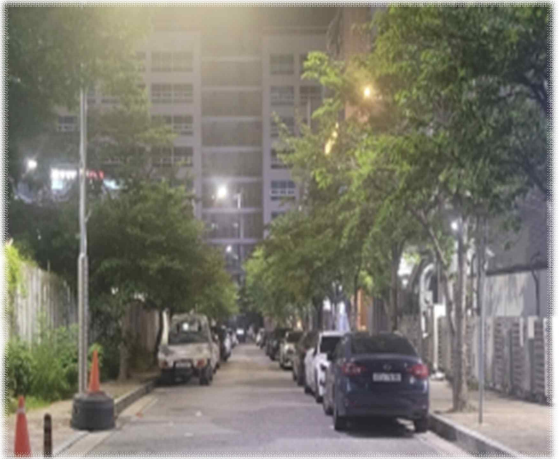
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-22	사업명	대청계곡 일원 도로조명 교체사업	
부서명	생활지원과	담당자	350-1353	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	100,000	90,901	91%	
사업개요	○ 사업위치: 대청동 776-6번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 6. ○ 사업내용: 노후 나트륨등(메탈등)을 고효율 LED로 교체 ○ 사업량: 가로등 및 보안등 140개소 ○ 사업목적: 조도개선을 통한 안전사고 예방 및 야간 경관 제고			
추진상황	○ '25. 2. : 현장조사 및 실시설계 ○ '25. 3. : 사업 시행 ○ '25. 4. ~ 7. : 사업 수행			
향후계획	○ '25. 8. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당 구간 보안등 추가 설치 민원 발생에 따라 추가사업 진행 중			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

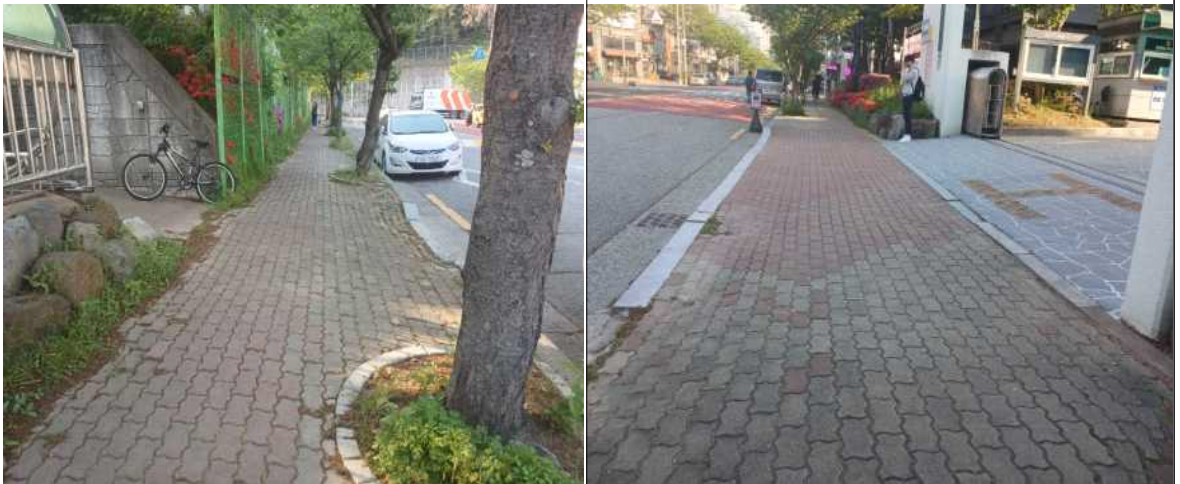
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-23	사업명	울하1지구 중심상가 도로조명 개선사업	
부서명	생활지원과	담당자	350-1353	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	85,000	63,007	74%	
사업개요	○ 사업위치: 율하동 1418번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 6. ○ 사업내용: 지주식보안등 및 가로등 부착식 보안등 추가 설치 ○ 사업량: 보안등 28개소 ○ 사업목적: 조도개선을 통한 범죄예방 환경 조성			
추진상황	○ '25. 4. : 현장조사 및 실시설계 ○ '25. 5. ~ 8. : 사업 수행			
향후계획	○ '25. 9. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당 구간 내 보행등 추가 설치 민원 발생에 따라 추가사업 진행 예정			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-24	사업명	삼문고등학교 통학로 일원 노후 보도블럭 교체사업	
부서명	도시관리과	담당자	350-1928	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	150,000	13,700	9%	통학하는 학생들의 안전을 위하여 방학 중(7~8월) 공사 예정
사업개요	○ 사업위치: 삼문동 803-1 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 3. ○ 사업내용: 노후 보도블럭 교체 ○ 사업량: 보도블럭 교체(L=500m, B=2.5~3m)			
추진상황	○ '25. 1. : 실시설계 및 계획 수립 ○ '25. 3. ~ 4. : 내역서 검토 ○ '25. 6. ~ 7. : 설계내역서 수정 중(유류단가 등 실정에 맞춰 변경)			
향후계획	○ '25. 7. : 공사 발주 ○ '25. 7. ~ 8. : 공사 착공 및 준공			
기타 (애로사항 등)	○ 학기 중 통학하는 학생들의 안전 문제로 방학기간(7~8월) 동안 공사 예정			
관련사진				
	사업 전			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-25	사업명	낙동강 술뒤편길로 오세요	
부서명	한림면	담당자	359-1055	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	80,000	76,057	95%	집행잔액
사업개요	○ 사업목적 : 이용자 안전사고 예방 및 야간 경관 개선 ○ 사업명 : 술뒤편(이북제) 자전거도로 태양광등(도로표지병) 설치사업 ○ 위치 - 1구간 : 한림면 시산리 124-2 ~ 시산리 359-1번지(2,075m) - 2구간 : 한림면 가동리 248-2 ~ 가동리 93번지(418m) ○ 사업내용 : 도로표지병(LED, 매립형) 설치(L=2,493m / 841EA)			
추진상황	○ '25. 5. 23. : 하천점용허가 ○ '25. 6. 17. : 사업시행 ○ '25. 6. 27. : 설치완료 및 준공 인가 신청			
향후계획	○ 낙동강유역환경청 준공 인가 예정			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-26	사업명	가야의 거리 분수광장 캐노피 설치사업	
부서명	회현동	담당자	359-1544	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
				○
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	100,000	9,800	9.8%	- 매장유산 유존지역으로 발굴조사 필수 - 현상태로 보존하는 것이 바람직함 - 사업비 전액 삭감 조치 예정 (2회 추가경정예산)
사업개요	○ 사업위치 : 가야의거리 분수광장 ○ 사업기간 : 2025. 2 ~ 8. ○ 사업내용 : 분수광장 내 캐노피 설치를 통해 광장 활성화와 시민 편의성 증대 ○ 사 업 량 - 캐노피 설치 1식 : 88백만원 (110㎡ × 800,000원/㎡) - 실시설계용역 1식 : 12백만원			
추진상황	○ '25. 2. ~ 3. : 공사 추진에 따른 행정절차 수행 ○ '25. 4. : 실시설계 용역 발주 ○ '25. 4. : 가설건축물 축조신고 ○ '25. 5. : 건축신고에 따른 부서별 검토 ○ '25. 5. : 문화유산과 협의결과 조건부허가 통보 ○ '25. 6. : 기성타절 정산내역 통보 및 계약해지합의서 제출 ○ '25. 6. : 계약 중도 해지			
향후계획	○ 해당없음			
기타	○ 캐노피 설치 예정 지역이 국가지정 문화유산 문화환경 보존지역 : 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제13조(역사문화환경 보존 지역의 보호) 및 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」제6조의 2(국가 등에 의한 매장유산 지표조사) 관련하여 매장문화유산을 현상태로 보존하는 것이 바람직함			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.6.30.기준)

관리번호	2024-27	사업명	장유1동 지방도1030호선 진입 안전한 계단설치	
부서명	장유1동	담당자	359-7722	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	40,000	40,000	100%	공사발주
사업개요	○ 사업위치: 무계동 109-37 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 6. ○ 사업내용 1) 데크형 계단 설치 : L=20m, H=4.0m, 안전난간 설치 : L=40m 2) 계단주변 주차금지 시설 설치 및 소규모 녹지공간 재정비 - 주차금지 시설 (화분형) : 20ea, 녹지공간 정비 : 30m² 3) 도로포장 A=180m²			
추진상황	○ '25. 1. : 계획 수립 ○ '25. 3. 14. : 주민설명회 실시 (양미화 외 10명) ○ '25. 4. 14. : 공사발주 ○ '25. 6. 10. : 계단공사완료 ○ '25. 6. 25. : 포장공사완료			
향후계획	○ 해당없음			
기타	○ 해당없음			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

[illegible]



김해시
GIMHAE

경상남도 김해시 김해대로 2401 기획조정실 예산법무과 : 055)330-6740
www.gimhae.go.kr
