

(‘25.3.기준)

2025년(‘24년 선정)
김해시 주민참여예산 제안사업
관리카드



김 해 시

김해시 주민참여예산 제안사업 관리카드 관리 목록

관리번호	부서명	사업명	사업비 (백만원)	추진상황
계		29건	2,712.03	
2023-01	도시디자인과	람사르습지를 품을 한림면	200	완료
2023-02	도시디자인과	장유1동 관문 표지판 교체	120	완료
2024-01	인구청년정책관	김해형 '로컬 브랜딩 스쿨' 사업	45.48	추진중
2024-02	인구청년정책관	청년삼야식당	34.6	추진중
2024-03	인구청년정책관	청년 금융문맹 제로 교육사업	24.96	추진중
2024-04	인구청년정책관	공공기관 취업 역량 교육 프로그램(NCS기반)	31.47	추진중
2024-05	예산법무과	주민참여예산 공모를 위한 컨설팅	12	완료
2024-06	여성가족과	아빠랑 캠핑가자~!!	25.92	추진중
2024-07	하천과	해빈천 치수벽 경관개선사업	15	완료
2024-08	건설과	상동면 대감리 347-11번지 일원 및 배수로 정비공사	150	추진중
2024-09	교통혁신과	불암동 바닥형 LED 보행신호등 설치 사업	140	추진중
2024-10	도시디자인과	온 세대가 함께 만들어가는 '마을이보이는라디오'	50	추진중
2024-11	도시디자인과	활천중학교 통학 구간 옹벽 디자인 및 보안등 설치	150	추진중
2024-12	농업정책과	청년농업인 찾아가는 심리안정 토(土)닥토(土)닥 사업	34	추진중
2024-13	농식품유통과	지역민을 위한 공유냉장고	3.6	추진중
2024-14	공원과	경운공원 리모델링 사업	50	완료
2024-15	공원과	금병공원 축구장 인조잔디 정비 사업	200	추진중
2024-16	공원과	연지공원 수목 경관등 개선사업	200	추진중
2024-17	공원과	연지공원 어린이 놀이터 정비 사업	170	추진중
2024-18	공원과	대창들공원 체육시설 트랙 정비	200	추진중
2024-19	공원과	임호공원 산책로 설치 사업	100	추진중
2024-20	녹지과	부곡동 만발산책로 및 안전한 공원 조성사업	50	추진중
2024-21	녹지과	『외동 걷고싶은 거리』 산책로 조성	150	추진중
2024-22	생활자원과	대청계곡 일대 가로등 교체	100	추진중
2024-23	생활자원과	청소년 범죄예방 환경조성을 위한 가로등 밝기 개선	85	추진중
2024-24	도시관리과	삼문고등학교 통학로 일원 노후 보도블럭 교체사업	150	추진중
2024-25	한림면	낙동강 솔뫼둑방길로 오세요	80	추진중
2024-26	호현동	가야의 거리 분수광장 캐노피 및 무대 설치사업	100	추진중
2024-27	장유1동	장유1동 지방도1030호선 진입 안전한 계단설치	40	추진중

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2023-01	사업명	람사르습지를 품을 한림면!	
부서명	도시디자인과	담당자	330-3634	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
				○
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	200,000	200,000	100%	-
사업개요	○ 사업위치: 한림면 장방리 196-4번지 일원 외 1개소 ○ 사업기간: 2024. 2. ~ 2025. 3. ○ 사업내용: 황새 및 딸기 조형물 설치(2개소)			
추진상황	○ '24. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○ '24. 6. : 기본 및 실시설계용역 완료 ○ '24. 7. : 조형물 제작·설치 착수 ○ '24. 8. : 전기공사 착수 ○ '25. 3. : 조형물 제작·설치 및 전기공사 완료			
향후계획	○ 조형물 유지보수			
기타 (애로사항 등)				
관련사진				
				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2023-02	사업명	장유1동 관문 표지판 교체	
부서명	도시디자인과	담당자	330-3634	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	120,000	111,531	93%	집행잔액
사업개요	○ 사업위치: 무계동 166번지 일원 ○ 사업기간: 2024. 2. ~ 2025. 3. ○ 사업내용: 노후 조형물 정비 1식			
추진상황	○ '24. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○ '24. 9. : 기본 및 실시설계용역 완료 ○ '24. 12. : 공사 착공 ○ '25. 3. : 공사 준공			
향후계획	○ 조형물 유지보수			
기타 (애로사항 등)				
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-01	사업명	김해형 '로컬 브랜딩 스쿨' 사업	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	45,480	1,400	3%	완료기한 미도래 (계약완료, 진행 중)
사업개요	○ 사업위치 : 청년어울림센터 Station-G 삼방(김해시 삼안로291번길 47-15) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : 지역 특성을 반영한 창업 아이템 발굴 및 구체화 지원 ○ 사 업 량 : 창업 준비 청년 30명(상·하반기 각 15명 모집 운영)			
추진상황	○ '25. 2. : 사업계획 수립 및 계약체결 ○ '25. 2. ~ 3. : 대상자 모집(상반기) ○ '25. 3. 15. ~ 3. 29. : 로컬 브랜딩 실무 과정 3회차 운영			
향후계획	○ '25. 4. ~ 5. : 로컬 브랜딩 스쿨 운영(상반기) ○ '25. 6. : 로컬 브랜드 발표회(상반기) ○ '25. 7. ~ 8. : 대상자 모집(하반기) ○ '25. 9. ~ 11. : 로컬 브랜딩 스쿨 운영(하반기) ○ '25. 12. : 로컬 브랜드 발표회(하반기) 및 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진 (3월)				
	사업 후			

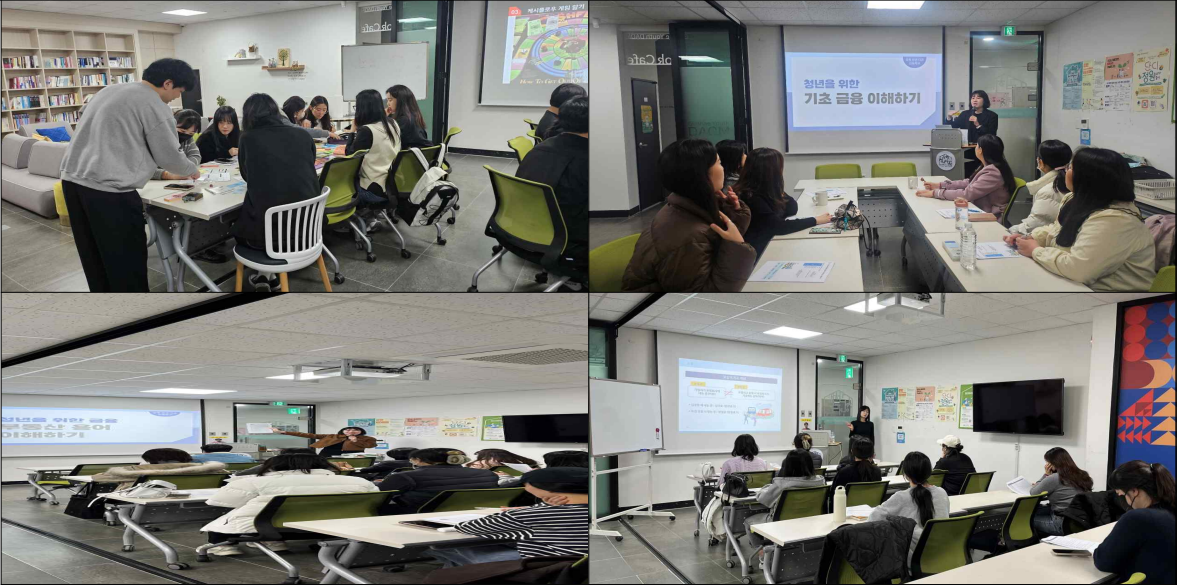
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-02	사업명	청년심야식당	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	34,600	0	0%	완료기한 미도래 (계약완료, 진행 중)
사업개요	○ 사업위치: 김해청년다움(김해시 분성로 365) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : 한끼 식사 공유를 통한 청년 교류 및 네트워킹 ○ 사업량 : 요리 수업을 동반한 인적 교류 희망 청년 400명			
추진상황	○ '25. 2. : 사업계획 수립 및 계약체결 ○ '25. 2. ~ 11. : 대상자 모집(상시) ○ '25. 2. 25. ~ 3. 28. : 청년심야식당 10회 운영(궁중 떡볶이, 구절판 등)			
향후계획	○ '25. 4 ~ 11. : 심야식당 계속 운영 ○ '25. 12. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진 (3월)				
	사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

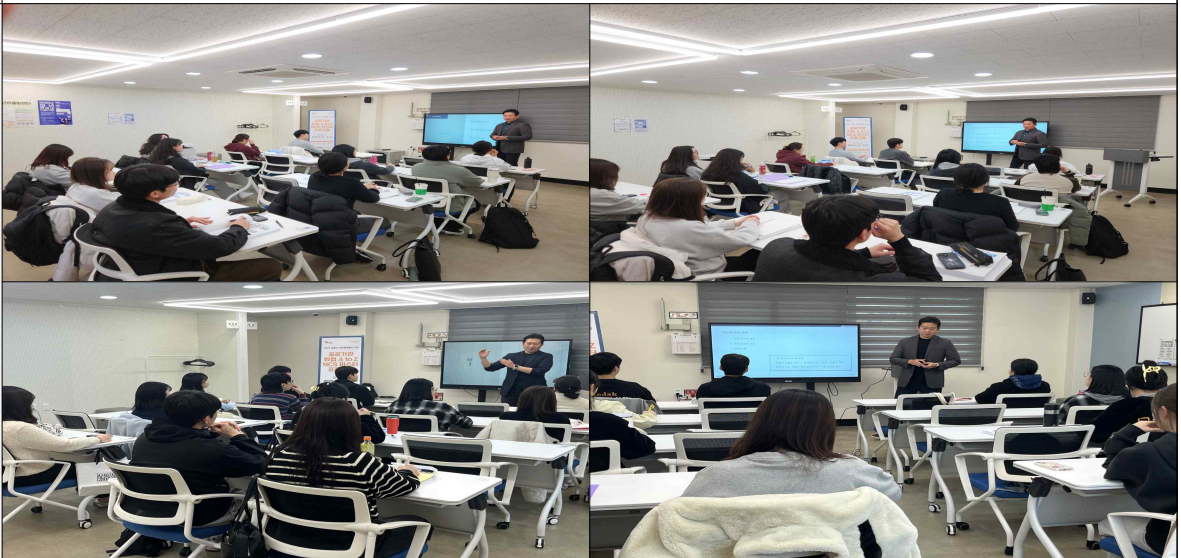
(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-03	사업명	청년 금융문맹 제로 교육사업	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	24,960	2,090	8.4%	완료기한 미도래 (진행 중)
사업개요	○ 사업위치: 김해청년다움(김해시 분성로 365) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : 금융 상품과 시장 구조 이해 등 금융 관련 교육 ○ 사업량 : 회계, 세무, 자산관리 등 금융관리에 관심 있는 청년 500명			
추진상황	○ '25. 2. : 사업계획 수립 ○ '25. 2. ~ 11. : 대상자 모집(상시) ○ '25. 3. 6. ~ 3. 31. : 청년금융학교 9회 운영			
향후계획	○ '25. 4. ~ 12. : 금융학교 계속 운영 ○ '25. 12. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진 (3월)				

사업 후

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-04	사업명	공공기관 취업 역량 교육 프로그램(NCS기반)	
부서명	인구청년정책관	담당자	330-2904	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	31,470	2,370	7.5%	완료기한 미도래 (진행 중)
사업개요	○ 사업위치 : 청년어울림센터 Station-G 삼방(김해시 삼안로291번길 47-15) ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 12. ○ 사업내용 : NCS 교육반 운영, 공기업 취업 멘토링 콘서트 등 ○ 사 업 량 : 공공기관 취업 희망 청년 60명(상·하반기 각 30명 모집 운영)			
추진상황	○ '25. 1. : 사업계획 수립 ○ '25. 2. : 대상자 모집(상반기) ○ '25. 3. 15. ~ 29. : NCS 교육반 3회차 운영			
향후계획	○ '25. 4. ~ 5. : NCS 교육반 운영(상반기) ○ '25. 6. : 대상자 모집(하반기) ○ '25. 7. ~ 9. : NCS 교육반 운영(하반기) ○ '25. 10. : 취업 멘토링 콘서트 ○ '25. 11. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 해당없음			
관련사진 (3월)				
	사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-05	사업명	주민참여예산사업 공모를 위한 컨설팅	
부서명	예산법무과	담당자	330-6740	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	12,000	1,027	9%	강사수당 컨설팅 종료 후 일괄 지급
사업개요	○ 사업위치: 김해시 관내 5개 권역 ○ 사업기간: 2025. 3. ~ 4. ○ 사업내용 - 권역별 주민을 대상으로 찾아가는 컨설팅 실시 - 홍보물품 배부			
추진상황	○ '25. 3. : 계획 수립 ○ '25. 3. : 컨설팅 실시(대동면) ○ '25. 3. : 컨설팅 실시(진례면) ○ '25. 3. : 컨설팅 실시(원도심·동상·회현·부원) ○ '25. 3. : 컨설팅 실시(주촌면)			
향후계획	○ '25. 4. : 컨설팅 실시(생림면) ○ '25. 4. : 컨설팅 결과보고 및 제안사업 접수			
기타 (애로사항 등)	○ 4월 컨설팅 종료			
관련사진				
	사업 후			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-06	사업명	아빠랑 캠핑가자~!	
부서명	여성가족과	담당자	330-3314	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	25,920	25,920	100%	
사업개요	○ 사업위치: 가야테마파크 카라반 캠핑장(김해시 가야테마길 161) ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 11. ○ 사업내용: 아빠와 자녀가 체험활동 및 자연 속 캠핑을 하며 엄마의 온전한 쉼을 위한 프로그램 운영 ○ 사업량: 60팀(120명)			
추진상황	○ '25. 2. : 상반기 계획 수립 ○ '25. 2. : 참여 가족 모집 ○ '25. 3. : 상반기 『아빠랑 캠핑가자』 사업수행 및 만족도 조사			
향후계획	○ '25. 7. : 하반기 계획 수립 ○ '25. 8. : 참여 가족 모집 ○ '25. 9. : 하반기 『아빠랑 캠핑가자』 사업수행 및 만족도 조사 ○ '25. 11. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)				
관련사진				
	단체사진(상반기)			
			활동사진(상반기)	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-07	사업명	해반천 차수벽 경관개선사업	
부서명	하천과	담당자	330-3816	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	15,000	13,160	88%	낙찰률 및 정산으로 인한 집행 잔액
사업개요	○ 사업위치: 봉황동 886번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 02. ~ 04. ○ 사업비: 15백만원 ○ 사업내용: 노후하여 이끼가 끼고 균열이 생긴 차수벽을 정비하고 벽화 도장을 하여 도시 경관 개선 ○ 사업량: 차수벽 옹벽부 정비 및 벽화 도장 (L=350m, H=0.5m)			
추진상황	○ '25. 1. : 제안자의견 최종 수렴 ○ '25. 2. : 사업 설계 및 도안 채택 ○ '25. 3. : 사업 준공 ○ '25. 4. : 주민참여예산 안내 표지판 설치 완료			
향후계획				
기타 (애로사항 등)	○			
관련사진				
	사업 완료 사진		안내 표지판 설치 완료 사진	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-08	사업명	상동면 대감리 347-11번지 일원 및 배수로 설치공사	
부서명	건설과	담당자	330-0877	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	150,000	-	0%	준공기한 미도래
사업개요	○ 사업위치 : 상동면 대감리 347-11번지 일원 배수로 정비공사 ○ 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 5. ○ 사업내용 : 농경지 침수 예방을 위한 배수로 정비 ○ 사업량 : U형개거 설치(2.5×1.5) L=156.4m			
추진상황	○ '25. 1. : 실시설계 완료 ○ '25. 3. : 공사착공			
향후계획	○ '25. 5. : 공사준공 예정			
기타 (애로사항 등)	○ 없음			
관련사진				
	사업 전		사업 중	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-09	사업명	불암동 바닥형 LED 보행신호등 설치 사업	
부서명	교통혁신과	담당자	330-3553	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	140,000	-	0%	6월 집행완료
사업개요	○ 사업위치 - 불암동 지내삼거리, 지내동원아파트사거리, 양장골삼거리, 활천초(지내동 297-5) ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 6. ○ 사업내용: 보행자 통행량이 많고, 사고 위험이 높은 교차로에 바닥형 LED 보행신호등을 설치하여 보행자의 안전한 통행 여건 확보 및 횡단보도 교통사고 예방 ○ 사업량: 바닥형 LED 보행신호등 횡단보도 9개			
추진상황	○ '25. 1. ~ 2. : 김해중부경찰서 협의 및 현장 실사 ○ '25. 3. : 구매설치 발주(2개소) ※ 불암동 지내삼거리, 지내동원아파트사거리 ○ '25. 4. : 공사 착수 및 준공			
향후계획	○ '25. 5. : 구매설치 발주(2개소) ※ 양장골삼거리, 활천초 ○ '25. 5. ~ 6. : 공사 착수 및 준공			
기타 (애로사항 등)	○ 사업대상지 3개소 설치 후 집행잔액(15백만원정도)을 활용하여 활천초 어린이보호구역 횡단보도 단일로 추가 설치 ○ 신청인과 협의완료			
관련사진				
	사업 전(불암동 지내삼거리)			사업 후(불암동 지내삼거리)

관련사진		
	사업 전(지내동원아파트사거리)	사업 후(지내동원아파트사거리)
		
	사업 전(양장골삼거리)	사업 후(양장골삼거리)
		
	사업 전(활천초등학교)	사업 후(활천초등학교)

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-10	사업명	온 세대가 함께 만들어가는 '마을이보이는라디오'	
부서명	도시디자인과	담당자	330-3633	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	50,000		0%	운영주체와 방송국 배치 협의에 따른 지연
사업개요	○ 사 업 명: 무계마을 시민방송국 시설개선사업 ○ 사업위치: 무계동 304-6번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 7. ○ 사업내용: 방송실 간이벽 설치, 방음시설 설치 등 ○ 사 업 량: 방송국 리모델링 1식(연면적 A=41m ²)			
추진상황	○ '25. 2. : 실시설계용역 착수 ○ '25. 3. : 리모델링 방향 협의			
향후계획	○ '25. 4. : 설계용역 추진 ○ '25. 5. : 설계용역 완료 ○ '25. 6. : 공사 착공 ○ '25. 7. : 공사 준공			
기타 (애로사항 등)	○			
관련사진				
	사업 전			사업 후

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-11	사업명	활천중학교 통학 구간 옹벽 디자인 및 보안등 설치	
부서명	도시디자인과	담당자	330-3633	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	150,000	-	-	
사업개요	○ 사 업 명: 활천중학교 주변 디자인옹벽 설치공사 ○ 사업위치: 지내동 377-6번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 7. ○ 사업내용: 벽화설치, 타일 및 벽면 사인물 설치 등 ○ 사 업 량: 옹벽 시설개선 1식(L-120m, H=0.5~5.0m).			
추진상황	○ '25. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○ '25. 2. : 벽화 디자인 주민협의 ○ '25. 3. : 설계용역 추진			
향후계획	○ '25. 4. : 경관위원회 자문 ○ '25. 5. : 자문결과 주민설명 및 최종안 결정 ○ '25. 5. : 입찰의뢰 및 공사 착공 ○ '25. 7. : 공사 준공			
기타 (애로사항 등)	○			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-12	사업명	청년농업인 찾아가는 심리안정 토닥토닥 사업	
부서명	농업정책과	담당자	350-4053	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	34,000	0	0%	
사업개요	○ 사업대상 : 관내 청년농업인 ○ 사업량 : 2개 사업(토닥토닥 힐링캠프, 심리상담 프로그램 운영) ○ 사업기간 : '25. 2. ~ 12. ○ 사업내용 - 청년농업인 토닥토닥 힐링캠프 운영 · 사업량 : 60여명 · 사업비 : 30,000천원(60명×500천원) · 사업내용 : 청년농업인 친목도모 및 교류 확대를 위한 선진농업 견학, 치유농업, 팜파티 등 힐링캠프 추진 - 청년농업인 토닥토닥 심리상담 프로그램 운영 지원 · 사업량 : 그룹별(15 ~ 20명)/8회 · 사업비 : 4,000천원 · 사업내용 : 심리적인 도움이 필요한 청년농을 위해 집단별 맞춤형 심리평가, 상담, 치료 및 교육 프로그램 운영			
추진상황	○ '25. 2. : 사업 프로그램 업무 협의(김해시정신건강복지센터) ○ '25. 3. : 김해시청년후계농업인회 간담회 개최			
향후계획	○ '25. 4. : 구글폼을 이용한 자가진단 리스트 작성 ○ '25. 5. : 상담 서비스 위한 자가진단 조사 실시 ○ '25. 6. ~ 9. : 심리상담 교육 프로그램 운영 ○ '25. 10. : 청년농 토닥토닥 힐링캠프 추진 ○ '25. 12. : 사업완료 및 정산			
기타 (애로사항 등)	○			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-13	사업명	지역민을 위한 공유냉장고	
부서명	농식품유통과	담당자	350-4112	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	3,600	0	0%	
사업개요	○ 사업위치: 김해시 일원 ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. ○ 사업내용: 누구나 음식을 냉장고에 넣어 놓고 누구나 음식을 가져갈 수 있는 공유 냉장고 설치 ○ 사업량: 2개소(당초 3개소에서 1개소 축소) - 공유냉장고 구입 및 보호케이스 설치비 상승으로 사업량 축소 (냉장고: 50만원, 보호케이스: 100만원+추가 홍보물 10만)			
추진상황	○ '24. 12. : 김해공유냉장고네트워크 추진위원회 구성(16개 단체) ○ '25. 3. : 김해공유냉장고네트워크 추진위원회 제4차 회의(정관안 마련)			
향후계획	○ '25. 6. : 김해공유냉장고네트워크 창립총회 및 운영위원회 구성 ○ '25. 6. ~ 12. : 공유냉장고 운영자 모집 및 개소			
기타 (애로사항 등)	○			
관련사진				
	사업 전			사업 후

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-14	사업명	경운공원 리모델링 사업	
부서명	공원과	담당자	350-6333	
추진상황	추진예정		추진중	
			추진완료	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	50,000	50,000	100%	
사업개요	○ 사업위치: 경운공원(외동 707일원) ○ 사업기간: 2025. 3. 17. ~ 4. 13. ○ 사업내용: 야외운동기구 교체, 보행로 포장보수 15m², 기념비 설치, 퍼걸러 지붕 보수 등 ○ 사업량: 공원 시설개선 1식			
추진상황	○ '25. 2. : 설계완료 ○ '25. 3. ~ 4. : 사업 수행			
향후계획	○ '25. 5. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 사업계획에 포함된 '류진옥 애국지사 기념시비' 설치에 대한 지역주민의 공감감이 부족하여 민원이 많은 실정임.			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-15	사업명	금병공원 축구장 인조잔디 정비 사업	
부서명	공원과	담당자	350-6383	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	200,000	18,670	9%	실시설계 등 기간소요 6월 사업준공 예정
사업개요	○ 사업위치: 금병공원(진영읍 여래리 801번지 일원) ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 6. ○ 사업내용: 금병공원 축구장 인조잔디 교체 및 시설 정비 ○ 사업량: 인조잔디 교체(3,756㎡), 배수시설 정비 및 폐기물 처리			
추진상황	○ '25. 2. : 주민의견 수렴 및 실시설계 착수 ○ '25. 3. : 실시설계 완료			
향후계획	○ '25. 4. : 사업 착공 ○ '25. 6. : 사업 준공			
기타 (애로사항 등)	○			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-16	사업명	연지공원 수목 경관등 개선사업	
부서명	공원과	담당자	350-6333	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	200,000	30,000	15%	정상 추진 중
사업개요	○ 사업위치: 연지공원(내동 106-1일원) ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 5. ○ 사업내용: 수목투사등 120개 및 분전함 2개소 설치, 간선공사 366m 등 ○ 사 업 량: 경관등 개선공사 1식			
추진상황	○ '25. 1. ~ 2. : 실시설계 완료 ○ '25. 3. 19. : 공사 착공			
향후계획	○ '25. 5. 27. : 공사 완료			
기타 (애로사항 등)	○ 없음			
관련사진			추진 중	
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-17	사업명	연지공원 어린이 놀이터 정비 사업	
부서명	공원과	담당자	350-6316	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	170,000		0%	6월 사업준공 예정
사업개요	○ 사업위치: 연지공원(내동 106-1번지 일원) ○ 사업기간: 2025. 4. ~ 6. ○ 사업내용: 어린이놀이터 탄성포장 교체 및 배수시설 개선 등 ○ 사업량: 어린이놀이터 탄성포장재 교체 700m ² - 철거공 : 노후 탄성포장 외 2종 700m ² 철거 - 포장공 : 바닥 기반조성(THK 100) 및 탄성포장(THK 75) 700m ² - 시설물공 : 녹지경계석 90m, 조합놀이대 외 2종 철거 후 재설치 1식			
추진상황	○ '25. 1. : 현장조사 ○ '25. 2. : 주민 의견 수렴 및 실시설계 ○ '25. 3. : 공사 발주 및 착공 ○ '25. 3. 31. ~ 5. : 공사 중지			
향후계획	○ '25. 5. : 공사 재개 ○ '25. 6. : 공사 준공			
기타 (애로사항 등)	○ 상춘객 방문 증가로 인한 공원 이용객의 안전확보를 위하여 공사 일시 중지			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-18	사업명	대창들공원 체육시설 트랙 정비	
부서명	공원과	담당자	350-6383	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	200,000	0	0%	실시설계 등 기간소요 6월 사업준공 예정
사업개요	○ 사업위치: 대창들공원(진영읍 여래리 992번지 일원) ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 6. ○ 사업내용: 대창들공원 체육시설 바닥 보수 및 시설 정비 ○ 사 업 량: 트랙 재포장, (농구,배드민턴) 코드 우레탄 포장, 경계석 정비 등			
추진상황	○ '25. 2. : 주민의견 수렴 및 실시설계 착수 ○ '25. 3. : 실시설계 완료			
향후계획	○ '25. 4. : 사업 착공 ○ '25. 6. : 사업 준공			
기타 (애로사항 등)	○			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

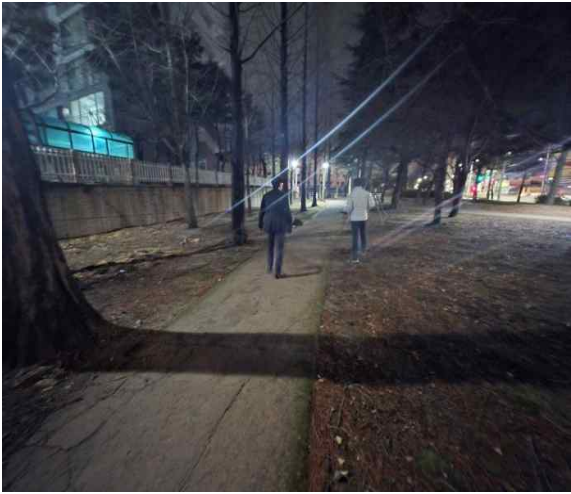
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-19	사업명	임호공원 산책로 설치 사업	
부서명	공원과	담당자	350-6333	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	100,000	0	0%	
사업개요	○ 사업위치: 임호공원(외동 269 일원) ○ 사업기간: 2025. 5. ~ 6. ○ 사업내용: 산책로(흙콘크리트포장) 정비 300m ○ 사 업 량: 노후 산책로 보수 1식			
추진상황	○ '25. 3. : 설계 완료			
향후계획	○ '25. 5. : 공사 착공 ○ '25. 6. : 공사 완료			
기타 (애로사항 등)	○ 동일 현장 내 호우피해 복구공사와 구간 중첩되어 착공 지연 중 ※'25. 5. 12 착공 예정			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-20	사업명	부곡녹지대 조명개선 사업	
부서명	녹지과	담당자	350-1914	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	50,000	3,000	6%	
사업개요	○ 사업위치: 부곡동 801-1번지(월산 부영1,2단지 아파트 옆 완충녹지) ○ 사업기간 : 2025. 4~5월 ○ 사업내용 : 부곡녹지대 조명 설치 ○ 사 업 량 : 고보조명(H = 4.5m) 12개, 조명등 4주 설치			
추진상황	○ '25. 3. : 실시설계 완료			
향후계획	○ '25. 4. : 사업 착수 ○ '25. 5. : 사업 완료			
기타 (애로사항 등)	○ 현장 확인 결과, 조명등 추가 설치 필요함에 따라 8,000천원 증 발주			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

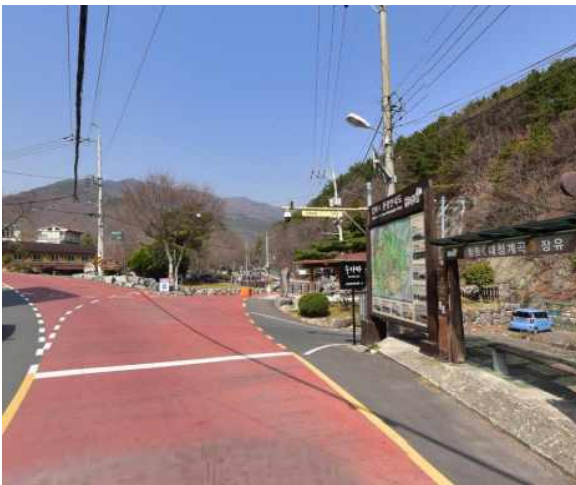
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-21	사업명	『외동 걷고싶은 거리』 산책로 조성	
부서명	녹지과	담당자	350-1983	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	150,000	31,900	22%	'25. 3. : 선금급 지급 '25. 4. : 준공금 집행 예정
사업개요	○ 사업위치 : 외동녹지대(외동 1269-1 외 3필지) ※ 외동 성원아파트 앞 ~ 한국1차아파트 앞 녹지대 ○ 사업기간 : 2025. 2 ~ 4월 ○ 사업내용 : 노후경계목 철거, 화단블럭 설치, 지반정리 등 ○ 사 업 량 : 노후경계목 철거 75m, 화단블럭 설치 950m, 지반정리 등			
추진상황	○ '25. 1. : 계획 수립 및 실시설계(자체) ○ '25. 3. : 사업 착공			
향후계획	○ '25. 4. : 사업 준공 ○ '25. 10. : 화단주변 초화류 식재(집행잔액 활용)			
기타 (애로사항 등)	○ 없음			
관련사진				
	사업 전		사업 중	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-22	사업명	대청계곡 일원 도로조명 교체사업	
부서명	생활지원과	담당자	350-1353	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	100,000	35,694	35.7%	
사업개요	○ 사업위치: 대청동 776-6번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 6. ○ 사업내용: 노후 나트륨등(메탈등)을 고효율 LED로 교체 ○ 사업량: 가로등 및 보안등 140개소 ○ 사업목적: 조도개선을 통한 안전사고 예방 및 야간 경관 제고			
추진상황	○ '25. 2. : 현장조사 및 실시설계 ○ '25. 3. : 사업 시행			
향후계획	○ '25. 4. ~ 6. : 사업 수행 ○ '25. 7. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

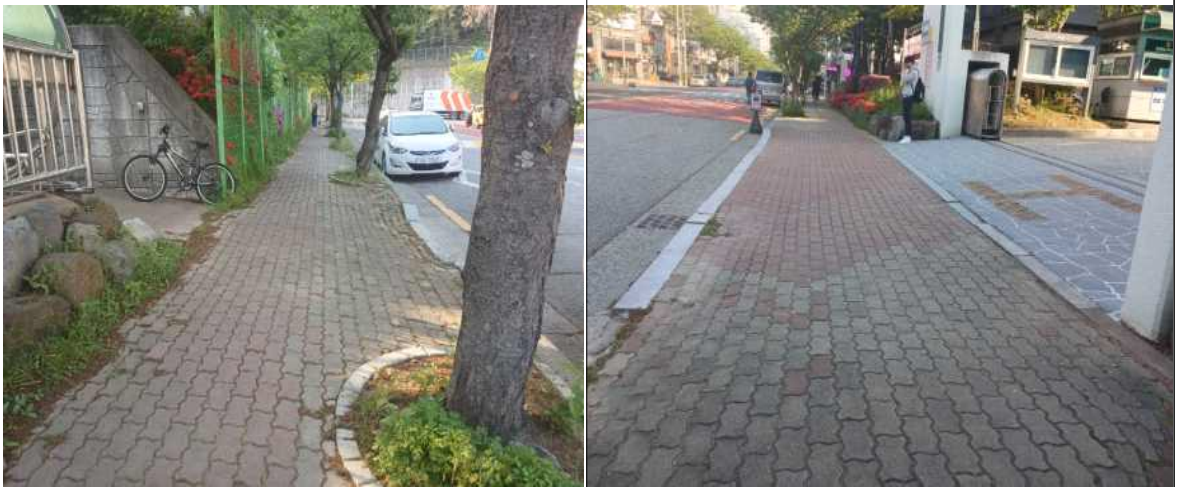
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-23	사업명	울하지구 중심상가 도로조명 개선사업	
부서명	생활지원과	담당자	350-1353	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	85,000	0000	0%	- 5월 발주 예정
사업개요	○ 사업위치: 율하동 1418번지 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 6. ○ 사업내용: 지주식보안등 및 가로등 부착식 보안등 추가 설치 ○ 사업량: 보안등 28개소 ○ 사업목적: 조도개선을 통한 범죄예방 환경 조성			
추진상황				
향후계획	○ '25. 4. : 현장조사 및 실시설계 ○ '25. 5. ~ 6. : 사업 수행 ○ '25. 7. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○			
관련사진				
	사업 전		사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-24	사업명	삼문고등학교 통학로 일원 노후 보도블럭 교체사업	
부서명	도시관리과	담당자	350-1928	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	150,000	13,700	9%	통학하는 학생들의 안전을 위하여 방학 중(7~8월) 공사 예정
사업개요	○ 사업위치: 삼문동 803-1 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 3. ○ 사업내용: 노후 보도블럭 교체 ○ 사업량: 보도블럭 교체(L=500m, B=2.5~3m)			
추진상황	○ '25. 1. : 실시설계 및 계획 수립 ○ '25. 3. ~ 4. : 내역서 검토			
향후계획	○ '25. 5. : 사업 발주 ○ '25. 7. ~ 8. : 공사 착공 및 준공			
기타 (애로사항 등)	○ 학기 중 통학하는 학생들의 안전 문제로 방학기간(7~8월) 동안 공사 예정			
관련사진				
	사업 전			

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-25	사업명	낙동강 술뒤희방길로 오세요	
부서명	한림면	담당자	359-1055	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	80,000	0	0%	낙동강유역환경청에 하천점용허가 절차 진행중
사업개요	○ 사업목적 : 이용자 안전사고 예방 및 야간 경관 개선 ○ 사업명 : 술뒤희(이북제) 자전거도로 태양광등(도로표지병) 설치사업 ○ 위치 - 1구간 : 한림면 시산리 124-2 ~ 시산리 359-1번지(2,075m) - 2구간 : 한림면 가동리 248-2 ~ 가동리 93번지(418m) ○ 사업내용 : 도로표지병(LED, 매립형) 설치(L=2,493m / 841EA)			
추진상황				
향후계획	○ '25. 4. 3. : 하천점용허가신청 ○ '25. 5. 9. : 업체선정 및 사업시행 ○ '25. 5. 31.한 : 사업완료			
기타 (애로사항 등)	○ 없음			
관련사진				
	사업 전			사업 후

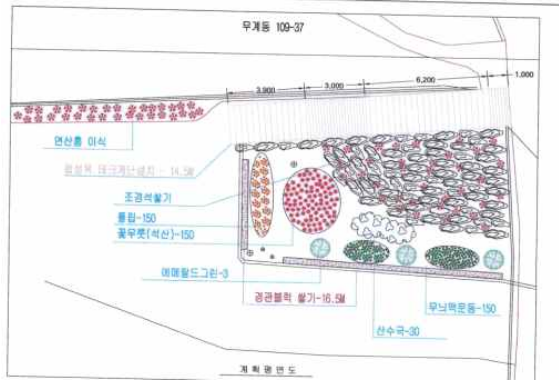
주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-26	사업명	가야의 거리 분수광장 캐노피 설치사업	
부서명	회현동	담당자	359-1544	
추진상황	추진예정		추진중	추진완료
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	100,000		0%	행정절차 수행에 따른 지연 - 가설건축물협의(허가) - 역사문화환경 보존지역 관련 협의
사업개요	○ 사업위치 : 가야의거리 분수광장 ○ 사업기간 : 2025. 2 ~ 8. ○ 사업내용 : 분수광장 내 캐노피 설치를 통해 광장 활성화와 시민 편의성 증대 ○ 사업량 - 캐노피 설치 1식 : 88백만원 (110m ² × 800,000원/m ²) - 실시설계용역 1식 : 12백만원			
추진상황	○ '25. 2. ~ 3. : 공사 추진에 따른 행정절차 수행			
향후계획	○ '25. 4. : 실시설계 용역 발주 ○ '25. 5. : 가설건축물협의(허가) 완료 ○ '25. 5. ~ 6. : 경남도 및 국가유산청 협의(예정) ○ '25. 6. : 실시설계 용역 완료 ○ '25. 7. : 캐노피 설치 공사 발주 ○ '25. 7 ~ 8. : 공사 추진 및 완공			
기타 (애로사항 등)	○ 캐노피 설치 예정 지역이 국가지정 문화유산 문화환경 보존지역 : 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제13조(역사문화환경 보존지역의 보호) 및 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」제6조의 2(국가 등에 의한 매장유산 지표조사) 관련하여 문화유산과 협의 중			
관련사진				
			사업 전 사업 후	

주민참여예산 사업 관리카드

(2025.3.31.기준)

관리번호	2024-27	사업명	장유1동 지방도1030호선 진입 안전한 계단설치	
부서명	장유1동	담당자	359-7722	
추진상황	추진예정		추진중	
			○	
집행현황 (단위: 천원)	예산액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
	40,000	0	0%	공사발주
사업개요	○ 사업위치: 무계동 109-37 일원 ○ 사업기간: 2025. 2. ~ 6. ○ 사업내용 1) 데크형 계단 설치 : L=20m, H=4.0m 2) 안전난간 설치 : L=40m 3) 계단주변 주차금지 시설 설치 및 소규모 녹지공간 재정비 - 주차금지 시설 (화분형) : 20ea, 녹지공간 정비 : 30m²			
추진상황	○ '25. 1. : 계획 수립 ○ '25. 3. 14. : 주민설명회 실시 (양미화 외 10명)			
향후계획	○ '25. 4. 13. : 실시설계 ○ '25. 4. 14. : 공사발주 ○ '25. 4. 30~ 6. 10. : 사업 수행 ○ '25. 7. 30. : 결과 보고			
기타 (애로사항 등)	○ 관급자재 수급 지연			
관련사진				
	사업 전		사업 후 (예정)	

[illegible]

[illegible]



김해시
GIMHAE

경상남도 김해시 김해대로 2401 기획조정실 예산법무과 : 055)330-6740
www.gimhae.go.kr
