

2026년 주민참여예산 제안사업 관리카드

구분	관리 번호	부서명	사업명	P.
부산시	1	도시안전과	방범용 CCTV 구축	2
	2	행정지원과	화사한 마을 만들기 「영도11동」	5
	3	행정지원과	찾아가는 무료급식 「어영차! 영도」 * 이월사업	7
	4	교 통 과	버스승객대기시설 냉·온열의자 설치	9
영도구	1	행정지원과	청학배수지 전망대 일원 데크계단 정비	11
	2	경제산업과	하늘소공원 가드닝 사업	13
	3	교 통 과	버스정류장 버스정보안내기 설치	15
	4	영 선 2 동	흰여울문화마을 공공시설 활용 공중화장실 증설	17
	5	영 선 2 동	절영해안마을 안전 및 환경개선사업	19
	6	남 향 동	[동지역사업] 안전하고 쾌적한 남향마을 조성을 위한 공폐가 문막음 사업	22
	7	봉 래 1 동	[동지역사업] 횡단보도 교통약자를 위한 의자 설치	24
	8	봉 래 2 동	[동지역사업] 봉산마을 다목적 LED 바닥조명(로고젝터) 설치	27
	9	청 학 2 동	[동지역사업] 노후주택 환경개선 「희망家득 집수리」	29
	10	청 학 2 동	[동지역사업] 우리동네 길키퍼	32
	11	동 삼 2 동	[동지역사업] 쓰레기 무단투기 등 로고젝터 설치	35

[市 시정참여형-1] 방법용 CCTV 구축

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 3. 16. ~ 2026. 5. 29.
- ☐ 사업장소 : 청학모자원 앞 등 3개소
- ☐ 사 업 비 : 54,375천원(시재배정)
- ☐ 사업내용
 - 1차 : 신규 CCTV 카메라 구매·설치(3개소 9대) 및 자가통신망 구축
 - 2차 : 노후 방법용 CCTV 카메라 교체(12개소 13대)

II 사업 추진현황

※ 추진완료

- ☐ 추진실적
 - 2026. 3월 : 1차 신규 설치지 행정예고 및 공사 착공
 - 2026. 4월 : 1차 준공 및 CCTV 통합관제센터 연계
 - 2026. 4월 : 2차 노후 방법용 CCTV 카메라 교체 계획 수립
 - 2026. 5월 : 2차 노후 방법용 CCTV 카메라 교체 완료
- ☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항
 - 해당사항 없음

Ⅲ 사업집행현황

☐ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
방범용 CCTV 구축 (401-01 시설비)	54,375,000	52,811,440	97.12%	1,563,560	


☐ 세부 집행내역

(단위 : 원)


사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금액	세부내역	
방범용 CCTV 구축	401-01 시설비	30,000,000	28,622,600	• 도급공사 = 15,957,000 • 관급자재 = 11,992,400 • 전기시설부담금 = 673,200	1,377,400
		24,375,000	24,188,840	• CCTV 카메라 교체 = 23,988,840 • 산업안전보건관리비 = 200,000	186,160

☐ 현황사진

1. 청학모자원 앞(함지로79번길 65-16)

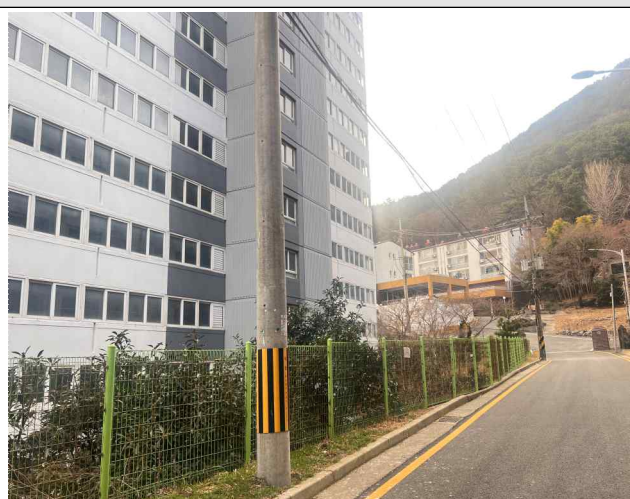

사업 전

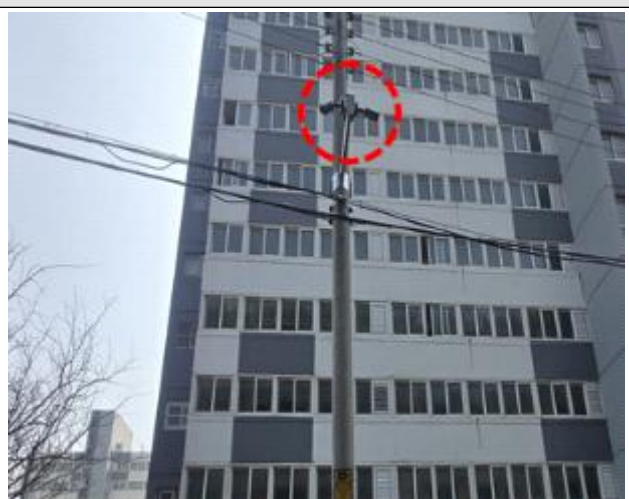

사업 후

2. 창조하우스 앞(중리북로 28)



사업 전



사업 후

3. 동아아파트 앞(해오름1길 7)



사업 전



사업 후

[市 지역협치형-2] 화사한 마을 만들기 「영도11홍」

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- ☐ 사업장소 : 영도구 관내
- ☐ 사 업 비 : 85,000천원(시비)
- ☐ 사업내용
 - 백일홍 화단 조성, 화단 관리 및 안내판 부착
 - 안전한 골목 만들기
 - 자원봉사자 확대 모집 : 무료급식사업 홍보 지원

II 사업 추진현황

※ 추진중

- ☐ 추진실적
 - 2026. 2월 : 운영계획 검토 및 수립
 - 2026. 3월 : 수요조사 및 현장 확인
 - 2026. 4월 : 백일홍 화단 2개소 조성 및 추가 조성지 수요 조사
- ☐ 향후계획
 - 2026. 5월 ~ 12월 : 동별 화단 조성, 안내판 부착 및 지속 관리 등
- ☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항
 - 해당사항 없음

Ⅲ 사업집행현황

□ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)		예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
화사한 마을만들기	사무관리비 (201-01)	33,000,000	1,713,970	5%	31,286,030	
	업무추진비 (203-01)	2,000,000	752,000	38%	1,248,000	
	시설비 (401-01)	50,000,000	44,500,000	89%	5,500,000	

□ 세부 집행내역

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금 액	세부내역	
화사한 마을만들기	201-01 사무관리비	33,000,000	1,713,970	· 현수막 1식 = 37,400원 · 차량 임차료 및 유류비 = 1,676,570원	31,286,030
	203-01 업무추진비	2,000,000	752,000	· 사업추진 관계자 간담회 2회 = 752,000원	1,248,000
	401-01 시설비	50,000,000	44,500,000	· 수목전정·제거·이식, 부지 정리 및 수목 납품 등 1식	5,500,000

□ 현황사진



사업 전



사업 후

[市 지역협치형-3] 찾아가는 무료급식 「어영채 영도」

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2025. 5월 ~ 2026. 4월
- ☐ 사업장소 : 영도구 관내
- ☐ 사 업 비 : 30,000천원(시비)
- ☐ 사업내용
 - 찾아가는 무료급식 : 차량 임차를 통한 정기적 무료급식 추진
 - 사랑의 도시락 배달 : 거동불편/독거 어르신 도시락 배달
 - 자원봉사자 확대 모집 : 무료급식사업 홍보 지원

II 사업 추진현황

※ 추진완료

☐ 추진실적

- 무료급식 사업 총 7회 운영(11개동, 1,465명)
 - 2025년 : 6회 ▶ [6.10./7.1./9.16./10.17./10.23./11.13.]
 - 2026년 : 1회 ▶ [3.12.]
- 찾아가는 도시락 배달 사업 총 11회 운영(11개동, 525세대)
 - 2025년 : 8회 ▶ [6.26./7.10./7.17./7.24./9.11./9.25./10.16./11.21.]
 - 2026년 : 3회 ▶ [3.19./4.10./4.11.]

☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항

- 보조사업 특성상 회계연도 시작과 동시에 예산 편성이 불가하여 사업이 특정 기간에 집중될 수밖에 없으므로 연초에 빠른 예산 배정이 필요

Ⅲ 사업집행현황

□ 예산 집행내역

(단위 : 원)


세부사업명 (통계목)		예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
찾아가는 무료급식 운영	행사운영비 (201-03)	28,500,000	28,500,000	100%	-	
	업무추진비 (203-01)	1,500,000	1,495,000	99.6%	5,000	

□ 세부 집행내역

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금액	세부내역	
찾아가는 무료급식 운영	201-03 행사운영비	28,500,000	28,500,000	· 무료급식 재료비 등 1,665천원X7회≒11,661천원 · 도시락배달 재료비 등 500천원X11회≒5,502천원 · 차량 임차료 및 유류비 945천원X12개월≒11,337천원	-
	203-01 업무추진비	1,500,000	1,495,000	· 사업추진 관계자 간담회 250천원X6회≒1,495원	5,000

□ 현황사진

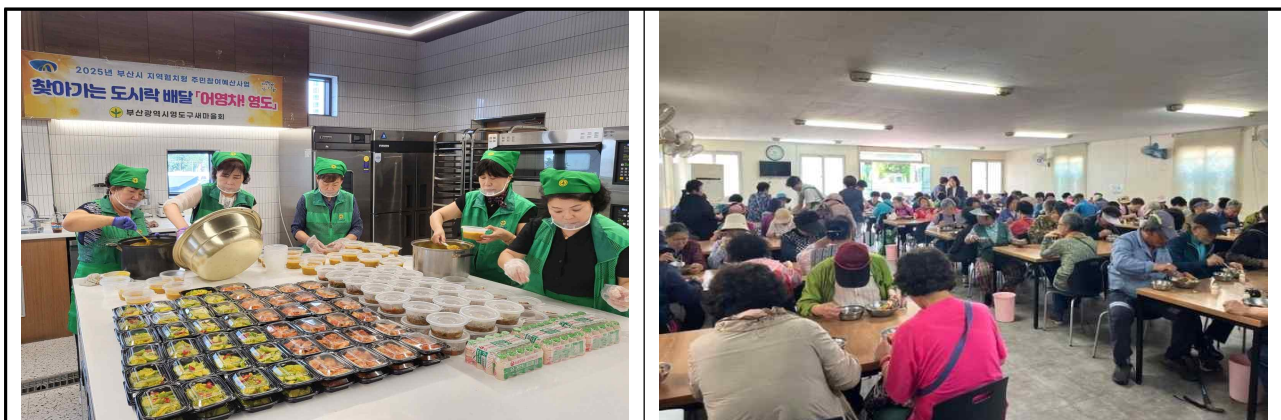

찾아가는 무료급식 운영

[市 지역참여형4] 버스승객대기시설 냉온열의자 설치

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 4. 6. ~ 2026. 5. 26.
- ☐ 사업장소 : 대교동(04010) 등 관내 버스승객대기소 11개소
- ☐ 사 업 비 : 50,000천원(시비)
- ☐ 사업내용
 - 버스승객대기소 내 냉·온열의자 11개 신규 설치

II 사업 추진현황

※ 추진완료

- ☐ **추진실적**
 - 2026. 3월 : 추진계획 수립
 - 2026. 4월 : 계약 의뢰
 - 2026. 4월 : 전기공사 감독관 신청
 - 2026. 5 ~ 6월 : 11개소 냉·온열의자(5인용) 신규 설치 완료
 - 버스승객대기소 냉온열의자 설치를 통한 버스 이용 주민 편의 증진 및 대중교통 이용 활성화 도모
 - 냉온열기능 의자 설치를 통한 여름철 온열 및 겨울철 한파 저감 효과 도모
- ☐ **사업추진상 문제점 및 건의사항**
 - 해당없음

Ⅲ 사업집행현황

□ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
버스승객대기소 냉·온열의의자 설치 (401-01 시설비)	50,000,000	49,527,140	99%	472,860	

□ 세부 집행내역

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금액	세부내역	
버스승객대기소 냉·온열의의자 설치	401-01 시설비	50,000,000	34,284,140	· 냉온열의자 구매(설치)	472,860
			15,243,000	· 냉온열의자 설치 전기공사	

□ 현황사진



사업 전



사업 후

[구-1] 청학배수지 전망대 일원 데크계단 정비

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 4. 3.(금) ~ 2026. 4. 17.(금)
- ☐ 사업장소 : 청학배수지(영도구 청학동 475-4)
- ☐ 사업비 : 45,000천원
- ☐ 사업내용 : 청학배수지 전망대 일원 노후 데크 보수 및 정비

II 사업 추진현황

※ 추진완료

☐ 추진실적

- 2026. 3월 : 추진계획 수립
- 2026. 3월 : 관급자재 구매의뢰 및 공사 계약 의뢰
- 2026. 4월 : 공사 착수
- 2026. 4월 : 관급자재 추가 구매
- 2026. 4월 : 공사 준공
- 노후 데크(94.29㎡) 보수·정비 및 노후 벤치(4개) 교체 완료
- 전망대 이용자 안전 제고 및 주민만족도 증대

☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항

- 해당사항 없음

Ⅲ 사업집행현황

□ 예산 집행내역

(단위 : 원)


세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
청학배수지 전망대 일원 데크계단 정비 (401-01 시설비)	45,000,000	31,374,170	70%	13,625,830	

□ 세부 집행내역


(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금액	세부내역	
청학배수지 전망대 일원 데크계단 정비	401-01 시설비	45,000,000	17,949,000	· 노후 데크 보수·정비 공사	13,625,830
			10,011,850	· 관급자재 구입(합성목재)	
			1,885,120	· 관급자재 추가구입(논슬립)	
			1,528,200	· 관급자재 구입(옥외용벤치)	

□ 현황사진

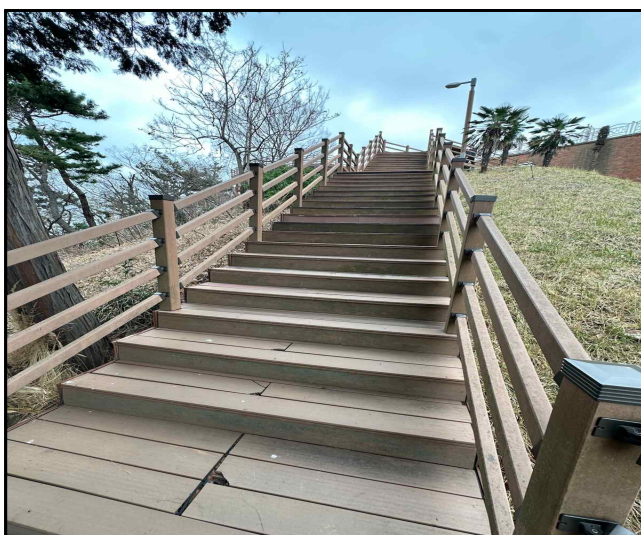

사업 전

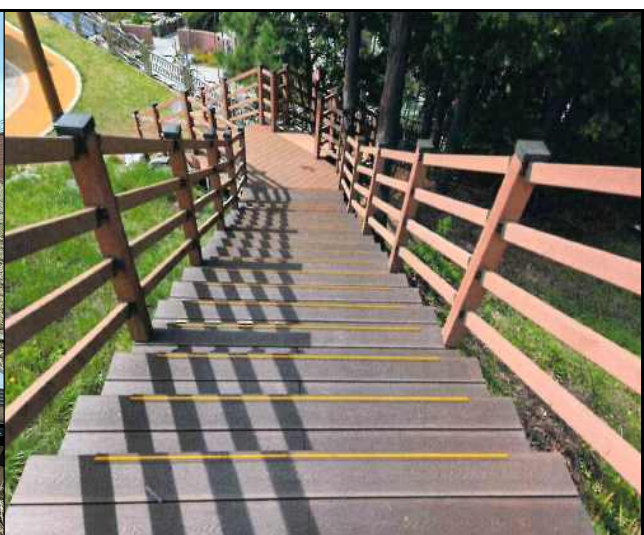

사업 후

[구-2] 하늘소공원 가드닝 사업

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 6월 ~ 2026. 7월
- ☐ 사업장소 : 하늘소공원
- ☐ 사 업 비 : 50백만원
- ☐ 사업내용 : 하늘소공원 정원형 식재 및 정비
 - 돈나무 등 28종 96주, 1,875본 식재 : 35백만원
 - 식재지 정비, 디딤석 설치 등 : 15백만원

II 사업 추진현황

※ 추진중

- ☐ 추진실적
 - 2026. 5월 : 추진계획 수립
 - 2026. 5월 : 설계안 작성
- ☐ 향후계획
 - 2025. 6월 ~ 7월 : 공사 착공 및 준공
- ☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항
 - 해당사항 없음

Ⅲ 사업집행현황

□ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
하늘소공원 가드닝 사업 (401-01 시설비)	50,000,000	0	0%	50,000,000	

□ 세부 집행내역

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금액	세부내역	
하늘소공원 가드닝 사업	401-01 시설비	50,000,000	-	-	50,000,000

□ 현황사진



사업 전



사업 후[조성안]

[구-3] 버스정류소 버스정보안내기 설치

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 3. 26. ~ 2026. 5. 22.
- ☐ 사업장소 : 깡깡이예술마을(04014) 등 관내 버스정류소 15개소
- ☐ 사업비 : 100,000천원
- ☐ 사업내용
 - 버스정류소 버스정보안내기 15대 신규 설치

II 사업 추진현황

※ 추진완료

☐ 추진실적

- 2026. 3월 : 추진계획 수립
- 2026. 3월 : 계약 의뢰
- 2026. 4월 ~ 5월 : 버스정보 안내기 15대 신규설치 완료
- 버스정보안내기 설치를 통해 정보 취약계층 등 버스 이용 주민 편의증진 도모
- 대중교통 편의시설 제공을 통한 대중교통 이용 활성화 도모

☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항

- 해당없음

Ⅲ 사업집행현황

□ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
버스정보안내기 설치 (401-01)	100,000,000	95,446,440	95%	4,553,560	

□ 세부 집행내역

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금액	세부내역	
버스정보안내기 설치	401-01 시설비	100,000,000	95,446,440	· 태양광 버스정보안내기 설치	4,553,560

□ 현황사진



사업 전



사업 후

[구-4] 흰여울문화마을 공공시설 활용 공중화장실 증설

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- ☐ 사업장소 : 흰여울문화마을 안내센터(영도구 절영로 194)
- ☐ 사 업 비 : 150,000천원
- ☐ 사업내용 : 안내센터 내 화장실 개선 및 1층 빈 공간 활용
화장실 증설 등

II 사업 추진현황

※ 추진중

☐ 추진실적

- 2026. 3. 13. : 안내센터 내 화장실 증설 대상지 변경 검토 보고
 - 당초 사업대상지 : 안내센터 1층 화단
 - 변경 사업대상지 : 안내센터 2층 공유주방

☐ 향후계획

- 주민 의견 및 현장 여건을 종합적으로 검토하여 사업 추진 방향을 재정립하고, 관계기관 협의를 거쳐 단계적으로 사업을 추진할 계획임

☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항

- 사업 추진과 관련하여 지역주민 의견 수렴 및 관계자 간 협의가 필요한 상황으로, 사업 추진 일정이 다소 조정되고 있음

Ⅲ 사업집행현황

☐ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
흰여울문화마을 공공시설 활용 공중화장실 증설 (401-01 시설비)	150,000,000	-	-	150,000,000	

☐ 세부 집행내역 : 해당사항 없음

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금액	세부내역	
흰여울문화마을 공공시설 활용 공중화장실 증설	401-01 시설비	150,000,000	-	-	-

☐ 현황사진



사업 전

[구-5] 절영해안마을 안전 및 환경개선사업

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 12월
- ☐ 사업장소 : 영선2동 절영해안마을 일대
- ☐ 사 업 비 : 30,000천원
- ☐ 사업내용
 - 주민·관광객의 보행 만족도 향상 및 안전사고를 예방하기 위한 로고젝터, 쉼터 벤치 및 안전난간 및 미끄럼 방지재 등 설치

II 사업 추진현황

※ 추진중

☐ 추진실적

- 2026. 3월 ~ 4월 : 사업대상지 현장 확인 및 세부 검토
- 2026. 4월 ~ 5월 : 로고젝터 설치 가능 여부 확인(한국전력공사, KT 등)
- 2026. 5. 13. : 로고젝터 전기사용 신청(한국전력공사)
- 2026. 5월 ~ 6월 : 추진 업체 선정 및 견적·시안 확인

☐ 향후계획

- 2026. 7월 : 로고젝터 업체 계약 및 조명 설치
- 2026. 7월 : 안전난간 및 벤치 설치

☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항

- 해당 없음

Ⅲ 사업집행현황

☐ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
절영해안마을 안전 및 환경개선사업 (401-01 시설비)	30,000,000	0	0%	30,000,000	

☐ 세부 집행내역

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금 액	세부내역	
절영해안마을 안전 및 환경개선사업	401-01 시설비	30,000,000	0	· 그림자 조명 설치	30,000,000
			0	· 쉼터 벤치, 안전난간 및 미끄럼 방지재 설치 등	

☐ 현황사진

1. 영선동 4가 1015	2. 영선동4가 1282
	
사업 전	

3. 영선동 4가 248-2



4. 영선동 3가 189



5. 절영로 103-1



6. 영선동4가 1492



사업 전

[구-6] 안전하고 쾌적한 남행마을 조성을 위한 공폐가 문막음 사업

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 6월 ~ 2026. 10월
- ☐ 사업장소 : 쓰레기 무단투기 등으로 문막음이 필요한 공폐가
 - 절영로77번길 일원 등
- ☐ 사업비 : 30백만원
- ☐ 사업내용
 - 공폐가 및 상습불결지 가림막 설치
 - 주변 골목 미관개선을 위한 벽화 조성

II 사업 추진현황

※ 추진중

☐ 추진실적

- 2026. 6월 : 대상지 파악(주요민원 발생지 및 관내 주민 추천)

☐ 향후계획

- 2026. 7월 : 대상지 파악(주요민원 발생지 및 관내 주민 추천)
- 2026. 8월 : 대상지 확정 및 소유주 동의 확보 등
- 2026. 9월 : 사업 시행(가림막, 벽화조성) 및 사후관리

☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항

- 해당사항 없음

Ⅲ 사업집행현황

☐ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
남항마을 공폐가 문막음 및 벽화조성사업 (401-01)	30,000,000	-	-	30,000,000	

☐ 세부 집행내역

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금액	세부내역	
남항마을 공폐가 문막음 및 벽화조성사업	401-01 시설비	30,000,000	-	-	30,000,000

☐ 현황사진



사업 전

[구-7] 횡단보도 교통약자를 위한 의자 설치

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 4. 15. ~ 2026. 4. 17.
- ☐ 사업장소 : 대교로 11 새마을금고 앞 외 4개소
- ☐ 사 업 비 : 2,000천원
- ☐ 사업내용
 - 관내 신호가 긴 횡단보도 변에 교통약자를 위한 의자설치

II 사업 추진현황

※ 추진완료

- ☐ 추진실적
 - 2026. 3월 : 추진계획 수립
 - 2026. 3월 : 옥외용 의자 설치 업체 선정
 - 2026. 4. 15. ~ 4. 17. : 의자 설치 완료
- ☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항
 - 설치 장소를 기존 4개소에서 5개소로 확대하고, 주민들의 편의에 맞춰 의자 설치 위치를 재조정함

Ⅲ 사업집행현황

☐ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
횡단보도 교통약자를 위한 의자설치 (401-01 시설비)	2,000,000	2,000,000	100%	-	


☐ 세부 집행내역

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집 행 액		집행잔액
			금 액	세부내역	
횡단보도 교통약자를 위한 의자설치	401-01 시설비	2,000,000	2,000,000	· 옥외용 벤치 400,000원 × 5개 = 2,000,000원	-

☐ 현황사진

1. 봉래동3가 196 도로

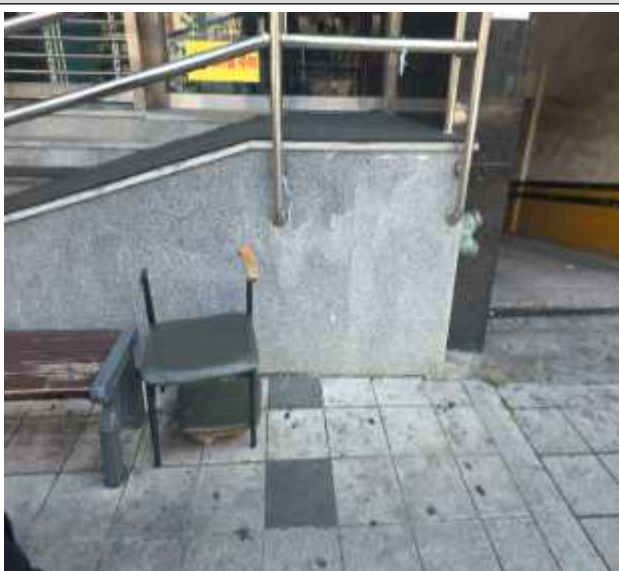

사업 전



사업 후

2. 봉래동3가 42-2 도로



1. 봉래동3가 77-5 도로



1. 봉래동3가 196 도로



1. 봉래동2가 151-2 도로



사업 전

사업 후

[구-8] 봉산마을 다목적 LED 바닥조명로고젝트 설치

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 1월 ~ 2026. 9월
- ☐ 사업장소 : 6개소
 - 거점시설 : 오동꽃길, 찬새미길
 - 골목길 : 사택길, 봉숭아길, 외나무길, 산유화길
- ☐ 사 업 비 : 13백만원
- ☐ 사업내용 : 주요 골목길 및 거점시설 인근 쓰레기 투기 방지 및 안전보행을 위한 LED 바닥조명 설치

II 사업 추진현황

※ 추진중

☐ 추진실적

- 2026. 1월 ~ 5월 : 현장 확인 등 수요조사 실시

☐ 향후계획

- 2026. 6월 : 주민 의견 수렴 및 장소 확정
- 2026. 7월 : 업체 선정 및 계약 추진
- 2026. 8월 ~ 9월 : 공사

☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항

- 해당사항 없음

Ⅲ 사업집행현황

☐ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
봉산마을 다목적 바닥조명 설치 (401-01 시설비)	13,000,000	-	-	13,000,000	

☐ 세부 집행내역

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금 액	세부내역	
봉산마을 다목적 바닥조명 설치	401-01 시설비	13,000,000	-	-	13,000,000

☐ 현황사진



사업 전

(구-9) 노후주택 환경개선 「희망家득 집수리」 사업

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 4월 ~ 2026. 11월
- ☐ 사업장소 : 관내 열악한 주거환경에 처한 취약계층 4세대
- ☐ 사 업 비 : 9,000천원
- ☐ 사업내용
 - 주거환경에 따른 맞춤형 집수리 지원(경보수에 한함)
 - 도배·장판, 창호, 전등, 싱크대 교체 등

II 사업 추진현황

※ 추진중

☐ 추진실적

- 2026. 4. 5.(일) : 「희망家득 집수리」사업 1차 완료
 - 최○임(89세) : 주택 내부 도배, 전등 교체, 샷시 교체 등
- 2026. 4. 19.(일) : 「희망家득 집수리」사업 2차 완료
 - 홍○수(78세) : 주택 내부 도배, 전등 교체 및 외부 샷시 교체 등

☐ 향후계획

- 「희망家득 집수리」사업 3 ~ 4차 실시 : '26. 7. ~ '26. 11.

☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항

- 해당사항 없음

Ⅲ 사업집행현황

☐ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
노후주택 환경개선 집수리 사업 (206-01 재료비)	9,000,000	4,171,200	46.3%	4,828,800	

☐ 세부 집행내역

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금액	세부내역	
노후주택 환경개선 집수리 사업	206-01 재료비	9,000,000	1,971,200	이중창,벽지,방등,장판지 등	7,028,800
			2,200,000	이중창, 벽지, 장판지 등	4,828,800

☐ 현황사진

「희망家」득 집수리」 사업 1차



사업 전

사업 후

「희망家득 집수리」 사업 2차



사업 전

사업 후

[구-10] 우리동네 길쉼터

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 3월 ~ 2026. 6월
- ☐ 사업장소 : 관내 오르막길 유희공간 5개소, 청학동 99-291번지
- ☐ 사업비 : 18,000천원
- ☐ 사업내용
 - 보행자 휴식공간 제공을 위한 옥외용 벤치 설치
 - 관내 유희공간을 이용한 소공원 설치

II 사업 추진현황

※ 추진완료

☐ 추진실적

- 2026. 5. 4.(월) : 「우리동네 길쉼터」 사업 1차 완료
 - 관내 5개소, 6개 벤치 설치
- 2026. 6. 18.(목) : 「우리동네 길쉼터」 사업 2차 완료
 - 청학동 99-291번지 소공원 설치

☐ 향후계획

- 해당사항 없음

☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항

- 해당사항 없음

Ⅲ 사업집행현황

☐ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
고지대 보행 편의성 증진 사업 (401-01 시설비)	18,000,000	18,000,000	100%	-	

☐ 세부 집행내역

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금 액	세부내역	
고지대 보행 편의성 증진 사업	401-01 시설비	18,000,000	3,750,000	· 옥외용 벤치 7개	-
			14,250,000	· 공원조성 (도색작업 블록 마사토,관목삭제)	-

☐ 현황사진

「우리동네 길쉼터」 사업 1차



사업 전

사업 후

「우리동네 길쉼터」 사업 1차



「우리동네 길쉼터」 사업 2차



사업 전

사업 후

[구-11] 쓰레기 무단투기 등 로고젝터 설치

I 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2026. 4. 15. ~ 2026. 6.
- ☐ 사업장소 : 관내 8개소(태종로765번길 22-1, 본산로16번길 21-4, 본산남길25번길 8-4, 본산로 13, 태종로 824, 감지길 58, 동삼동 산 13, 동삼동 1049-16)
- ☐ 사업비 : 16,800천원
- ☐ 사업내용
 - 쓰레기 무단투기 방지, 과속 방지의 내용을 담은 로고젝터 조명(8개소) 설치

II 사업 추진현황

※ 추진중

- ☐ 추진실적
 - 2026. 4. 15. : 8개소 전기사용신청(한국전력공사)
 - 2026. 4. 30. ~ 5. 6. : 전기 설비 공사 계약 체결 및 완료
 - 2026. 5. 27. : 전기시설부담금 납부(한국전력공사)
 - 2026. 6. 15. : 로고젝터 조명 구입 요청(조달청)
- ☐ 향후계획
 - 2026. 6월 한 : 로고젝터 조명 설치
- ☐ 사업추진상 문제점 및 건의사항
 - 해당사항 없음

Ⅲ 사업집행현황

□ 예산 집행내역

(단위 : 원)

세부사업명 (통계목)	예산액 (A=B+D)	집행액(B)	집행률(C) (C=B/A)	집행잔액(D)	비고
쓰레기 무단투기 등 로고젝터 설치 (401-01 시설비)	16,800,000	5,249,880	31.2%	11,550,120	

□ 세부 집행내역

(단위 : 원)

사업명	통계목	예산액	집행액		집행잔액
			금 액	세부내역	
쓰레기 무단투기 등 로고젝터 설치	401-01 시설비	16,800,000	999,880	· 전기시설부담금 납부 (한국전력공사) : 999,880원	11,550,120
			4,250,000	· 전기 설비 공사 대금	
